

REPUBLIQUE DU SENEGAL

UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Secrétariat Général de la Présidence

RAPPORT

EXECUTION TECHNIQUE DES ACTIVITES DU PÔLE DE DEVELOPPEMENT DE LA CASAMANCE (PPDC)

PERIODE DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2015

RAPPORT ANNUEL 2015

CRÉDIT IDA N°5305 SN



TABLE DES MATIÈRES

	P	ages
1 F	ESENTATION ET MISE EN CONTEXTE	4
1.1	EXÉCUTION FINANCIÈRE DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2015	5
1.2	SUIVI BUDGETAIRE ET FINANCIER DU PROJET	6
1.3	DATES CLES ET STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PPDC	7
1.4	MONTAGE INSTITUTIONNEL ET DISPOSITIONS DE PARTENARIATS	
1		
	2 Organigramme du PPDC	8
	stratégie de mise en œuvre centrée autour des OP	8
1		
1		
	6 : Convention avec les Organisations de Producteurs (OP) et Faîtière d'OP	
1.5	SUIVI DU PROJET PAR LA BANQUE MONDIALE	12
2 E	T D'EXÉCUTION ET PERFORMANCE DU PROJET	12
	ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA COMPOSANTE 1 APPUI À LA PRODUCTION AGRICOLE, À LA PO	
RÉ	TE ET À LA MISE EN MARCHÉ AU PROFIT DE CHAÎNES DE VALEUR CIBLÉES	13
2 p	eres 13 2 Sous Composante 1.2 Mise à disposition de moyens de production en appui duction et à la productivité du riz, de l'horticulture et de l'ostréiculture, dont l'ach	nat
	trants et de matériel et le renforcement des capacités	18
	Sous Composante 1.3. Mise à disposition de petites infrastructures post oltes dont les centres de groupage	25
	4 Sous Composante 1.4. Amélioration de l'accès aux marchés à travers le	
	eloppement de la Plateforme Economique Intégrée de Bignona	25
	ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA COMPOSANTE 2 : ACCESSIBILITÉ RURALE	
	1 Etudes de réhabilitation de pistes et traitement de points critiques	
2	2 Travaux de réhabilitation de pistes et traitement de points critiques	
2	Projet pilote d'entretien de pistes rurales par la méthode HIMO et renforcement	ent
C	apacités des ARD et de CR	29
2.3	ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA COMPOSANTE 3: MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET RENFORCEM	ENT
DES	APACITÉS	29
IV. C	CLUSION ET RECOMMANDATIONS	34
V. Al	EXES	36
5.1	Cadre de résultat du projet	36
5.2	Résumé de Passation de Marchés	43 -
5.3	Niveau d'exécution du Plan de Travail Annuel Budgétisé (PTBA) 2014-2015 :	
5.4	PERSPECTIVES Plan de Travail Annuel Budgétisé (PTBA) 2016 -	72 -

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AGETIP Agence d'Exécution des Travaux d'intérêt Public AGEROUTE Agence de Gestion et d'Entretien des Routes

ANIDA Agence Nationale d'Insertion pour le Développement Agricole

AON Appel d'Offres National

ARD Agence Régionale de Développement

ARDK Agence Régionale de Développement Kolda
ARDS Agence Régionale de Développement Sédhiou
ARDZ Agence Régionale de Développement Ziguinchor
PPDC Projet pôle de Développement de la Casamance
CGES Cadre de Gestion Environnementale et Sociale

CPP Comité de Pilotage du Projet

CPR Cadre de Politique de Réinstallation

CSE Centre du Suivi Ecologique

CSRP Cadre Stratégique de Réduction de la Pauvreté

DAGE Direction de l'Administration Générale et de l'Equipement DEEC Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés

DEP Document d'Evaluation de Projet
DMI Demande de Manifestation d'Intérêt

DSRP Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté EIES Evaluation de l'Impact Environnemental et Social

FNDASP Fonds National de Développement Agro-Sylvo-Pastoral

FRGPF Fédération Régionale des Groupements de Promotion Féminine

GIE Groupement d'Intérêt Economique

ISRA Institut Sénégalais de Recherches Agricoles

MEP Manuel d'Exécution du Projet

ODP Objectif de Développement du Projet

OMD Objectif du Millénaire pour le Développement

ONG Organisation Non Gouvernementale

PAR Plan d'Action de Réinstallation

PEIB Plateforme Economique Intégrée de Bignona

PIB Produit Intérieur Brut

PNAR Programme National d'Autosuffisance en Riz

PME Petites et Moyennes Entreprises
PGP Plan de Gestion des Pesticides

PPP Partenariat Public-Privé

PRACAS Programme d'Accélération de la Cadence de l'Agriculture Sénégalaise

PSE Plan Sénégal Emergent

RRDD Réconciliation Reconstruction et Développement Durable

S&E Suivi et Evaluation

SBQC Sélection Basée sur la Qualité et le Coût

SNDES Stratégie Nationale de Développement Economique et Social

SODAGRI Société de Développement Agricole UASZ Université Assane Seck de Ziguinchor

1 PRESENTATION ET MISE EN CONTEXTE

L'état du Sénégal a conçu, avec le concours de ses partenaires au développement, un Projet dénommé «Projet Pôle de Développement de la Casamance PPDC». Le projet d'une valeur d'environ de 40 millions de dollars (26,5 millions de dts) est financé par la Banque Mondiale (IDA) pour une durée de cinq (5) ans.

L'objectif global du projet est de contribuer à la réduction de la vulnérabilité des jeunes et des femmes de la Casamance en élargissant leurs opportunités économiques dans le but de s'attaquer aux causes fondamentales du conflit.

Le projet est structuré en trois composantes principales dont chacune est constituée de quatre sous composantes telle que présentée dans le tableau qui suit.

Tableau 1 : Composantes du projet PPDC

Composante Composante	Montant Total en million \$ EU
1. Appui à la production agricole, à la post-récolte et à la mise en	22.0
marché au profit de chaînes de valeur ciblées	
1.1 Réhabilitation, aménagement et mise en valeur de rizières	8.0
1.2 Mise à disposition de moyens de production en appui à la production	
et à la productivité du riz, de l'horticulture et de l'ostréiculture, dont l'achat	5.0
d'intrants et de matériel et le renforcement des capacités	
1.3 Mise à disposition de petites infrastructures post-récoltes dont les	2.0
centres de groupage	
1.4 Amélioration des liaisons avec le marché à travers le développement	7.0
de la Plateforme Economique Intégrée de Bignona	
2. Accessibilité	13.0
2.1 Traitement de points critiques sur environ 350 km de routes rurales	3.5
reliant les CR au réseau classé, aux centres urbains	
2.2 Réhabilitation/entretien périodique de 200 km de routes rurales pour	8.2
améliorer l'accès aux infrastructures commerciales et aux zones à fort	
potentiel agricole	
2.3 Projet pilote d'entretien des pistes rurales à haute intensité de main-	0.5
d'œuvre	
2.4 Renforcement des capacités des ARD et des CR dans le domaine de	0.8
la maîtrise d'ouvrage de l'entretien de pistes rurales	
3. Mise en œuvre de projets et renforcement des capacités en DDR	5.0
3.1 Renforcement des capacités des acteurs clés, dont l'ANRAC dans la	0.6
consolidation de la paix et les fondamentaux du Désarmement,	
Démobilisation et Réinsertion (DDR) des ex-combattants	
3.2 Etudes stratégiques	0.6
3.3 Appui à la gestion, au suivi évaluation, à la coordination et au pilotage	3.8
du projet	
3.4 Construction et Équipement des sièges des 3 ARD	
Coûts totaux du Projet	40.0

Le présent document constitue le rapport des activités du projet. Il couvre la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015 et fait le point de l'exécution technique et financière des activités du PPDC. Il est articulé autour des points suivants :

- Résumé de la Présentation et le contexte du projet ;
- Exécution financière au 31 décembre 2015;
- Activités planifiées et résultats atteints au 31 décembre 2015 ;
- Analyse des résultats atteints au 31 décembre 2015 et difficultés rencontrées
- Perspectives, conclusions et recommandations pour la mise en œuvre des activités de l'année 2016 du projet (PTBA 2016).

1.1 EXÉCUTION FINANCIÈRE DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2015

Le PTBA révisé du PPDC était évalué à 7 081 333 771 FCA. Entre le 01 janvier et le 31 décembre 2015, le suivi budgétaire et financier du projet se résume à travers les tableaux ci-dessous.

Par rapport à la prévision annuelle, le taux d'exécution budgétaire est de 33 % à la date du 31 Décembre 2015.

Le tableau ci-dessous donne les détails du niveau d'exécution financière par composante du projet au 31 décembre 2015.

1.2 SUIVI BUDGETAIRE ET FINANCIER DU PROJET

Tous	ous Financements Tous Activités				<u> </u>	Période	du 01/01/2015	Au 31/12/2015		
Tous	Communes		Tous DE	PENSES		Monnai	e : XOF			
Tous	ACTEURS		Tous CO	MPTE		Type Bu	udget : Dépenses			
									F	Page 1/1
1	Appui production agri à l'après récolte et à la commercialis	1 15	3 866 235	1 158 866 235	4 538 483 321		26	4 538 483 321	3 379 617 086	26
2	DEPENSES DE MISE EN OEUVRE DU PROJET	1 158	3 866 235	1 158 866 235	4 538 483 321		26	4 538 483 321	3 379 617 086	26
2	Amélioration de l'accessibilité des zones rurales	482 886	6 635	482 886 635	1 196 468 000		40	1 196 468	713 581 365	40
2	DEPENSES DE MISE EN OEUVRE DU PROJET	482 880	6 635	482 886 635	1 196 468		40	1 196 468	713 581 365	40
3	Mise en œuvre du Projet et renforcement des capacités en DDR	675 320	339	675 320 339	000 1 346 382 450		50	1 346 382 450	671 062 111	50
1	DEPENSES DE GESTION DU PROJET	675 320	339	675 320 339	1 346 382 450		50	1 346 382 450	671 062 111	50
Or	nate	2 31	7 073	2	7		33	7 081 333	4 764 260 562	33

1.3 DATES CLES ET STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PPDC

Signature accord de crédit	Septembre 2013
Lancement du PPDC par le Chef de l'Etat	Mars 2014
Recrutement du Coordinateur	Mai 2014
Entrée en Vigueur du crédit	20 Mai 2014
Virement de la première avance	27 Juin 2014
Recrutement staff technique	Oct-Nov 2014
Premier PTBA du Projet	05 Décembre 2014
Fin de Projet	30 juin 2019

Initialement prévu le 26 septembre 2013, le crédit est entré en vigueur le 20 mai 2014. Un montant initial de 650 millions FCFA a été viré dans le compte du PPDC ouvert par le MEF le 27 juin 2014. Une procédure a été alors lancée pour recruter le staff technique de l'UCP et s'est terminée au mois de novembre 2014. Le premier Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) élaboré par le PPDC, est validé d'abord par le Comité Technique constitué des services techniques régionaux le 17 novembre 2014 et ensuite par le Comité de Pilotage du Projet le 05 décembre 2014.

Ainsi le PPDC a *accusé neuf (9) mois* de retard dû à la lenteur du recrutement de son Coordinateur. Ce retard est de presque un (1) an pour si l'on prend en compte le recrutement complet du staff technique intervenu en novembre 2014.

1.4 MONTAGE INSTITUTIONNEL ET DISPOSITIONS DE PARTENARIATS

1.4.1 Rappels

Le montage institutionnel jusqu'à la signature de l'accord de crédit du PPDC, reposait sur la mise en œuvre du projet par une Unité de Coordination (UCP), basée à Dakar qui s'appuierait sur les trois ARD du pôle Casamance : l'Agence Régionale de Développement de Ziguinchor (ARDZ), l'Agence Régionale de Développement de Kolda (ARDK) et l'Agence Régionale de Développement de Sédhiou (ARDS) pour coordonner les activités dans leur région. L'ARD de Ziguinchor assurait la réalisation, la coordination de la préparation du projet (études de base du projet, mission de terrain, la gestion des fonds de préparation, la passation des marchés, etc.).

L'entrée en application de l'acte 3 avant le démarrage effectif des activités du projet, a justifié le changement institutionnel en faveur d'une unité de coordination du projet renforcée. Ainsi l'unité de coordination a recruté de spécialistes et assistants et son siège a été déménagé à Ziguinchor pour couvrir les deux (2) autres régions du Pôle Casamance. Des mandats de maîtrise d'ouvrage déléguée ont été ainsi confiés à des agences spécialisés pour exécuter

des projets spécifiques de pistes, d'aménagements de vallées, de périmètres maraîchers et de leur mise en valeur,... tandis que les ONGs, Associations, services publics régionaux vont participer au renforcement des capacités institutionnelles des Ops, aux populations et au suivi de la mise en œuvre selon leur domaine de compétence.

1.4.2 Organigramme du PPDC

Le staff de l'UCP, initialement composé d'un coordonnateur, d'un spécialiste en Passation de Marchés et d'un Chef comptable a été renforcée en octobre-novembre 2014 par le recrutement d'un Spécialiste Suivi Evaluation, un comptable, un Responsable Chaine de Valeurs, un Responsable en Infrastructures, un assistant Secteur Privé et un Assistant en Suivi Evaluation.

Deux (2) chauffeurs ont été aussi recrutés en conformité avec le parc roulant. Une assistante de Direction est entrée en fonction depuis février 2015, le recrutement d'un Secrétaire est en cours. L'équipe technique de l'UCP est assistée par les consultants séniors à travers des mandats d'assistance technique en S/E, en filières agricoles et développement rural, en Ostréiculture, en développement des outils de communication.

Le PPDC a un Comité de Pilotage du Projet (CPP), présidé par un représentant de la Présidence de la République du Sénégal. Il a été créé par Arrêté Présidentiel n° 008848, en date du 12 Juin 2013. **L'Organigramme du PPDC** se présente ainsi:

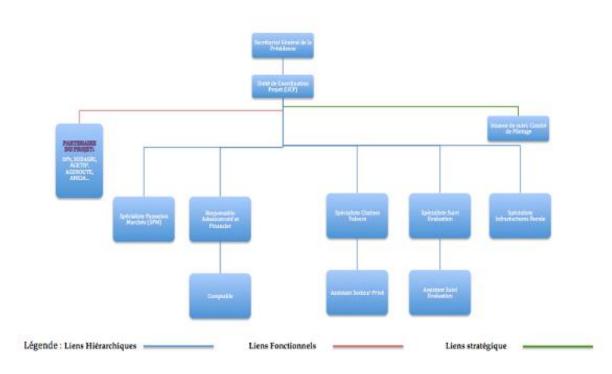


Figure 1 : Synoptique de l'Organigramme du PPDC

1.4.3 stratégie de mise en œuvre centrée autour des OP

Au niveau opérationnel, la stratégie repose sur deux piliers : l'accès au marché et la centralité des activités autour des Organisations de Producteurs (OP).

L'objectif étant de responsabiliser les OPs pour les préparer à être autonome. Ainsi les producteurs bénéficiaires à travers leurs organisations ont pris l'engagement à l'échéance 2019 de doubler les superficies et les rendements. En retour, le Projet fournira les équipements, des services dont la formation, les intrants, et leur facilitera l'accès au crédit pour jeter les bases d'un développement économique durable.

Ainsi les services compétents (structures étatiques, agences, projets et programmes, ONGs, Associations, consultants, etc. (voir schémas ci-dessous) vont assurer les prestations aux agriculteurs dont la qualité aiderait à atteindre les objectifs du Pôle Territoire Casamance.

L'unité de coordination suivra et évaluera la qualité des prestations fournies aux profits des communautés afin d'apprécier le niveau de performance par rapport aux objectifs du projet. Elle recherchera aussi pour les OP des partenaires stratégiques pour accompagner les communautés de la Casamance dans le développement des trois chaines de valeur ciblées.

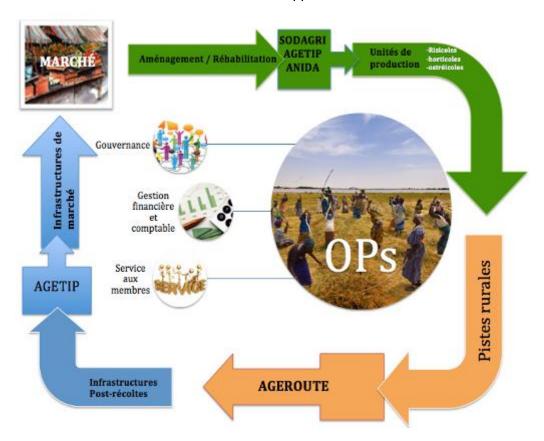


Figure: Synoptique de la stratégie de mise en œuvre du PPDC

Un schéma de financement pérenne est en construction pour aider les communautés à lever les financements nécessaires à leur développement. Le PPDC, le FONGIP et la CNCAS se sont accordés à travers une convention tripartite pour financer la contrepartie des populations dans le financement des sous projets. Le crédit de la CNCAS sera garanti par le FONGIP qui permettrait désormais aux agriculteurs d'avoir leurs intrants à temps.

Les programmes d'appui des OP et agriculteurs reposent sur un diagnostic institutionnel dont les résultats contribuent à alimenter le contenu des formations sur les cinq (5) années. Le renforcement des capacités se fera selon trois (3) axes :

l'amélioration de la gouvernance,

- la mise en place de système simplifié de gestion fiduciaire (comptabilité, passation de marché,..)
- la communication et le leadership, etc...

Ceci dans l'optique de faire profiter la communauté des opportunités de marchés et de services techniques et financiers.

1.4.4 Maîtrise d'Ouvrage Délégué (MOD) à des agences spécialisées :

L'implication des agences spécialisées de l'Etat dans l'exécution du Projet a pour but de créer les conditions favorables à des prestations et des travaux de qualité. Cette démarche permet de garder la cohérence du schéma d'exécution du projet avec les politiques et stratégies sectorielles. Les interventions de ces structures se déclinent comme suit :

- AGEROUTE pour la mise en œuvre de la Composante 2 (accessibilité rurale). Celle-ci comporte la réhabilitation de 200 km pistes et le traitement de 350 km points critiques, le renforcement de capacités des ARD et Collectivités locales en Maîtrise d'Ouvrage et la mise en œuvre de projet pilote de d'entretien routier suivant la méthode HIMO;
- AGETIP pour la mise en œuvre de la seconde phase de la PEIB et d'autres plateformes secondaires (infrastructures de marchés) dans les trois régions du pôle ainsi que la réhabilitation/aménagement de 5000 ha vallées rizicoles dans la région de Sédhiou.
- **SODAGRI** pour la réhabilitation/aménagement de 5000 ha de vallées dans la région de Kolda et l'appui à la mise en valeur de rizières.
- ANIDA pour la réalisation et l'appui à l'exploitation de 3000 ha de périmètres horticoles au profit des jeunes et des femmes. La localisation des périmètres se fera en cohérence avec l'implantation des petites plateformes de groupage des produits et des petits périmètres maraîchers existants.
- FNDASP pour la structuration et le renforcement des capacités des Organisations de Producteurs (OP) et de leurs membres.
- **ANRAC** pour la prise en charge du volet RRDD en Casamance mais aussi l'intensification des interventions du PPDC dans les zones dites « rouges ».
- CSE pour la mise en place d'une base de données cartographique (Système d' Information Géographique) pour le Pôle territoire Casamance. Ce SIG aidera par la même occasion à développer un modèle de plan stratégique pour les Collectivités locales.
- UNIVERSITE ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR (UASZ) pour l'établissement de la situation de référence du Projet Pôle de Développement de la Casamance (PPDC). Ce partenariat vient en renfort du Projet Initiatives Communautaires de Construction de la Paix en Casamance (Pro Paix), financé par la Banque Mondiale. Le Pro Paix a supporté des travaux de recherche, conduits avec les populations sur le processus de paix, ces résultats feront seront édités dans un livre en anglais et français tandis que les sous projets seront documentés.

1.4.5 Partenariat avec les Services déconcentrés et Institutions financières

- Des protocoles ont été signés avec les **Directions Régionales de Développement Rurales (DRDR)** des trois régions. Les DRDR auront pour missions principales, le contrôle et la certification des semences, la validation des statistiques et l'harmonisation des interventions dans leur zone.
- La DAPSA sera mise en contribution dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information agricole et sur des études thématiques sur les ménages agricoles dans le pole. A ce titre, elle travaillera au lissage des données statistiques qui alimenteront le système de suivi et évaluation du projet.
- Le PPDC travaillera avec les DREEC à travers les comités techniques régionaux de Suivi-environnemental et social. Ces comités techniques mobiliseront à chaque fois que de besoin l'IREF, l'INP, les SRADL, ISRA, Pêche etc., pour mettre en œuvre des mesures environnementales et sociales.
- Des accords sont convenus entre le PPDC, le FONGIP et la CNCAS pour bâtir un mécanisme durable de mobilisation de la contrepartie au financement des matériels, équipements et en intrants des communautés. Ces conventions pourraient être élargies à d'autres institutions financières.

1.4.6 : Convention avec les Organisations de Producteurs (OP) et Faîtière d'OP

Conformément à la stratégie du projet un choix des coopératives partenaires du projet a été effectué sur la base d'analyses des capacités organisationnelles des OP existantes et sur un ciblage des OP à appuyer en rapport avec l'ensemble des services techniques déconcentrées de l'Etat et les projets/programmes de la Casamance.

Le renforcement du capital social étant le levier principal sur lequel est basé notre action, des spécialistes du développement rural ont été recrutés pour servir de points focaux. Ils vont servir d'animateurs techniques au sein des OP pour accompagner l'exécution de leurs plans d'actions.

- **FRGPF** de la région de Ziguinchor : Protocole pour appuyer la coopérative ostréicole. Dans le cadre du protocole, la FRGPF bénéficie de l'accompagnement de l'Agence National d'Aquaculture (ANA) et du Service Régional de la Pêche Maritime (SRPM) dans la formation et le suivi et la mise en œuvre des activités.
- Le PPDC a signé des protocoles avec sept (07) coopératives de Producteurs de semences réparties dans les trois régions de la Casamance afin d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés d'ici 2019 (doubler à la fois les superficies et les rendements). L'accord met en face des résultats à atteindre par les Ops, avec les engagements du projet en termes de moyens (services, équipements, matériels, intrants...) à mettre à disposition en contrepartie. Des évaluations annuelles sont prévues à la fin de chaque campagne avec les acteurs, pour préparer les prochaines échéances. Les producteurs de semences certifiées de riz du Pôle Territoire Casamance ont pour objectif d'assurer l'autonomie à leurs membres et d'exporter des surplus dans les pays limitrophes (Gambie, Guinée Bissau, Mali).
- Dans les zones où les coopératives ne sont pas présentes, le PPDC a signé un protocole avec les CRCR de Ziguinchor et de Kolda.

1.5 SUIVI DU PROJET PAR LA BANQUE MONDIALE

Le PPDC reçoit régulièrement des missions de supervision. Durant l'année 2015, la Banque a effectué trois missions conjointes d'appui à la mise en œuvre du Projet. La première s'est effectuée du 12 au 29 janvier 2015, la seconde du 18 au 29 mai 2015 et la troisième du 26 octobre au 06 novembre 2015.

Au regard des progrès réalisés durant l'année 2015, la mission a jugé l'exécution du Projet satisfaisante. Cependant les points d'accord et recommandations ont été formulés dans le sens d'améliorer la mise en œuvre du projet :

- La Signature du contrat du Coordinateur du projet;
- Recruter le Consultant pour l'assistance et l'accompagnement de l'Ageroute dans la mise en œuvre du pilote HIMO en entretien routier ;
- Sélection de l'entreprise et démarrage des travaux du tronçon Kolda-Pata (66 km);
- Démarrage des activités de terrain du pilote HIMO ;
- Lancement des appels d'offres des 114 km restant sur la composante "Réhabilitation" des pistes;
- Démarrage des travaux des 114 km de réhabilitation ;
- Préparation de plans de maintenance et de co-financement pour les sous projets réceptionnés par les communautés ;
- Lancement du premier appel d'offres sur les 327 km de points critiques ;
- Recrutement d'un consultant pour l'Edition et la publication des travaux de recherche menés par l'UASSZ et les sous projets financés par le SPF ;
- Recrutement d'un consultant pour le diagnostic et l'élaboration d'une stratégie de ciblage des jeunes et des femmes dans la mise en œuvre du projet ;
- Rencontre avec la SODAGRI pour les décisions à prendre en vue d'accélérer les études des 5000 ha ;
- Réaliser les études techniques environnementales et sociales de la PEIB ;
- Identifier avec les cadres d'harmonisation existants, les sites d'implantation des miniplateformes et des périmètres maraichers ;
- Recruter un consultant spécialiste en renforcement institutionnel ;
- Recruter un consultant individuel pour étudier la vallée de MPACK dans la région de Ziguinchor.

2 ÉTAT D'EXÉCUTION ET PERFORMANCE DU PROJET

Le démarrage des activités du projet a nécessité d'abord la tenue de certaines actions qui se résument comme suit :

- choix de vallées à réhabiliter/aménager en concertation avec les DRDR notamment ceux de Sédhiou et de Ziguinchor;
- visites d'identification de sites horticoles en rapport avec ANIDA;
- séances de travail / rencontre avec les Maires des Communes et Présidents de Conseils départementaux concernés;
- séances de travail / rencontres avec les comités de vallées ;
- séances de travail / rencontres avec les sous-préfets, préfets et gouverneurs concernés;
- recensement des études techniques disponibles prêtes à l'emploi au niveau des DRDR,
 ARD, AGEROUTE, PROCAS, PADERCA, PAPIL, Projets/Programmes, etc.
- élaboration d'un programme prioritaire centré sur les activités réalistes & réalisables dans chaque région administrative du Pôle Casamance;

- validation du programme prioritaire avec les services régionaux (DRDR, ANCAR, AGEROUTE, ARD, ProPAIX, ISRA, Directions des Routes, SRADL, SODAGRI, PAPSEN, Coopératives des semenciers de riz, Fédération régionale des femmes Ostréicultrices...);
- communication autour du projet

2.1 ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA COMPOSANTE 1 APPUI À LA PRODUCTION AGRICOLE, À LA POST-RÉCOLTE ET À LA MISE EN MARCHÉ AU PROFIT DE CHAÎNES DE VALEUR CIBLÉES

Les différentes réalisations durant l'année 2015 sont décrites ci-après.

2.1.1 Sous Composante 1.1 : Réhabilitation, aménagement et mise en valeur de rizières

2.1.1.1 Travaux de réhabilitation/aménagement de vallées

Pour cette première année le PPDC a ciblé les vallées pour lesquelles des études techniques sont disponibles. C'est dans ce sens qu'une convention est signée avec le ProPaix (ARD Ziguinchor) qui a réalisé des études pour la réhabilitation de la vallée de Djémbéring et la construction de digue antisel à Diégoune. C'est dans ce même sens que le PPDC va réaliser des travaux d'aménagement de 1000 ha dans neuf vallées à Affiniam dont les études ont été effectuées par le PDMAS. Ceci étant une demande du Ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural (MAER), la Banque Mondiale et le Comité de Pilotage ont donné leur accord.

Le PPDC a également effectué une étude qui a permis d'établir un DAO et de recruter une entreprise pour la réhabilitation de 3 vallées à Sédhiou.

Au 31 décembre 2015, les résultats obtenus dans ce domaine se présentent comme suit:

Travaux de réhabilitation/aménagement dans la région de Ziguinchor :

Réhabilitation de la vallée de Djémbéring (143 ha) :

Sur la base des études disponibles, le PPDC a réalisé et lancé un dossier de consultation d'entrepreneurs. Toutefois la consultation a été déclarée infructueuse par défaut nombre de soumissionnaires (une seule entreprise).

A la suite d'une mission de Supervision de la banque et tenant compte des recommandations, les spécifications techniques ont été révisées pour permettre de réaliser une partie des travaux par la méthode HIMO (rechargement de la digue). A la suite d'une seconde relance, l'entreprise GEOTOP Ingénierie est retenue pour la réalisation des travaux. Le marché est notifié à l'Entreprise et le démarrage des travaux est prévu à la fin de l'hivernage, après les récoltes au niveau de vallée.

Réhabilitation de la vallée de Diégoune (70 ha)

L'entreprise DA ROSA est sélectionnée pour effectuer les travaux suite à un appel à concurrence. Le site a été mis à la disposition de l'entreprise par la commune et le village en présence de représentants de l'UCP/PPDC, le 09/04/2015.

Les travaux de terrassement de la digue (1600 m) sont achevés ainsi que le génie civil des déversoirs. Il reste seulement la fourniture et pose de vannes.

En raison des pluies importantes la réalisation des ouvrages de régulation n'a pas pu être achevée à temps Présentement les travaux sont exécutés à 97%.

On aperçoit sur cette image à droite, les traces de sel retenue par la digue attestant de ses premiers impacts.





Figure 2 : Digue antisel de Diégoune

> Aménagement de 1000 ha dans 9 vallées dans le bassin de Bignona à Affiniam :

Le DAO reçu du PDMAS à travers le MAER, le 13/04/2015 a été actualisé par le PPDC et soumis à l'IDA qui a donné son avis de non objection. L'Appel d'offres pour la sélection des Entreprises de travaux est lancé le 10 juillet 2015 et les offres ouvertes le 14 Aout 2015. Les notifications de marchés sont faites et les contrats sont signés. Les marchés sont en attente d'approbation au niveau du Ministère de la Gouvernance Locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire (MGLDAT). Les travaux vont démarrer dès l'approbation des marchés.

Concernant le recrutement du Consultant pour la supervision et contrôle des travaux, le rapport d'évaluation des manifestations d'intérêts ainsi que la Demande de Propositions y afférente sont soumis le 4 juin 2015 à l'IDA qui a donné son Avis de Non Objection le 27 Août 2015. Ainsi la Demande de Propositions pour le recrutement d'un Consultant chargé de la supervision a été lancée le 28 Août 2015 après prise en compte des commentaires de l'IDA et l'ouverture des plis est effectuée le 29 septembre 2015. Le rapport d'évaluation des Propositions techniques est soumis à l'IDA qui également donnée son Avis Non Objection. La signature du marché se fera au cours du premier trimestre 2016, avant le démarrage des travaux.

* Travaux de réhabilitation/aménagement dans la région de Sédhiou :

Travaux de réhabilitation des vallées de Bakoum, Ndiama et Talto

Les de réhabilitation travaux des infrastructures sont en cours pour les vallées de Bakoum (150 ha) et de Ndiama (303 ha). Deux ouvrages génie civil (déversoirs type Giraudet) ainsi que la reprise de la dalle d'un dalot de la digue antisel sont réalisés à Bakoum. A Ndiama deux dalots sont réalisés. Les travaux n'ont pas encore démarré pour la vallée de Talto (202 ha). En raison des fortes pluies et pour éviter d'empiéter les champs notamment à ceux de Ndiama, un arrêt temporaire des travaux est observé. Les travaux ont été repris en octobre avec le rechargement de la digue antisel de Ndiama. Le taux d'exécution du marché est de 40%.



Figure 3 : Ouvrage type Giraudet à Bakoum



Figure 4 : Ouvrage de régulation sur digue antisel de Bakoum



Figure 5 : Ouvrage type Dalot à Ndiama

- Travaux de réhabilitation/aménagement dans la région de Kolda:
 - Réhabilitation et entretien de l'ouvrage du Périmètre Inter Villageois de Sampaté dans la vallée de Médina Namo, Commune de Dioulacolon, Département de Kolda

En partenariat avec les PAPIL, des travaux d'entretien et de réhabilitation ont été effectué :

- Fourniture et pose de clôture du périmètre de Sam Pathé ;
- Fourniture et installation du GMP sur un bac flottant permettant de suivre le niveau d'eau dans la retenue :





Figure 6 : GMP sur le bac flottant et remplissage des parcelles par siphonage

Bénéficiaires des travaux de réhabilitation et aménagement de vallées

- Vallée de Diégoune: Une digue antisel mise en place a permis de protéger 70 ha de terres rizicoles exploitées par 60 ménages du village de Diégoune soit environ 600 personnes bénéficiaires. L'Entreprise a également eu à employer la main d'œuvre locale durant l'exécution des travaux. Pendant la phase des travaux de terrassement une dizaine de personnes dont six (06) habitants de Diégoune sont employées par l'Entreprise. De même cinq (05) manœuvres non qualifiés sont employés pour les travaux de génie civil. Le taux rémunération est de 2 000 F CFA par jour et par manœuvre. Il s'agit essentiellement de jeunes étudiants et élèves qui ont profité des vacances pour faire ces travaux et gagner de l'argent qui leur servira certainement pour la rentrée scolaire de 2016. L'Entreprise emploie occasionnellement des charretiers du village pour les transports de matériaux entre son dépôt et le site des ouvrages.
- Vallées de Bakoum et Ndiama: Des ouvrages de régulation et d'amélioration de la maitrise partielle de l'eau sont construits. La digue antisel de Bakoum sera également réconfortée. Ces deux vallées sont exploitées en majorité par des femmes. Pendant la réalisation des travaux la main d'œuvre locale est régulièrement employée. En effet tous les travaux qui ne nécessitent pas de main d'œuvre qualifiés sont réalisés par des jeunes employés au niveau des villages concernés. Environ 20 à 30 emplois temporaires sont créés durant la réalisation des travaux avec des revenus moyens de 2500 à 3000 F CFA par jour et par personne. Il s'agit principalement de jeunes qui sont chargés d'effectuer des travaux de terrassement et de maçonnerie.
- **Périmètre de Sampathé**: les travaux de réhabilitation ont permis l'exploitation de 10 ha rizicultivable en toute saison. 35 parcelles y ont été aménagées et sont actuellement exploitées par 148 femmes. L'option des femmes est d'alterner la riziculture au maraîchage. Ce modèle a connu beaucoup de succès du fait qu'il permet de contrôler la divagation des animaux.

2.1.1.2 Etudes de réhabilitation et aménagement de vallées

Pour les études les activités réalisées et résultats atteints durant l'année 2015 se présentent comme suit selon la région :

Etudes de réhabilitation/aménagement de vallées dans la région de Ziguinchor :

La sélection d'un Consultant est en cours pour la réalisation des études de réhabilitation d'ouvrages pour améliorer l'exploitation de 1000 ha dans la région de Ziguinchor. Les vallées concernées sont identifiées.

Le processus de recrutement d'un Consultant pour la réalisation des études APS, APD et DAO a commencé depuis le 12 mars 2015.

Le rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt ainsi que la Demande de Propositions sont soumis le 10 avril 2015 à l'Avis de l'IDA qui a émis des commentaires le 18 mai 2015. Ces documents ont été révisés à la lumière des observations de l'IDA sur les versions antérieures et soumis le 27 mai 2015 à nouveau à l'IDA qui a donné son Avis de Non Objection le 15 Décembre 2015. La Demande de Proposition est ainsi transmise aux Consultants de la liste restreinte le 29 Décembre 2015.

Etudes de réhabilitation/aménagement de vallées dans la région de Sédhiou :

AGETIP a lancé le processus de sélection d'un Consultant la réalisation des études pour les études APS, APD, DAO de 2500 ha de vallées. La Demande de Proposition est transmise aux Consultants retenus dans la liste restreinte à la suite des manifestations d'intérêt. La négociation du Contrat est en cours. La faiblesse du Budget a rendu difficile les négociations entre l'AGETIP et le Groupement IDEV-IC/LUQMAN/TECHNOSOL.

L'UCP PPDC a lancé le processus de recrutement d'un Consultant pour les études APS, APD, DAO d'au moins 1000 ha de vallées à Sédhiou depuis le 12 mars 2015. Au total huit (8) vallées sont identifiées. Le rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt ainsi que la Demande de Propositions sont soumis le 10 avril 2015 à l'Avis de Non Objection de l'IDA qui a émis des commentaires le 18 mai 2015. Ces documents ont été révisés à la lumière des observations de l'IDA sur les versions antérieures et soumis à de l'IDA le 27 mai 2015. Ce dernier a donné son avis de non objection le 07 juillet 2015 et la Demande de proposition est transmise aux Consultants de la liste restreinte le 28 Août 2015, l'ouverture des plis est effectué le 09 octobre 2015. Le rapport d'évaluation des propositions technique qui a reçu l'avis de non objection de la DCMP est transmis à l'IDA. Le démarrage des études est prévu durant le premier trimestre 2016.

Etudes de réhabilitation/aménagement de vallées dans la région de Kolda :

La SODAGRI a lancé le Processus de Sélection de Consultant pour la réalisation des études APS, APD et DAO de 5000 ha en juin 2015. Le rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt ainsi que la Demande de Propositions sont soumis le 8 septembre 2015 à l'IDA qui a donné son avis de non objection le 30 novembre 2015.

L'UCP-PPDC a lancé le processus de recrutement d'un Consultant pour la réhabilitation/aménagement d'au moins 600 ha dans la vallée de Sofaniama (MYF). Le choix de cette vallée, sur proposition de l'ARD de Kolda, vient appuyer la mise en œuvre d'un minipôle de développement économique autour de la vallée de Sofamania (MYF) centré sur la riziculture.

Le processus de recrutement d'un Consultant pour la réalisation des études APS, APD et DAO est lancé depuis le 12 mars 2015. Le rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt ainsi que la Demande de Propositions sont soumis le 10 avril 2015 à l'Avis de Non Objection de l'IDA qui a émis des commentaires le 18 mai 2015. Ces documents ont été révisés à la lumière des observations de l'IDA sur les versions antérieures et soumis à l'ANO de l'IDA le 27 mai 2015. Ce dernier a donné son avis de non objection le 07 juillet 2015 et la Demande de proposition est transmise aux Consultants de la liste restreinte le 26 Août 2015. L'ouverture des plis est effectuée le 09 octobre 2015. Le rapport d'évaluation des propositions techniques est soumis à l'ANO de l'IDA après avis favorable de la DCMP. Le démarrage des études est prévu au premier semestre 2016.

2.1.2 Sous Composante 1.2 Mise à disposition de moyens de production en appui à la production et à la productivité du riz, de l'horticulture et de l'ostréiculture, dont l'achat d'intrants et de matériel et le renforcement des capacités

La mise en valeur de rizières est l'une des activités les plus importantes de la sous composante 1.2 du PPDC. Pour atteindre ses objectifs de mise en valeur, le PPDC met l'accent sur la mise à disposition de moyens en appui à la production et la productivité : facilitation de l'accès aux intrants et matériel agricole et le renforcement des capacités des acteurs. Ce processus est centralisé autour des Organisations de Producteurs (OP) qui sont appelées à fournir des services à leurs membres pour consolider les communautés.

a) Riziculture

Les leaders des Organisations de Producteurs partenaires se sont engagés à Sédhiou pour emblaver 25 436 ha, réitérés par les producteurs membres à la base à travers des rencontres de sensibilisation au niveau des zones et/ou bassins de production. Dans la région de Kolda, des organisations se sont approchées du projet pour le développement de la riziculture dans leur zone respective. Les engagements en termes d'emblavures lors de l'atelier de planification avec les OPs sont évalués à 25 630 ha au niveau des 3 régions de la Casamance (cf. graphique ci-dessous). En effet les superficies initialement projetées pour l'année 2015 sont passées de 10 000 ha à 25 630 ha grâce à l'engouement et l'engagement des OP mais aussi à la volonté affichée par les autorités du Sénégal à travers le MAER dans le cadre du Programme National d'Autosuffisance en Riz (PNAR).

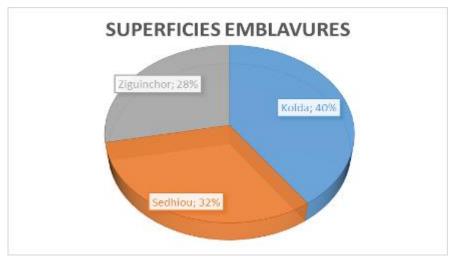


Figure 7 : Répartition des engagements d'emblavures par région en 2015

• Programme de production de semences certifiées

La semence a été identifiée comme porte d'entrée pour un développement inclusif d'une chaine de valeur riz pluviale en Casamance. C'est toute la portée de la signature de convention avec les coopératives semencières au niveau du pôle. Le PPDC compte à travers la diffusion et l'utilisation des semences certifiées adaptées aux terroirs, augmenter la productivité des parcelles de riz et c'est d'ailleurs ; ce qui justifie le renforcement et/ou la consolidation des acquis des acteurs de la semence pour satisfaire les besoins des riziculteurs de la Casamance. Pour l'acquisition de 2000 tonnes semences certifiées en début de campagne, l'UCP a signé un contrat avec 4 coopératives de multiplication de semence. Ainsi 1550 T ont été commandées auprès des OP et les 450 T complémentaires

auprès de la SEDAB à Kolda. Au total, **1459 tonnes de semences certifiées de riz** ont été achetées auprès des coopératives. Ainsi **583 600 000 F CFA** ont été injectés au niveau du secteur privé rural en Casamance. Pour la campagne en cours, 672 Ha sont emblavés en multiplication de semences pour une production estimée à **2366 Tonnes de semences certifiées adoptées à toutes les topo-séquences de sol en Casamance.**

Tableau 2: Répartition des emblavures multiplication de semence 2015-2016 par coopérative

Coopérative semencière	Superficie (Ha)	Production attendue (T)
Blouf Emano	44	132
Kamano/Entente	80	240
COOPAD	25	75
ASSOLUCER	60	180
PAKAO-EST	105	315
FEPROBA	350	1400
JUNO KEBA	8	24
TOTAL	672	2366

Programme de production de riz marchand

Le Programme National d'Autosuffisance en Riz (PNAR) vise un objectif de 1 600 000 Tonnes de paddy en 2017 dont les 40% soit 640 000 tonnes sont allouées au domaine pluvial. La Casamance naturelle représente 90% du domaine pluvial. C'est toute la portée de la contribution du PPDC au PNAR dans la zone Sud du pays, matérialisée par la sollicitation du Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement Rural pour la fourniture de 2000 tonnes de semences certifiées aux producteurs de la Casamance. L'objectif du projet est de permettre aux ménages de couvrir d'abord leurs besoins alimentaires en riz et de dégager progressivement un surplus commercialisable sur les marchés urbains de la Casamance et ensuite dans le territoire national. Pour se faire, la stratégie de mise en œuvre consiste à :

- maintenir une subvention aux producteurs à hauteur de 80% pour l'accès aux intrants de qualité;
- renforcer leurs capacités techniques à travers les parcelles pilotes pour l'adoption à grande échelle des bonnes pratiques et
- renforcer leur organisation pour une meilleure structuration de la filière riz en Casamance.

Un atelier d'évaluation participative de la campagne à mi-parcours a été organisé en Septembre à Ziguinchor et a servi de prétexte pour partager sur les difficultés rencontrées par les acteurs (OPs) et partenaires (DRDR, PNAR, UASZ, service de presse, etc...) dans la mise en œuvre. Une grande motivation et engagement des producteurs ont été notés avec le développement de la culture du riz dans des zones jadis vierges comme le département de Médina Yoro Foula. Les OPs partenaires ont saisi cette occasion pour faire un point de presse sur leur partenariat avec le projet et la mise en œuvre de la campagne rizicole en Casamance. Dans l'ensemble, les cultures se portent très bien avec une pluviométrie excédentaire et bien répartie par rapport à la campagne passée (voir tableau production cidessous) :



Figure 8 : Atelier d'évaluation participative

Figure 9 : Parcelle pilote de riz marchand



Figure 10 : parcelle de riz marchand

Figure 11 : parcelle exploitée par des femmes

Résultats de production (Superficie, rendement et production par département) réellement obtenus en 2015 sur la Riziculture :

DEPARTEMENT	SUPERFICIE(HA)	RENDEMENT(T/HA)	PRODUCTION(T)
Bignona	2359	3,4	8119
Boukiling	240	2,8	672
GOUDOMP	253	3,3	829
Kolda	5403	3,5	18935
MEDINA YORO			
FOULA	555	3,4	1883
OUSSOUYE	295	3,6	1064
Sedhiou	4491	3,4	15255
VELINGARA	3192	2,9	9156
VELINGARA			
ANAMBE	1677	5,7	9571
ZIGUINCHOR	1523	3,5	5331
Total général	19989	3,5	70816

En 2015, le PPDC a réalisé 70 816 tonnes, soit un taux de réalisation de 98,35 du cadre de résultat du projet. Un rendement moyen de 3,5 t/ha, soit un taux réalisation de 177% par rapport à l'indicateur du cadre de résultat. Dans la zone du Bassin de l'Anambé les Producteurs du PPDC ont obtenu un rendement moyen de 5,7 t/ha.

Au total, 13144 bénéficiaires d'intrants ont été recensés dans 88 communes du pôle territoire et les intrants ont été subventionnés à hauteur de 80% pour faciliter l'accès aux populations et les organisations de producteurs ont été responsabilisées dans la sensibilisation, l'identification et la distribution.

Expérimentation d'une double campagne de riziculture (hivernage et de contre saison dans les vallées en Casamance)

Le PPDC a initié avec le PAPIL un programme test de production de riz de contre saison dans le Périmètre Irrigué Villageois (PIV) de Sampathé (commune de Dioulacolon/Kolda). Cette expérience pilote de production de riz irrigué de contre-saison sur 3.5 ha a donné des résultats très encourageants avec un rendement de 2t /ha.

Pour cet hivernage, tout le périmètre de 10 Ha a été labouré grâce au tracteur acquis avec l'appui du PAPIL et emblavé par les populations avec un rendement de 4,5t/ha.



Figure 12 : Riz de contre saison à Sampathé

Les parcelles sont exploitées par 4 femmes représentant chacune un ménage. Le nombre de femmes bénéficiaires est estimé à 148, exploitant 35 parcelles. Les exploitants qui ont participé à la visite d'échange au niveau de la vallée se distinguent des autres en termes de comportement végétatif. Les premiers enseignements démontrent les possibilités de développer une double campagne de riz en Casamance et par conséquent contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance en riz en 2017.

Renforcement de capacité des OPs à travers le FNDASP

L'atteinte des objectifs du PPDC passe inexorablement par un investissement sur l'humain et c'est ce cadre que s'inscrit le partenariat avec le FNDASP pour un accompagnement rapproché des producteurs et de leur institution. C'est ainsi que toutes les coopératives et organisations partenaires seront diagnostiquées participative et renforcées suivant programme triennal de mise à niveau sur les plans technique, administratif et organisationnel. Durant le mois de Septembre, des formations sur la méthodologie de collecte de données sur les emblavures et les rendements ont été tenues en collaboration avec les DRDR dans les trois régions administratives de la Casamance au profit des dispositifs internes d'animateurs des organisations partenaires.



Figure 13 : Formation pratique sur la pose de carré de rendement

Mise en place des facteurs de production

✓ Semences

Sur la base des objectifs d'emblavements et de production, une entente directe avec quatre Coopératives semencières de la Casamance a permis l'acquisition de 2.000 tonnes de semences certifiées en riz. Les quotas alloués par fournisseurs et leur niveau de mise en place définitive au niveau de 88 communes ciblées sont résumés dans le tableau suivant :

Tableau 3 : Répartition des quantités de semences fournies aux coopératives

Fournisseurs	Quantité	Quantité	%
	commandée	livrée (T)	satisfaction
	(T)		
FEPROBA/vrac	1160	885	76%
FEPROBA/conditionné	442	442	100%
Blouf Emano	30	25	83%
Entente/Kamano	40	45	113%
REPROSENER	21	21	100%
SEDAB	400	165	41%
TOTAL	2093	1583	76%





Figure 14 : sac de semences

Après la validation des engagements d'emblavures par les producteurs à la base, les besoins en semences certifiées ont été revus à 1779 tonnes. En définitive, 1583 tonnes ont été mises en place soit un taux de 89% de l'objectif. Cet écart s'explique par le retard accusé par certains opérateurs surtout la SEDAB dans le démarrage de la mise en place des semences de sahel108 produites en contre saison dans la vallée du fleuve Sénégal. Le tableau ci-dessous donne un aperçu sur la contribution du PPDC au PNAR en Casamance.

Tableau 4 : Répartition des quantités de semences fournies par le PPDC en la Casamance

Régions	Tonnage globale	Tonnage	e semenc (T)	e Retenu	%
	PNAR	Prévu	Reçu	Cédé	cession
Ziguinchor	914,39	429,89	360,86	151,87	42%
Sédhiou	1461,4	438,63	273,52	222,12	81%
Kolda	2300	910,32	948,18	699,09	74%
TOTAL	4675,79	1778,84	1582,56	1073,09	68%



Engrais

Les marchés ont été attribués à la SEDAB SARL et AGROPHYTEX SA respectivement pour 500 T de triple 15 (NPK) et 400 T d'urée. La situation ci-dessous renseigne sur les quantités allouées par région et les niveaux de cession par région qui avoisinent 98 et 96% respectivement pour l'engrais NPK et l'urée.

Tableau 5 : Répartition des quantités d'engrais fournies par le PPDC en la Casamance

Régions		nage 15- Retenu (Tonnage Urée Retenu (T)			
	Prévu	Reçu	Vendu	Prévu	Reçu	Vendu	
Ziguinchor	120	120	110	91	90	73	
Sédhiou	144	144	144	118	118	118	
Kolda	236	236	236	191	192	192	
TOTAL	500	500	490	400	400	383	



✓ Matériels et équipements agricoles

Un marché d'acquisition de matériels et équipements agricoles constitués de 14 tracteurs, 14 motoculteurs, 10 batteuses et 10 décortiqueuses a été lancé. Le rapport d'évaluation vient d'être bouclé et tous les Avis de Non Objection ont été acquis. Les contrats sont en cours de signature.

Le lancement du marché de l'étude sur la mécanisation en Casamance a été infructueux du fait du nombre faible de cabinets ayant manifesté leur intérêt. Le marché était relancé avec une option de recruter un consultant individuel du fait de la difficulté d'avoir au Sénégal suffisamment de cabinets spécialisés dans le domaine du machinisme. Le matériel sera livré en début de l'année 2016.

√ Bénéficiaires volet riz

L'objectif qui est 10 000 personnes à impacter en 2015 est déjà dépassé grâce à ce volet. En effet la mise en place d'intrants pour la campagne 2015/2016 a permis de toucher 13 144 personnes à travers la Casamance.

La répartition des bénéficiaires par catégories de producteurs et par sexe est présentée dans les graphiques ci-après.



Répartition des bénéficiaires par sexe

100%
50%
60%
40%
Femmes Hommes

Figure 17 : Bénéficiaires par catégorie de producteurs

Figure 18 : Bénéficiaires par sexe

b) Horticulture

Une convention de maitrise d'ouvrage déléguée a été signé avec l'Agence Nationale d'Insertion et de Développement Agricole (ANIDA) pour la mise en place de fermes horticoles dans le pôle. Durant ce semestre, l'ANIDA et l'UCP ont organisé deux missions de terrain au niveau de la Casamance qui ont permis de proposer deux modèles d'investissement de fermes horticoles de 6 et 100 millions de FCFA respectivement pour les petits blocs maraichers et les fermes de 10 ha pour les groupes de jeunes. Une planification d'exécution du volet est faite pour les trois années à venir et des ateliers régionaux de validation du programme horticole du projet sont prévus en collaboration avec les conférences d'harmonisation installées par les Gouverneurs des régions. La dernière mission avec ANIDA a permis de valider les blocs maraichers des femmes à réhabiliter et une Demande de Renseignement de Prix (DRP) est lancé pour le recrutement de prestataires pour la réhabilitation et l'amélioration de l'équipement d'irrigation d'une dizaine de périmètres horticoles de 1 à 3 ha pour des groupements de femmes et de jeunes.

Aussi, des comités départementaux et régionaux de pré sélection des bénéficiaires des fermes horticoles de 10 ha pour les groupes de jeunes seront installés mais aussi l'identification et le choix des sites pour les centres de groupages secondaires. L'avis favorable de l'IDA pour la tenue d'ateliers dans ce sens est obtenu en novembre 2015.

c) Ostréiculture

L'objectif stratégique est de promouvoir la commercialisation des huitres à l'état frais afin d'améliorer de manière significative le revenu des femmes tiré de l'exploitation des huitres. Pour atteindre cet objectif la construction d'un dégorgeoir est un impératif.

Le site de Tobor s'est distingué des autres de par sa proximité aux réceptifs hôteliers de la ville de Ziguinchor, sa position au bord de la route RN6 à l'entrée de Ziguinchor et surtout la qualité des eaux (compositions microbiologique et chimique). Les démarches au niveau de la commune de Niamone sont déjà effectuées et un avis favorable a été reçu car ce projet figurait en bonne place dans la planification de la commune (Plan d'Investissement Communal). Les TDRs des études pour la conception des plans du dégorgeoir ont transmis au consultant/Assistant Technique en ostréiculture de l'UCP/PPDC. Les études sont finalisées et un DAO sera lancé pour le recrutement des entreprises pour le démarrage des travaux dont la réception est prévue dans le courant du premier trimestre 2016.

Grâce au point focal recruté par la FRGPF avec l'appui du PPDC, les sites d'élevage ostréicole existants ont été caractérisés et le matériel d'exploitation a été acheté par le projet pour renforcer et par ricochet redynamiser les blocs ostréicoles. C'est ainsi que des missions régulières de supervision et d'appui technique sont organisées conjointement par le FRGPF et les services de l'ANA et du SRPM de Ziguinchor dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail 2015.

La visite d'échange organisée au niveau des îles du Saloum et à Dakar a été restituée aux membres du bureau de la coopérative ostréicole élargi aux responsables départementaux de la FRGPF. Les leçons tirées ont été partagées et la nécessité de suivre la finalisation des travaux de construction du dégorgeoir de Katakalousse a été validé par les acteurs. Aussi, les femmes sollicitent la prise en compte du volet ostréicole dans la phase2 du PEIB.



Figure 19 : Atelier de restitution de la visite d'échange organisée par la FRGPF.

Une cérémonie de remise de matériels ostréicoles au cinq groupements est organisée en début novembre 2015.

✓ Bénéficiaires du volet ostréicole.

Le volet ostréicole impacte directement 5 structures de GPF de cinq localités réparties à travers la région de Ziguinchor. Quatre-vingt-douze pour cent (92%) des membres de ces structures bénéficiaires sont des femmes. Le tableau ci-après présente en détail la composition de ces groupements.

Tableau 6 : GPF bénéficiaires du Programme ostréicole

Village	Structure	Nombre membre	Homme	Femme
Niaguis	GPF	111	2	109
Baghagha	GPF	83	2	81
Tobor	GPF	90	5	85
Etama	GPF	31	1	30
Essaout	GPF	71	20	51
	Totaux	386	30	356
		Pourcentage	8%	92%

2.1.3 Sous Composante 1.3. Mise à disposition de petites infrastructures post récoltes dont les centres de groupage

Une Convention de Maîtrise d'Ouvrage Délégué a été signée avec l'AGETIP en mars 2015 pour la construction des centres de groupages et de petites plateformes secondaires. Des ateliers régionaux sont prévus pour le choix des sites d'emplacement des infrastructures. Dès que ces sites seront connus, l'AGETIP va lancer le processus de sélection de Consultants pour les études d'au moins huit (8) plateformes économiques intégrées et de petites plateformes logistiques y compris les centres de groupage.

2.1.4 Sous Composante 1.4. Amélioration de l'accès aux marchés à travers le développement de la Plateforme Economique Intégrée de Bignona

Une Convention de Maîtrise d'Ouvrage Délégué a été signée avec l'AGETIP en mars 2015 pour la mise en œuvre de cette activité de développement de la PEIB et d'autres infrastructures de marché. L'AGETIP qui lancé un avis d'appel à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un Consultant chargé des études techniques, environnementales, sociales et la supervision des travaux le 15 mai 2015. La Demande de propositions est transmise au Consultants le 07 juillet 2015 et les plis sont ouverts le 13 août 2015. Le démarrage des études est prévu au premier trimestre de l'année 2016.

De même le processus de recrutement d'un Consultant pour la conception du schéma de gestion/exploitation de la PEIB est en cours. La demande de proposition (DP) est transmise aux 6 cabinets de la liste restreinte le 26 Aout 2015 et les plis ont été ouverts le 13 octobre 2015. La signature du marché et le démarrage des études sont prévus en début 2016.



Figure 20 : Plateforme Economique Intégrée de Bignona, vue de l'intérieur



Figure 21 : Plateforme Economique Intégrée de Bignona, vue de façade

2.2 ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA COMPOSANTE 2 : ACCESSIBILITÉ RURALE

Cette composante vise à désenclaver dans les cinq (5) années, les communautés rurales les plus isolées et à améliorer l'accessibilité des populations aux routes menant vers les marchés locaux. Elle comprend quatre sous-composantes: (a) l'amélioration de l'accessibilité au niveau des communautés rurales (CR) les plus pauvres par le traitement de points critiques d'environ 350 km de routes locales reliant les Communes Rurales au réseau classé ou aux centres urbains, (b) la réhabilitation/entretien périodique de 200 km de routes rurales pour améliorer l'accès aux infrastructures commerciales et aux zones à fort potentiel agricole, (c) la mise en œuvre d'un projet pilote d'entretien de pistes rurales par la méthode à haute intensité de main-d'œuvre et (d) le renforcement des capacités des ARD et des Communes dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage de l'entretien de pistes rurales.

Pour la mise en œuvre des activités de la composante 2 « Accessibilité Rurale », une convention de Maitrise d'Ouvrage Déléguée a été signée en septembre 2014 entre le PPDC et l'AGEROUTE conformément à l'accord de crédit.

Après les activités liées à la préparation et la signature de la convention MOD Agéroute-PPDC, le 28/08/2014, les activités ci-dessous (études et travaux) sont réalisées cours du premier semestre de l'année 2015 :

2.2.1 Etudes de réhabilitation de pistes et traitement de points critiques

Etudes de réhabilitation de 200 km de pistes

Actualisation des études et élaboration d'un dossier d'appel d'offres pour les travaux de réhabilitation et/ou d'entretien périodique de pistes de désenclavement des axes Diégoune – Balinghor et Affiniam – Diatock dans le département de Bignona, Région de Ziguinchor. Le marché a été attribué à Serigne Touba DIA pour un montant de (TTC): 31 886 273 FCFA pour un délai d'exécution : 02 Mois, sous l'Ordre de Service N°: 001/AGEROUTE/DG/DGER/15 du 07/01/2015. Les études et le DAO de travaux sont réalisés.

NB: L'intitulé initial des axes concernés par l'actualisation des études est Diégoune – Balinghor et Affiniam – Diatock. Cependant, la section Elana – Diatock fait partie de la deuxième phase de la Boucle du Blouf dont les travaux de bitumage sont en cours, Ainsi, le tronçon Affiniam – Diatock devient Affiniam – Elana avec un linéaire de 11.412 km.

 Etudes techniques d'exécution, socio-économiques, environnementales et élaboration d'un DAO pour la construction et/ou réhabilitation de 180 km de pistes rurales dans les régions de Ziguinchor (dont la « Boucle du Fogny ») et Kolda. Ce Marché intitulé OS N°012/DG/DPR/AGR/15 du 12/06/2015, est attribué à INGENIEURS CONSULTANTS ASSOCIES (ICA) pour une durée d'exécution de 06 mois avec un montant de 98 884 000 FCFA TTC.

Du fait de l'existence d'une étude APD sur le tronçon Kolda-Pata, cette section a été mise en priorité. Le bureau a ainsi élaboré un DAO pour cette section. Le DAO a été lancé et la procédure d'attribution est en cours.

Pour les tronçons restants, les études ont été réalisées et les DAO sont élaborés. Ils seront lancés dès réception de l'ANO de la DCMP. Les rapports d'études environnementaux devraient être transmis sous peu aux Directions Régionales de l'Environnement pour examen en comité technique.

***** Etudes de traitement de points critiques

 Le marché pour la réalisation des études techniques d'exécution, socio-économiques et élaboration d'un Dossier d'Appel d'Offres pour traitement de points critiques de 350 km de pistes dans les régions de Sédhiou et de Kolda est signé en novembre 2015. L'IDA a donné son ANO sur le contrat reçu le 05 Octobre 2015. Le consultant a déposé son rapport d'orientation méthodologique. Les études sont en cours, la livraison des DAO est prévue à la fin du mois de Février 2016.

2.2.2 Travaux de réhabilitation de pistes et traitement de points critiques

Travaux de réhabilitation de 200 km de pistes

Les travaux de Réhabilitation et/ou d'entretien périodique de pistes de désenclavement dans la région de Ziguinchor: tronçons Diégoune-Balinghor (7,109 km) et Affiniam-Elana (11,412 km). Le marché est attribué à AREZKI. Le coût total des travaux est évalué à 413 558 435 FCFA TTC pour une durée d'exécution de 04 mois. Les taux de réalisation sont de 95% pour le tronçon Diégoune-Balinghor et de 40% pour le tronçon Affiniam-Elana.

Du fait de la forte intensité des pluies, un arrêt hivernal a été notifié à l'entreprise par OS N°16/DG/DPR/AGR/15 du 13/08/2015. La reprise des travaux est effective depuis Octobre 2015.

Un avenant d'un montant de 80 708 052 FCFA TTC a été initié pour prendre en compte la plusvalue engendrée par l'augmentation de la masse des travaux, surtout au niveau des ouvrages et de l'assainissement. L'IDA a donné son ANO et les travaux devraient être achevés dès l'approbation de l'avenant par le Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan (MEFP). Un Consultant est recruté pour effectuer les prestations de supervision des travaux de réhabilitation de 25 km de pistes rurales et de traitement de points critiques de 23 Km de



Figure 22 : Piste Balinghore-Diégoune



Figure 23 : Dalot sur la piste



Figure 24 : Radier sur la piste

pistes respectivement dans les régions de Ziguinchor et Sédhiou. Le marché d'un montant de 29 833 335 FCFA TTC est attribué à un consultant individuel, Mamadou Moustapha DIAGNE, pour une durée de 5 mois. Le premier rapport mensuel de suivi est transmis en Aout 2015 de même que le rapport de suivi environnemental et social.

- Le Dossier d'Appel d'offres pour la sélection d'une entreprise de travaux pour la réhabilitation de la piste Kolda-Pata (66 km) est relancé en novembre 2015 et l'ouverture des Offres est faite le 15 décembre 2015. Le premier DAO lancé en septembre était infructueux (aucun soumissionnaire).
- •Le processus de sélection de Consultant pour la supervision et le contrôle des travaux de réhabilitation et/ou d'entretien périodique de la piste Kolda Pata (66 km) dans la région de Kolda est en cours.

* Travaux de traitement de points critiques

•Les travaux de traitement d'urgence des points critiques de 23 Km de pistes rurales sont en cours dans la région de Sédhiou. Pour un coût total de 70 852 451 FCFA TTC, le marché est attribué à GEOTOP INGENIERIE SARL pour une durée d'exécution de 03 mois. Le taux d'exécution global des travaux est de 75%. Du fait de la forte intensité des pluies, un arrêt hivernal a été notifié à l'entreprise par OS N° 15/DG/DPR/AGR/15 du 14/08/2015.



Figure 25 : Point critique Sélikégne

Le franchissement est désormais possible en toute saison.



Il est desormais possible d'accèder au village de Bassaf à tout moment, en toute saison.





Figure 26 : Traitement d'un point critique de la piste Affia-Carrefour Ndiaye

•Le processus de sélection de Consultants pour la Supervision des travaux de traitement de points critiques de pistes rurales dans les régions de Sédhiou et de Kolda est en cours de finalisation. Les contrats devraient être finalisés au plus tard en Mars 2016.

2.2.3 Projet pilote d'entretien de pistes rurales par la méthode HIMO et renforcement de capacités des ARD et de CR

- Des ateliers de partage et de validation ont été organisés dans les trois régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Les pistes retenues pour le projet pilote ainsi que le programme de formation ont été validés. Il s'agit :
 - Pour la région de Ziguinchor : Brin-Séléky : 10 km ;
 - Pour la région de Sédhiou : Tankon- Saré Alkaly Bogal Ndiamacouta: 21 km ;
 - Pour la région de Kolda : CF D216 Ndorna : 7 km.

Un programme de formation a également été validé à l'issue des CRD. Les modules suivants ont été retenus : Module 1 : La maitrise d'ouvrage de l'entretien des pistes ; Module 2 : L'entretien des pistes rurales par la méthode HIMO ; Module 3 : Le financement de l'entretien des pistes.

- L'identification des GIE et Groupements est entamé le long des pistes ciblées par le projet pilote, en rapport avec les collectivités locales
- Un protocole d'accord est en cours d'élaboration avec le CFP/TP en vue de la mise en œuvre de ces deux sous composantes.

2.3 ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA COMPOSANTE 3: MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

L'Unité de Coordination du Projet (UCP) est chargée de la gestion fiduciaire, de la coordination des relations avec les bailleurs de fonds, du secrétariat du Comité de Pilotage du Projet (CPP), de la mise en œuvre de l'ensemble des activités du projet, de l'examen des progrès physiques et financiers du projet, de l'analyse et de la consolidation des rapports des agences d'exécution du projet et de la coordination des missions de soutien à la mise en œuvre de la Banque Mondiale.

L'Unité de Coordination du Projet est composée d'un Coordonnateur de Projet, de quatre Spécialistes (Suivi-Évaluation, Chaine de Valeurs, Génie Rural, Passation de Marchés), d'un Responsable Administratif et Financier, d'un Comptable, d'un Assistant Suivi Évaluation, d'un Assistant Secteur Privé et d'un personnel d'appui à l'UCP et à Dakar (secrétaires, chauffeurs).

Par ailleurs, des consultants individuels sont recrutés à temps partiel pour accompagner l'UCP. Il s'agit d':

- Un consultant/AT est recruté pour accompagner la mise en œuvre des activités ostréicoles;
- Un consultant/AT, est recruté pour l'accompagnement de la mise en œuvre de la PEIR·
- Un consultant/AT, spécialiste des filières agricoles est recruté;
- Un consultant/AT, spécialiste en suivi-évaluation et systèmes d'informations.

Ces consultants auront un temps de présence de 5 à 7 jours/mois et selon le besoin pour une période de 12 mois.

Pour le déroulement correct des activités de l'unité de coordination et de gestion du projet certains logiciels, bases de données informatisées sont incontournables pour le suivi évaluation et la gestion comptable et financière du PPDC. Par ailleurs des formations de renforcement de capacités spécifiques sont nécessaires pour les membres du dispositif de suivi-évaluation (relais, animateurs, points focaux etc...).

Sous Composante 31: Renforcement des capacités des acteurs clés à travers le RRDD

Dans le cadre du volet 1 de sa Composante 3, le PPDC compte signer une convention de partenariat avec l'Agence Nationale pour la Relance des Activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC). Pour la bonne mise en œuvre de ce partenariat, les parties prenantes ont élaboré un projet structuré autour des trois (03) axes stratégiques suivants:

- axe 1 : Appui à la réinsertion et la réintégration des personnes retournées et des groupes vulnérabilisés par le conflit ;
- axe 2 : Renouvellement, redynamisation et renforcement des capacités des Cellules d'Alerte, de Prévention des Conflits et de Mobilisation Sociale (CAPCMS),
- axe 3: Information, Communication et mobilisation sociale en faveur de la construction d'une paix durable en Casamance.

Dans le souci d'impliquer tous les acteurs, des Comités locaux et départementaux de Développement sont tenus dans les départements de Bignona, de Ziguinchor, de Oussouye, de Bounkiling, de Kolda et de Goudomp pour prendre en compte les avis des élus, des administrations de l'état, des populations déplacées et celles qui les reçoivent. Ces rencontres ont enregistré la participation des autorités administratives, des Présidents de conseil départementaux, des maires, des structures qui se sont spécialisées depuis quelques années dans l'appui des populations déplacées : il s'agit du CIR, du PAM, des ONG et des associations de femmes des échantillons des populations de retour et accueillantes.

Sous Composante 33: L'appui à la gestion, au suivi et à l'évaluation du projet

Pour cette sous-composante appui à la gestion, au suivi et à l'évaluation du projet les résultats ci-dessous sont obtenus après le recrutement du Coordinateur du Projet et de son staff.

Comme résultats obtenus, on peut citer :

- ➤ L'élaboration du manuel de procédure d'exécution administratif comptable/financier et d'exécution technique/ financier du projet. Cependant pour cette activité, l'UCP compte réviser ce manuel d'ici la fin de l'année 2015.
- L'achat et le paramétrage du logiciel TOMPRO pour le PPDC ;
- > Etablissement de la situation de référence du projet :

Concernant la situation de référence, après l'élaboration des TDR le 04/02/2015, le PPDC avait demandé à l'ANSD de lui soumettre une proposition technique & financière qui serait soumise à l'avis de la Banque Mondiale. Cependant l'offre financière de l'ANSD dépasse de cinq fois le montant de l'activité inscrite dans le PTBA. Par conséquent, le PPDC s'est

orientée vers l'Université Assane Seck de Ziguinchor pour réaliser l'étude de la situation de référence.

Cette nouvelle approche a pour ambition de faire de l'UASZ un laboratoire incontournable dans le cadre des études impacts. Quatre Enseignants Chercheurs ont été cooptés après un appel à candidature au niveau de l'université. Ils vont travailler avec l'UCP, les AT/spécialistes, les populations et les services locaux. L'ANO sur la note méthodologique et budgétaire relative au protocole liant l'UASZ et l'UCP-PPDC est obtenu le 01 Août 2015. Ainsi la convention est signée le 03 Août 2015 pour la réalisation de cette activité qui a aussitôt démarré. L'équipe des universitaires a effectué une recherche bibliographique, de diagnostic et élaboré led questionnaires spécifiques (OP, Ménage, Ostréiculture). La formation des enquêteurs est tenue, les enquêtes ménages sont réalisées au courant du mois de décembre 2015.

Elaboration du manuel suivi évaluation PPDC :

Le manuel de suivi évaluation du PPDC a été élaboré par l'UCP et le document est validé par l'ensemble des parties prenantes les 26, 27 et 28 février 2015.

Ce travail a assitot permis de commencer à mettre en place le dispositif de suivi évaluation du PPDC en rapport avec l'ensemble des parties prenantes. Le schéma ci-dessous décrit le dispositif de suivi-évaluation du PPDC :




Figure 27 : Synopthique du système de Suivi-Evaluation

Etude de base cartographique (SIG) et mise en place d'un Système Informatisé du Suivi Evaluation

Pour cette activité, le PPDC a signé le 17 juin 2015, après l'obtention de l'ANO le jeudi 21 mai 2015, un protocole de partenariat avec le Centre de Suivi Ecologique (CSE) qui est une Structure Etatique de référence en matière de géomatique dans la mise en place de bases de données spatiales. Les activités vont démarrer en juillet 2015 pour une durée de quatre mois. Le CSE a déjà effectué les recherches bibliographiques préalables. Le rapport provisoire est restitué à l'UCP/PPDC du 14 au 18 décembre 2015. Un atelier de validation avec l'ensemble des parties prenantes sera effectué au courant du premier trimestre de l'année 2016.

Réalisation du site web du Projet

Les TDR pour le site web du Projet sont élaborés depuis début janvier 2015. L'ANO fut obtenu le 25/02/2015. Le site web du PPDC est en ligne depuis début juin 2015.

Formation des animateurs/relais/points focaux et DRDR

En rapport avec la FNDASP, le dispositif du suivi évaluation au niveau local mais aussi les DRDR sont formés sur les techniques que collecte de données production (superficie, mesures de carré de rendement, usage des GPS, etc)

Evaluation et Calcul des données de la Compagne agricole 2015 avec la DAPSA

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, en particulier le suivi des indicateurs du cadre de résultat de la composante1, le PPDC et la DAPSA, se sont convenu d'un commun accord pour évaluer et calculer les productions de riz de la campagne 2015. A cet effet, une mission conjointe de terrain est organisée afin de calculer les statistiques et indicateurs de production (superficies, production, rendements) : total, Moyennes, proportions et variance, etc.

Communication autour du Projet

Pour ce volet, les différents canaux audio-visuels sont utilisés (télévision : nationale, privées ; radios : nationale, privées, communautaires ; presse écrite, sensibilisations de masse ; site web ; et les réseaux sociaux (facebook et twitter) ; etc). Ces activités ont permis de toucher toutes les Collectivités locales donc la population de la Casamance. Les statistiques de ces activités se résument comme suit :

- Depuis le début du mois de mars 2015, une vaste campagne de communication et de mobilisation sociale est mise en œuvre par le projet en vue d'accompagner la réalisation des objectifs du PNAR (riz) et du PPDC en général à Sédhiou, Kolda, Ziguinchor. Un vaste travail est effectué avec les OPs pour la mise en place d'intrants de qualité.
- Trois (3) CRD ont été tenus dans les régions du pôle. Des rencontres sur le PPDC sous formes des CDD ont été organisés au niveau de certains départements (Oussouye, Bignona). Aussi, sous l'égide du Gouverneur de la région de Ziguinchor, des CDD ont été organisés pour sensibiliser les autorités religieuses et coutumières (imams, prêtres, rois d'Oussouye) sur le rôle du PPDC dans le PNAR. Deux CLD ont été organisés (Arrondissements Tendouck et Niassya).
- Au sortir d'un l'atelier d'évaluation organisé à Ziguinchor, les leaders d'OPs partenaires ont tenu un point de presse pour faire un bilan à mi-parcours de la campagne rizicole 2015-2016.
- La tournée organisée par le Coordonnateur du PNAR en Casamance a servi de prétexte de communication autour du PPDC avec nos partenaires sur le terrain notamment la SODAGRI, les DRDR et les OPs.
- Des tournées aussi sont organisées par le Coordinateur et Responsables technique du projet pour montrer les réalisations (digues, pistes) de 2015 mais surtout montrer les excellents résultats de la première campagne agricole sur la riziculture du PPDC.
- Au total soixante-onze (71) séances de sensibilisation de masse sont organisées. Ces sensibilisions sont réparties comme suivant les régions : quatorze (16) sensibilisations de masse à Ziguinchor, dix-huit (18) à Sédhiou et trente-sept (37) à Kolda.
- Vingt-trois (23) émissions radios sont tenues avec respectivement : dix-sept (17) à Ziguinchor, douze (12) à Kolda et quatre (4) à Sédhiou.
- Quatre (4) reportages et émissions télévisions sont tenues.

Au prochain trimestre, un sondage sera effectué à travers la Casamance en rapport avec les relais, animateurs et points focaux pour une appréciation du niveau de satisfaction et du nombre de personnes informées vivant dans la zone du projet.

Mise en place et Acquisition d'un logiciel informatisé web pour le système de suivi évaluation du projet :

Les TDR sont élaborés, la demande ANO a été soumise à la Banque Mondiale depuis le début du deuxième trimestre de l'année 2015.

Acquisition de matériel roulant

Réception de 2 véhicules du lot N°1 sur les 5 véhicules prévus en 2015. Le marché pour les trois autres est en cours exécution.

Acquisition de Matériel de bureau et informatique :

Des lots complets d'équipements et mobiliers de bureau ont été réceptionnés en février 2015. Ces équipements ont permis à l'UCP initialement hébergée dans les bureaux de l'ARD, de déménager dans ses propres locaux sis au Quartier Néma II complémentaire -Ziguinchor, lot n°5 près du Camp militaire, BP 1391 Ziguinchor.

III. Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre:

Avec le recrutement tardif du staff technique du PPDC, des écarts positifs et négatifs sont notés dans la mise en œuvre de la programmation des indicateurs du cadre de résultats comme contenu dans la planification du document de projet du PPDC au 31 décembre 2015 (voir annexe cadre de résultat du projet). Cependant, il faut souligner que le PTBA 2015 a été élaboré en tenant compte des indicateurs techniques et financiers à atteindre en fin 2015 en rapport avec le PAD.

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre sont liées principalement :

Au plan institutionnel par:

- le décalage entre Signature du contrat du Coordinateur & Signature de l'accord de crédit de la BM avec l'Etat du Sénégal. De même que la mise en place tardive de l'équipe technique (Nov. 2014);
- la révision du schéma institutionnel d'exécution du PPDC avec l'entrée en vigueur de l'Acte 3.
- L'absence d'antennes PPDC à Sédhiou & Kolda

Au plan socio – économique:

- le renchérissement du coût des prestations et des travaux du fait de la sécurité de la zone;
- la Sous-estimation du coût des périmètres maraîchers /par rapport aux objectifs (300 fermes x 10 ha/fermes) à 1 milliard.
- La capacité limitée des entreprises à réaliser des travaux dans des délais raisonnables.
- Faible capacité de partenaires publics techniques à accompagner le projet.

 Très forte activité politique dans la zone d'intervention qui ralentit l'exécution du PPDC:

Au plan Communicationnel:

• La Confusion entre le Pole Territoire Casamance & le PPDC par certains élus, population et autorités administratives et locales.

Au plan Procédures administratives comptables & financières

La double exigence de respecter les procédures nationales et directives de la Banque Mondiale, limitent la vitesse d'exécution des travaux. Les gros marchés sont particulièrement concernés. Il en est de même pour les retards accusés dans les Avis de Non Objection.

IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Lancé par les plus Hautes Autorités de l'Etat en présence de la Banque Mondiale en mars 2014 à Ziguinchor, le PPDC a effectivement démarré ses activités avec le recrutement du staff technique en Octobre-Novembre 2014. Sa mise en œuvre a suscité un intérêt réel tant pour les Autorités de l'Etat, les élus locaux que pour les populations de la Région Naturelle de la Casamance.

Malgré le retard accusé, on note aujourd'hui un rythme acceptable, confirmé par la dernière mission de supervision de l'IDA.

La validation de la planification de l'année (PTBA 2015) a pu être effectuée à temps. La délégation de services à des Agences spécialisées et la centralisation de la stratégie de la mise en œuvre autour des producteurs, ont fini de susciter un engouement et un engagement solidaire des acteurs autour des objectifs du projet.

Cette option stratégique du PPDC de travailler autour des OPs de la Casamance a déjà permis de noter des effets suivants :

- Plus de 800 millions FCFA sont injectés dans l'économie locale via l'achat des semences certifiées auprès des organisations structurées de la zone dont 583 600 000 Fcfa à travers des OP.
- Cette opération a permis aux riziculteurs et à leurs membres de rembourser les créances à la CNCAS, de payer des vivres de soudure.
- Les organisations ont gagné en crédibilité auprès de leur Banque.

En outre, cette démarche inclusive, participe à renforcer la synergie des actions pour une meilleure cohérence des interventions de l'Etat dans le Pôle Territoire de la Casamance. En effet tous les intervenants travaillent à améliorer la compétence des Ops et de leurs membres, la coordination des intervenants autour du FNDASP facilite la mise en cohérence.

Cependant, l'analyse de la mise en œuvre des activités appelle de la part de l'UCP-PPDC à formuler les recommandations suivantes :

- Renforcer la capacité des Ops pour leur permettre de remplir leurs obligations dans leurs contrats de performance.
- Prévoir des ressources additionnelles pour atteindre les indicateurs de résultats escomptés du PAD;
- Mise en place d'Unités légères au niveau de Sédhiou et Kolda.

- Travailler avec ANRAC pour renforcer la cohérence et l'efficacité des interventions des acteurs dans zones sensibles ;
- Renforcer l'équipe de procurement de la Banque Mondiale à Dakar ;
- Prévoir des cycles de formation systématique dans les UCP en passation de marché pour les staffs techniques.
- Externaliser les services de procurement des UCP par le recrutement d'agences spécialisées ;
- Réaménager la composante Coordination en attendant des dotations supplémentaires pour prendre en charge la salinisation & ensablement des rizières dans le cadre de la mise en œuvre du PGES;
- Le PPDC ait recours à un spécialiste de la communication/relation publique pour accompagner la mise en œuvre du Projet. Le processus a déjà démarré avec l'élaboration d'un draft de plan d'action et la tenue d'ateliers de prévalidation au niveau départemental.
- intégrer la communication dans les activités du Projet pour donner une bonne perception du PPDC. Il faudrait aussi accompagner les Ops dans la communication avec les cibles en valorisant l'usage des radios communautaires. L'usage du SIG et des NTIC par la mise en place de systèmes informatisés, pourrait renforcer la communication du PPDC.

V. ANNEXES

5.1. CADRE DE RÉSULTAT DU PROJET

N°	Indicateurs	Indicateurs Clés	Unité de mesure	Base au début du projet originel	Vale	eurs cibl	es cumulées			leurs cib cumulées		Fréquence	Source de données/ Méthodologie	Responsabilité de Collection de données	
				-2013	2014	2015	Réalisations 2015	Observations / Commentaires	2016	2017	2018				
							Indic	ateurs de l'ODP							
1	Augmentation du rendement moyen du riz		Т/На	0	0.4	0.9	1,84	Le PPDC a un rendement moyen en 2015 de 3,6 t/ha contre un rendement moyen en Casamance de 1,9 t/ha en 2014	1.6	1.6	1.6	Par an	rapports/	UCP	
	pluvial						(source DAPSA). Au niveau du bassin de l'anambé on a un rendement de 5,7 t/ha					enquête	Partenaires: OPs, CRCR, DRDR, DAPSA		
	Revenu moyen		Milliers					Neuf périmètres à					rapports/	UCP	
2	par hectare d'exploitation horticole		de FCFA	250	315	400	0	réhabiliter sont déjà identifiés.	500	600	675	Par an	enquête	Partenaires: Bénéficiaires, Ops, Anida	
3	Volume de produits locaux transitant		Milliers					à renseigner à partir de 2016 (cfdocument	45	20	25	Dayas	rapports/	UCP	
3	annuellement par la plateforme de Bignona	annuellement par la plateforme de	annuellement par la plateforme de	de Tonnes	0	0	0	0	Projet) Les supports de collecte et de suivi sont déjà élaborés	15	20	25	Par an	enquête	Mairie, Gérant,.

N°	Indicateurs	Indicateurs Clés	Unité de mesure	Base au début du projet originel	Vale	Valeurs cibles cumulées Réalisations			Valeurs cibles cumulées				Source de données/ Méthodologie	Responsabilité de Collection de données
				-2013	2014	2015	Réalisations 2015	Observations / Commentaires	2016	2017	2018			
4	Part de population rurale ayant accès à des routes praticables en toute saison (région de la Casamance)		%	52%[1]	52%	54%	15876 / population totale des communes bénéficiaires	Calcul issu du buffer de 2 km sur les tronçons réalisés en 2015, mais les données du dernier recensement n'est	56%	58%	60%	Par an	rapports/ enquête	UCP Partenaire: AGEROUTE, CL, CSE
5	[information complémentaire: Nombre de populations rurales ayant accès à des routes praticables toute la saison]		(000)	614	614	634	15,876	pas disponible au niveau de ces communes Calcul issu du buffer de 2 km sur les tronçons réalisés en 2015	657 681 705		, a. a.		Partenaire: AGEROUTE,CL, CSE	
								Bénéficiaires						
	Bénéficiaires directs du Projet		Nombre	0	5000	10000	14319	Un taux de réalisation est de 143%.	25000	40000	50000		rapports/	UCP
5	· femmes		%	0	40 50	40 50	Plus de 60% 26%	Donnés résultats enquête sur un échantillon de 948 personnes à travers la Casamance	40 50	40 50	40 50	Par an	enquête	Partenaires: OPs, CRCR, DRDR, FNDAPS
							Indicateur	s de Niveau Intermédi	aire					

N°	Indicateurs	Indicateurs Clés	Unité de mesure	Base au début du projet originel	Réalisations			Valeurs cibles cumulées				Eró		Fréquence	Source de données/ Méthodologie	Responsabilité de Collection de données
				-2013	2014	2015	Réalisations 2015	Observations / Commentaires	2016	2017	2018					
6	Les entreprises et groupements présents au niveau de la plateforme de Bignona		Nombre	0	0	0	0	Données à collecter à partir de 2016 ; Fiches de collecte sont déjà préparées et seront validées le gestionnaire de la Plateforme.	5	10	15	Par an	rapports/ enquête	UCP Partenaires: Municipalité, GIE, etc		
7	Les bénéficiaires satisfaits des services de conseil agricole et rural fournis par le projet		%	0	0	78	62,8%	Donnés résultats enquête sur un échantillon de 948 personnes à travers la Casamance :90,2% sont satisfait de la qualité des semences livrées ; 85, 15 % des bénéficiaires du volet ostréicole sont satisfait du service offert en 2015 90 % des bénéficiaires du volet réhabilitation / aménagement sont satisfait du service offert en 2015	80	85	85	Par an	rapports/ enquête	UCP Partenaire: Ops, CRCR, DRDR, FNDASP, etc		
8	Personnes vivant dans la zone du projet et informées des critères de ciblage des bénéficiaires		%	0	50	50	75,6%	Donnés résultats enquête sur un échantillon de 948 personnes à travers la Casamance : 75,6 % des enquêtés connaissent les critères de ciblage	50	50	50	Par an	rapports/ enquête	UCP Tous les Partenaires		

N°	Indicateurs	Indicateurs Clés	Unité de mesure	Base au début du projet originel	Vale	eurs cible	es cumulées		Valeurs cibles cumulées		Eroguonco		Source de données/ Méthodologie	Responsabilité de Collection de données
				-2013	2014	2015	Réalisations 2015	Observations / Commentaires	2016	2017	2018			
								du Projet - 53,7 % des enquêtés connaissent le PPDC à travers des réunions, rencontres et ateliers						
9	Les rizières réhabilitées, aménagées ou mises en valeur Les rizières réhabilitées,		ha	0	0	5000	20 714	Données traitées par la DAPSA valeur des superficies réhabilitées en 2015	15000	25000	30000	Par an	rapports	UCP OPs, DAPSA/MAER UCP/FNDASP/DRDR
	aménagées Les rizières mises en valeur						725 19 989	et exploitées. Données traitées par la DAPSA						
10	Groupements de femmes et de jeunes dotés d'équipements, de matériels et d'intrants :		Nombre				26	5 GPF ostréicoles, 8 Ops, 3 CRCR, 8 Coop, 1 GIE June Kéba, 8 groupements de femmes dans l'horticulture en décembre 2015. Des supports de suivi sont administrés aux organisations de				Par an	rapports	UCP

N°	Indicateurs	Indicateurs Clés	Unité de mesure	Base au début du projet originel	Valeurs cibles cumulees			Valeurs cibles cumulées		Eroquon		Source de données/ Méthodologie	Responsabilité de Collection de données	
				-2013	2014	2015	Réalisations 2015	Observations / Commentaires	2016	2017	2018			
								producteurs pour suivre les cessions d'équipement, de matériels et d'intrants.						
	· Riz			0	10	20	13		30	40	50			
	· Horticulture			0	15	30	8		45	60	75			Partenaires: Ops, FRGPF, CRCR,
	 Fermes ostréicoles 			0	0	2	5		2	2	2			DRDR, etc.
11	Périmètres horticoles réhabilités ou aménagés		ha	0	0	1000	25,89	Un DAO lancé pour consolider 8 périmètres d'une superficie de 15,89 ha. Les fiches de suivi sont déjà élaborées et validées.	2000	3000	3000	Par an	rapports	UCP Partenaire
12	La Plateforme de Bignona est construite et fonctionnelle		(oui/ non)	non	non	non	0	Plateforme opérationnelle en 2016 et donnée à collecter à partir de cette date.	oui	oui	oui	Par an	rapports	UCP, Partenaires: CL, Gestionnaire
13	Magasins de stockage agricole réhabilités ou construits		Nombre	0	0	0	0	MOD avec AGETIP. Le choix d'implantation est en cours e rapport avec les communautés et les administrations.	5	10	15	Par trimestre	rapports	UCP Partenaire: AGEROUTE, CL, CSE

N°	Indicateurs	Indicateurs Clés	Unité de mesure	Base au début du projet originel	Valeurs cibles cumulées Réalisations			Valeurs cibles cumulées						Source de données/ Méthodologie	Responsabilité de Collection de données
				-2013	2014	2015	Réalisations 2015	Observations / Commentaires	2016	2017	2018				
14	Routes rurales réhabilitées		km	0	0	100	40	Les fiches de suivi sont déjà élaborées et validées. L'hivernage justifie en partie ce retard. Il s'y ajoute que la prévision de démarrage des travaux de la piste Kolda-Pata (65 km) avant la fin de l'année 2015 a été hypothéquée à cause d'un appel offre infructueuse (aucun soumissionnaire). En tout état de cause, le niveau d'avancement des études aussi bien sur les réhabilitations que sur les traitements de points critiques permettront de résorber le gap de 60 km de 2015 et d'atteindre la cible de 2016.	250	400	550	Par an	rapports	UCP	
15	Production moyenne de riz pluvial		Milliers Tonnes	0	30	72	70,816	Données traitées par la DAPSA	135	157	180	Par an	Enquête/ rapports	Partenaires: AGETP, Ops, UCP	

N°	Indicateurs	Indicateurs Clés	Unité de mesure	Base au début du projet originel				Valeurs cibles cumulées				Fréquence	Source de données/ Méthodologie	Responsabilité de Collection de données
				-2013	2014	2015	Réalisations 2015	Observations / Commentaires	2016	2017	2018			
16	L'étude pour la stratégie nationale des pôles de développement est réalisée		(oui/ non)	non	non	oui	ND	Le PPDC travaille avec les communautés à l'élaboration de documents de planification et d'aménagement du territoire (SDAC ou POAS) pour 25 communes tests des 3 régions	oui	oui	oui	Par an	rapports	Coordonnateur, Etat
17	Personnels formés en DDR		Nombre	0	20	40	ND	Un programme a été élaboré en rapport avec ANRAC pour 3 ans. Le dispositif et les indicateurs à suivre seront affinés. Par ailleurs ces indicateurs devront prendre en compte la stratégie déclinée par les plus hautes autorités de l'Etat pour la mise en ceuvre du concept de Réconciliation Reconstruction et Développement Durable (RRDD)	60	80	100	Par trimestre	rapports	UCP Partenaires: ANRAC

5.2. RÉSUMÉ DE PASSATION DE MARCHÉS

Plan de Passation des Marchés de Fourniture, de Travaux et de Services autres que Services de Consultants

Projet Pôle de Développement de la Casamance Plan de passation des marchés pour la période 2014/2016

I. Généralités ID du Projet: P125506

Risque de passation des marchés suite à l'évaluation du projet: "Substantiel"

Révision: 30 Novembre 2015

Date d'approbation :

II. Fourniture, travaux et de services (autres que les services de consultants)

_Tableau 1: Marchés publics soumis à l'examen préalable de l'AID, tel que prévu à l'Annexe 1 des Directives pour la passation de marchés.

	Méthodes de passation des marchés	Seuil d'examen préalable (\$EU)	Commentaires
1.	AOI et AOIR (Fournitures)	= ou >1 000 000 \$ EU	AOI et AOIR utilisés pour tous les contrats de fournitures égaux ou supérieurs à 1 000 000 \$ EU
2.	AON (Fournitures)	Au cas par cas	AON peut être utilisé pour les contrats de fournitures inférieurs à 1 000 000 \$ EU
3.	AOI (Travaux)	= ou >10 000 000 \$ EU	AOI utilisé pour tous les contrats de travaux égaux ou supérieurs à 10 000 000 \$ EU
4.	AON (Travaux)	Au cas par cas	AON peut être utilisé pour les contrats de travaux inférieurs à 10 000 000 \$ EU
5.	AOI et AOIR (Services autres que services de consultants)	= ou >1 000 000 \$ EU	AOI et AOIR utilisés pour les contrats de services (autres que les services de consultants) supérieurs ou égaux à 1 000 000 \$ EU
6.	AON (Services autres services de consultants)	Au cas par cas	AON peut être utilisé pour les services (autres que les services de consultants) inférieurs à 1 000 000 \$ EU
7.	Shopping: Consultation de fournisseurs ou CF (cas des Fournitures); Consultation d'entrepreneurs (cas des Travaux); Consultation de fournisseurs (Services autres que les services de consultants)	Le premier contrat pour chaque catégorie de contrat sera soumis à l'examen préalable	La consultation des fournisseurs (ou shopping) pourra <u>être utilisée</u> pour les contrats dont la valeur estimée est inférieure ou égale à 100 000 \$ EU. En ce qui concerne les marchés de travaux, ce seuil pourra être de 200 000 \$ EU
8.	Entente directe	Tous les contrats soumis à l'examen préalable de l'AID	

2. Liste de contrats, y compris la méthode de passation de marchés et les étapes clés.

Tableau 2 : fournitures, travaux et services (autres que les services de consultants)

Réf. No.	Contrat (Description)	Coût estimatif (\$EU 000)	Méthode de passation de marchés	P/Q	Préféren ce national e	Examen par la Banque (A priori/A postériori)	Date prévue pour lancement appel d'offres	Date prévue d'ouverture des plis	Date prévue signature contrat	Commentaires
1	Acquisition de deux véhicules pour l'UCP	100	CF	Non	Non	A priori	07/11/2014	15/11/2014	25/11/2014	Marché exécuté
2	Acquisition de mobilier de bureau et de matériel informatique pour l'UCP	100	CF	Non	Non	Post	27/11/2014	04/12/2014	10/12/2014	Marché exécuté
3	Acquisition de matériel et équipements agricoles	805	AON	Non	Non	A Priori	10/02/2015	10/03/2015	25/04/2015	Marché exécuté
4	Acquisition de matériel et équipement pour la mise en place d'une bibliothèque numérique	12	CF	Non	Non	Post	10/10/2015	17/10/2015	24/10/2015	
5	Acquisition logiciel de gestion comptable, financière et de suivi évaluation du projet.	30	CF	Non	Non	Post	15/11/2014	30/11/2014	15/12/2014	Marché exécuté
6	Acquisition d'intrants agricoles	3 000	AOI	Non	Non	Post	10/02/2015	10/03/2015	25/04/2015	Marché exécuté
7	Acquisition d'emballages pour les produits agricoles	100	CF	Non	Non	Post	01/08/2015	08/08/2015	15/08/2015	Marché exécuté
8	Gardiennage des locaux	6	CF	Non	Non	Post	02/02/2015	09/02/2015	15/02/2015	Marché exécuté
9	Entretien des locaux	6	CF	Non	Non	Post	02/02/2015	09/02/2015	15/02/2015	Marché exécuté
10	Acquisition de sept (07) motos 123cm ³	25	CF	Non	Non	Post	10/02/2015	17/02/2015	24/02/2015	Le marché est exécuté par les OPs sur appui/conseil de l'UCP dans le cadre des conventions
11	Acquisition de petits matériels de jardinage	225	AON	Non	Non	Post	05/11/2015	05/12/2015	20/12/2015	

Réf. No.	Contrat (Description)	Coût estimatif (\$EU 000)	Méthode de passation de marchés	P/Q	Préféren ce national e	Examen par la Banque (A priori/A postériori)	Date prévue pour lancement appel d'offres	Date prévue d'ouverture des plis	Date prévue signature contrat	Commentaires
12	Acquisition de trois (03) Véhicules pour le compte de l'UCP	190	AON	Non	Non	Post	20/102015	20/11/2015	15/122015	L'appel d'offres sera relancé
13	Acquisition de climatiseurs (splits) pour le compte de l'UCP	9	CF	Non	Non	Post	17/02/2015	24/02/2015	02/02/2015	Marché exécuté
14	Acquisition de fournitures de bureau	14	CF	Non	Non	Post	17/02/2015	24/02/2015	02/02/2015	Marché exécuté
15	Mise en place du réseau informatique et téléphonique de l'UCP	20	CF	Non	Non	Post	17/02/2015	24/02/2015	02/02/2015	Marché exécuté
16	Fournitures de bureau	14	CF	Non	Non	Pos	10/02/2015	17/02/2015	27/02/2015	Marché exécuté

MOD AGEROUTE
Nouvelles activités
Déjà réalisées ou lancées
Activités supprimées
Dates mise à jour

2. Liste de contrats, y compris la méthode de passation de marchés et les étapes clés.

Réf. N°	Contrat (description)	Coût estimatif (SEU 000)	Méthode de passation de marché	P/Q (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue par Banque (priori/post)	Date prévue pour lancement appel d'offres	Date prévue pour ouverture des plis	Date signature contrat	Commentaires
1	Construction du siège de l'Agence de Développement Territorial	250	AON	Non	Non	A priori	15/03/2015	15/04/2015	30/05/2015	L'exécution du marché est liée aux décisions relatives à la suite qui sera donnée à l'acte 3 de la décentralisation
2	Construction de digues anti-sel à Djembering	70	CF	Non	Non	Post	15/01/2015	30/01/2015	15/02/2015	L'appel d'offres a été relancé et les travaux vont démarrer après l'hivernage
3	Construction de digues à Diégoune	160	CF	Non	Non	Post	12/02/2015	12/03/2015	06/04/2015	Le marché est exécuté à hauteur de 90%
4	Construction et équipement du dégorgeoir des huitres à Tobor	92	CF	Non	Non	Post	16/11/2015	18/12/2015	30/12/2015	
5	Travaux de réhabilitation des infrastructures de la vallée Bakoum (150ha), Ndiama (303 ha) et Talto (202ha)	84	CF	Non	Non	Post	05/03/2015	12/03/2015	19/03/2015	Les travaux qui avaient démarré uniquement sur le site de Bakoum sont exécutés à hauteur de 25%. Ils sont à l'arrêt et reprendront sur l'ensemble des sites après l'hivernage
6	Travaux d'aménagement de 1000 ha de vallée à Affiniam	1.400	AON	Non	Non	Post	15/02/2015	15/03/2015	20/04/2015	Les contrats sont signés et les travaux vont démarrer après l'hivernage

Réf. N°	Contrat (description)	Coût estimatif (SEU 000)	Méthode de passation de marché	P/Q (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue par Banque (priori/post)	Date prévue pour lancement appel d'offres	Date prévue pour ouverture des plis	Date signature contrat	Commentaires
7	Travaux de réhabilitation des périmètres horticoles dans la région de Kolda (Kéréwane, MYF, Saré Yoro Buya, Soudou Welyi)	204	AON	Non	Non	Post	15/05/15	15/06/15	05/07/15	
8	Travaux d'aménagement/Réhabilitation de Périmètres Horticoles pilotes dans la région de Ziguinchor	80	CF	Non	Non	Post	20/03/15	25/02/15	30/03/15	
9	Travaux d'aménagement/Réhabilitation de (160) ha de Périmètres Horticoles dans la région de Ziguinchor	733	AON	Non	Non	Post	15/02/15	15/03/15	06/04/15	
10	Travaux d'aménagement/Réhabilitation de (80) ha de Périmètres Horticoles dans la région de Sédhiou	366	AON	Non	Non	Post	15/02/15	15/03/15	06/04/15	
11	Travaux d'aménagement/Réhabilitation de (160) ha de Périmètres Horticoles dans la région de Kolda	733	AON	Non	Non	Post	15/03/15	30/03/15	15/04/15	
12	Travaux de réconfortement des diguettes et construction d'ouvrages de régulation dans la vallée de Mpack dans le Département de Ziguinchor.	300	AON	Non	Non	Postériori	25/01/2016	25/02/2016	25/03/2016	Démarrage des travaux 10/04/2016
13	Travaux de consolidation de périmètres existants dans les régions de Kolda, Ziguinchor et Sédhiou	81	CF	Non	Non	Postériori	15/11/2015	17/12/2015	16/01/2016	Date de démarrage : 31/01/16
14	Travaux de réhabilitation de fermes existants et construction de nouvelles fermes en Casamance.	567	ANO	Non	Non	Postériori	15/02/2016	15/03/2016	10/04/2016	Démarrage des travaux 25/04/2016
A1	Travaux de réhabilitation et/ou d'entretien périodique de pistes de désenclavement dans la région de Ziguinchor : Tronçons Diégoune - Balinghor (7.109 km) et Affiniam – Elana (11.412 km)	1 142	AON	Non	Non	priori	12/02/15	17/03/15	17/04/15	Date démarrage travaux : 27/04/15

Réf. N°	Contrat (description)	Coût estimatif (SEU 000)	Méthode de passation de marché	P/Q (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue par Banque (priori/post)	Date prévue pour lancement appel d'offres	Date prévue pour ouverture des plis	Date signature contrat	Commentaires
A2	Traitement d'urgence des points critiques de 23 km de pistes rurales dans la région de Sedhiou	200	AON	Non	Non	Postériori	20/02/15	24/03/2015	29/04/2015	Date démarrage travaux : 04/05/15
A3	Réhabilitation et/ou entretien périodique e 43 km de pistes rurales dans la		01/01/16	02/02/16	01/04/16	Date démarrage : 15/04/16				
A4	Réhabilitation et/ou entretien périodique de la piste Kolda – Pata (66 km) dans la région de Kolda	3015	AON	Non	Non	Posteriori	12/11/15	15/12/15	15/01/16	Date démarrage : 15/02/16 Le premier appel d'offres a été ouvert le 29/10/15 et a été infructueux (faute de soumissionnaire)
A5	Réhabilitation et/ou entretien périodique de la piste la Thianfar - Pakour (40 km) dans la région de Kolda.	1827	AON	Non	Non	Postériori	01/01/16	02/02/16	01/04/16	Date démarrage : 15/04/16
A6	Réhabilitation et/ou entretien périodique de 26 km de pistes rurales dans la région de Ziguinchor : tronçons Baila - Suelle (10 km) et Sindian - Djibidione (16 km)	1 188	AON	Non	Non	Postériori	01/01/16	02/02/16	01/04/16	. Date démarrage : 15/04/16
A7	Traitement de points critiques de pistes rurales dans la région de Sédhiou	1443	AON	Non	Non	Postériori	11/02/16	11/03/16	11/05/16	Date démarrage : 25/05/16
A8	Traitement de points critiques de pistes rurales dans la région de Kolda	859	AON	Non	Non	Postériori	11/02/16	11/03/16	11/05/16	Date démarrage : 25/05/16

⁽a) Les marchés AOI dont le coût estimatif excède la valeur équivalente de 10.000.000 \$ EU pour les travaux et 1 000 000 EU \$ pour les fournitures par contrat et tous les marchés passés par entente directe seront soumis à un examen préalable de la Banque.

MOD AGEROUTE
Nouvelles activités
Déjà réalisées ou lancées
Activités supprimées
Dates mise à jour

III. Sélection et Emploi des Consultants

Tableau 3 : La sélection et l'emploi des consultants, sous réserve de l'examen préalable de Banque, tel que prévu à l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés pour la sélection et l'emploi des consultants.

	Méthode de passation des marchés	Seuil d'examen préalable (\$EU)	Commentaires
1.	Méthodes de sélection concurrentielle (firmes)	= ou >300 000 \$EU	
2.	Sélection par entente directe (firmes)	Tous les contrats	
3.	Méthodes de sélection concurrentielle (consultants individuels)	= or >\$EU 100,000	
4.	Sélection par entente directe (consultants individuels)	Tous les contrats	
5.	Contrats pour des tâches spécifiques telles que l'élaboration ou la mise à jour du manuel d'exécution du projet, certaines missions de Supervision, le suivi-évaluation, l'audit financier, l'audit technique, les missions afférentes à la passation des marchés	Tous les contrats pourraient être soumis à l'examen préalable	· ·

⁽a) Liste restreinte comprenant entièrement de consultants nationaux. Les listes restreintes pour les services de consultants estimés à moins de 300.000 dollars EU par contrat, peuvent être entièrement composées de consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives relatives à la sélection et à l'emploi de consultants.

⁽b) Les services de consultants (firmes) dont le coût estimatif excède 300.000 dollars par contrat et les services de consultants (individus) dont le coût estimatif est supérieur à 100.000 dollars EU et la sélection par entente directe de consultants seront soumis à un examen préalable de la Banque.

Services de consultants, y compris la méthode de passation de marchés associée et les étapes clés

Tableau 4 1: Services de Consultants

Réf No.	Description de la mission	Coût estimatif (EU 000\$)	Méthode de sélection	Examen par la Banque (priori/post)	Date lancement procédure de sélection	Date de soumission des propositions	Date signature contrat	Commentair es
1	Actualisation des études techniques d'exécution, socio-économiques, environnementales et élaboration d'un DAO pour les travaux d'entretien périodique de pistes de désenclavement des axes Diégoune-Balinghor (8 km) et Affignam-Diatock (17 km) dans le département de Bignona	92	Consultant Individuel	Posteriori	11/11/14	25/11/14	02/01/15	Démarrage actualisation : 05/01/15 ; Disponibilité DAO : 09/02/15
2	Etudes techniques d'exécution, socio- économiques, environnementales et élaboration d'un DAO pour les travaux de construction et/ou réhabilitation de 175 km de pistes rurales dans les régions de Ziguinchor et de Kolda.	300	SFQC	Priori	08/01/15	10/02/15	17/04/15	DAO disponible le 27/10/15
3	Etudes techniques d'exécution, socio- économiques, environnementales et élaboration d'un DAO pour les travaux de traitement de points critiques de 350 km de pistes rurales dans les régions de Sédhiou et de Kolda.	535	SFQC	Priori	24/01/15	12/05/15	23/09/15	DAO disponible le 01/09/15 pour les points critiques et le 01/01/16 pour l'aménagement global

Réf No.	Description de la mission	Coût estimatif (EU 000\$)	Méthode de sélection	Examen par la Banque (priori/post)	Date lancement procédure de sélection	Date de soumission des propositions	Date signature contrat	Commentair es
4	Supervision des travaux de réhabilitation et/ou d'entretien périodique de la piste Kolda – Pata dans la région de Kolda	190	SFQC	Postériori	22/05/15	03/09/15	01/01/16	Date démarrage mission: 15/02/16 Après l'ouverture des offres financières le montant dépassant le seuil de revue à postériori a été envoyé à l'IDA pour ANO
5	Supervision des travaux de réhabilitation et/ou d'entretien périodique de pistes rurales dans les régions de Ziguinchor et de Kolda.	310	SFQC	Priori	26/08/15	10/11/15	11/01/16	Démarrage mission : 20/04/15
6	Supervision des travaux de traitement de points critiques de pistes rurales dans les régions de Sedhiou et de Kolda	260	SFQC	Posteriori	31/07/15	16/11/15	15/01/16	Démarrage mission : 01/02/16
7	Sélection de consultant pour le suivi des travaux et des activités de la mise en œuvre du HIMO et l'élaboration de documents didactiques	90	Consultant individuel	Postériori	30/11/2015	30/12/2015	24/01/2016	Démarrage mission 01/02/2016
9	Supervision des travaux d'aménagement de 1000 ha de vallée à Affiniam	300	SFQC	A priori	15/02/15	30/03/15	15/05/15	Processus de recrutement en cours
10	Sélection de cabinet pour la conception d'un schéma de gestion et d'exploitation de la PEIB	150	SFQC	A priori	02/01/2015	02/02/2015	20/03/2015	Processus de recrutement en cours

Réf No.	Description de la mission	Coût estimatif (EU 000\$)	Méthode de sélection	Examen par la Banque (priori/post)	Date lancement procédure de sélection	Date de soumission des propositions	Date signature contrat	Commentair es
11	Etude de faisabilité technico économique environnementale et sociale détaillée et élaboration de DAO	150	SFQC	A priori	02/03/2015	02/04/2015	20/05/2015	Processus de recrutement en cours
12	Sélection de cabinet pour la réalisation de l'étude sur la situation de référence du projet	80	ED	A priori	01/05/2015	08/05/2015	03/08/2015	L'exécution du marché est en cours avec l'Université de Ziguinchor
13	Sélection de consultant Pour l'élaboration du plan de communication du PPDC	11	CI	A posteriori	20/10/2015	05/10/2015	16/10/2015	
14	Sélection de consultant pour l'élaboration du site web du PPDC	6	CI	A posteriori	15/02/2015	25/02/2015	05/03/2015	Marché exécuté
15	Confection, édition et impression de supports de communication	32	CI	A posteriori	15/01/2015	25/01/2015	05/02/2015	Marché en cours d'exécution
16	Sélection d'un cabinet pour la mise en place d'un système informatisé du suivi évaluation du PPDC	60	SMC	A priori	15/10/2015	30/10/2015	21/11/2015	
17	Mise en place et équipement de la bibliothèque numérique du PPDC	60	SMC	A priori	15/11/2015	30/12/2015	21/01/2016	
18	Sélection de cabinet pour la mise en place du SIG du PPDC	60	ED	A priori	09/05/2015	19/05/2015	17/06/2015	En cours de réalisation avec le CSE
19	Recrutement d'un Assistant Technique pour la mise en œuvre du programme ostréiculture	60	CI	A priori	15/01/2015	25/01/2015	05/02/2015	Les AT sont recrutés et ont chacun un
20	Recrutement d'un Assistant Technique Spécialiste en Suivi Evaluation	60	CI	A priori	15/01/2015	25/01/2015	05/02/2015	temps de
21	Recrutement d'un Assistant Technique spécialiste filière agricole et OP	72	CI	A priori	15/01/2015	25/01/2015	05/02/2015	présence de 10 à 15 jours par mois sur
22	Recrutement d'un Assistant Technique pour l'accompagnement de la mise en œuvre de la PEIB	60	CI	A priori	15/01/2015	25/01/2015	05/02/2015	une période de 12 mois.

Réf No.	Description de la mission	Coût estimatif (EU 000\$)	Méthode de sélection	Examen par la Banque (priori/post)	Date lancement procédure de sélection	Date de soumission des propositions	Date signature contrat	Commentair es
23	Recrutement d'un Assistant Technique en communication	60	CI	A priori	15/01/2015	25/01/2015	05/02/2015	
24	Sélection d'un consultant pour l'étude sur package technologique à appliquer dans les vallées rizicoles, sur les plateaux, le fonctionnement et les modalités (mécanisation)	50	CI	A priori	26/11/2015	26/12/2015	15/01/2016	
25	Sélection d'un Consultant pour l'étude de la réhabilitation de périmètres horticoles dans la région de Kolda dans le Sofaniama (Kéréwane, Saré Yoro Buya, Walia de MYF, Soudou Welyi)	70	CI	A priori	15/02/2015	25/02/2015	05/03/2015	
26	Sélection de consultant pour le suivi- contrôle des travaux d'aménagement/réhabilitation de périmètres horticoles pilotes dans la région de Ziguinchor	45	CI	A priori	15/02/2015	25/02/2015	05/03/2015	
27	Sélection de consultant pour les études d'aménagement/réhabilitation de 80 ha de périmètres horticoles dans la région de Sédhiou	70	CI	A priori	25/02/2015	15/03/2015	30/03/2015	
28	Sélection de consultant pour les études d'aménagement/réhabilitation de 160 ha de périmètres horticoles dans la région de Kolda	92	CI	A priori	05/03/2015	20/03/2015	30/03/2015	
29	Sélection de consultant pour les études d'aménagement/réhabilitation de 160 ha de périmètres horticoles dans la région de Ziguinchor	92	CI	A priori	15/03/2015	25/03/2015	05/05/2015	

Réf No.	Description de la mission	Coût estimatif (EU 000\$)	Méthode de sélection	Examen par la Banque (priori/post)	Date lancement procédure de sélection	Date de soumission des propositions	Date signature contrat	Commentair es
30	Sélection d'un consultant pour les études APS, APD et l'élaboration de dossiers d'appel d'offres (DAO) pour réhabiliter/aménager et mettre en valeur 600ha dans la vallée de Sofaniama (MYF) à Kolda	202	SFQC	A priori	24/02/2015	09/04/2015	25/07/2015	Déjà lancé
31	Sélection de consultants pour les études APS, APD et l'élaboration de dossiers d'appel d'offres (DAO) pour réhabiliter/aménager et mettre en valeur 1000ha de vallées rizicoles dans la région de Sédhiou	304	SFQC	A priori	24/02/2015	09/04/2015	25/07/2015	Déjà lancé
32	Etude APS, APD et DAO pour réhabiliter/aménager des ouvrages pour l'amélioration de la mise en valeur de 1000 ha dans la région de Ziguinchor	304	SFQC	A priori	24/02/2015	09/04/2015	25/07/2015	Déjà lancé
33	Sélection d'un Consultant (Ingénieur Génie Rural) pour le diagnostic des ouvrages, la proposition de réhabilitation et l'élaboration du dossier de Consultation des entreprises (DCE) relatifs aux vallées de Bacoum (150 ha) de Talto (202ha) et de Ndiama (303ha) dans la région de Sedhiou	30	CI	A priori	10/02/2015	17/02/2015	28/02/2015	Déjà lancé
34	Sélection d'un Consultant pour la Supervision des travaux de réhabilitation des infrastructures des vallées de Bacoum (150 ha) de Talto (202ha) et de Ndiama (303ha) dans la région de Sedhiou	50	CI	A priori	10/02/2015	17/02/2015	28/02/2015	Déjà lancé
35	Sélection d'un Consultant pour la Supervision des travaux de Construction de la digue antisel de Diégoune	35	CI	A priori	10/02/2015	17/02/2015	28/02/2015	

Réf No.	Description de la mission	Coût estimatif (EU 000\$)	Méthode de sélection	Examen par la Banque (priori/post)	Date lancement procédure de sélection	Date de soumission des propositions	Date signature contrat	Commentair es
36	Sélection de consultants pour les études APS, APD et l'élaboration de dossiers d'appel d'offres (DAO) pour réhabiliter/aménager et mettre en valeur des vallées à Ziguinchor en différents lots.	300	SFQC	A priori	01/04/15	15/05/15	15/08/15	Déjà lancé
37	Sélection de consultants pour les études APS, APD et l'élaboration de dossiers d'appel d'offres (DAO) pour réhabiliter/aménager et mettre en valeur des vallées à Sédhiou en différents lots.	610	SFQC	A priori	01/04/15	15/05/15	15/08/15	
38	Sélection d'un consultant pour le diagnostic institutionnel des OP	90	CI	A priori	20/10/2015	10/11/2015	25/11/2015	
39	Recrutement d'un Consultant Spécialiste Genre et Jeunes	41	Consultant individuel	Posteriori	10/10/2015	26/10/2015	05/11/2015	
40	Recrutement d'un Spécialiste participation citoyenne	41	Consultant individuel	Posteriori	12/10/2015	28/10/2015	08/11/2015	
41	Sélection d'un Consultant pour la réalisation d'une étude pour les travaux de consolidation des diguettes et la construction d'ouvrages de régulation dans la vallée de Mpack dans le Département de Ziguinchor.	22	Consultant individuel	Posteriori	15/11/2015	30/11/2015	05/12/2015	Démarrage étude le 15/12/2015 DAO dispo. le 20/01/2016
42	Sélection d'un Consultant chargé de la surveillance et contrôle des travaux de consolidation des diguettes et la construction d'ouvrages de régulation dans la vallée de Mpack dans le Département de Ziguinchor	5	Consultant individuel	Posteriori	15/01/2016	15/02/2016	15/03/2016	Démarrage prestations 15/04/2016
43	Etudes et Contrôle/supervision des travaux de réalisation de fermes et périmètres maraichers dans les 3 régions.	165	SFQC	Posteriori	30/11/2015	15/12/2015	29/01/2016	Démarrage prestations 15/02/2016
44	Recrutement de Consultants pour le Contrôle des travaux de Consolidation de périmètres	10	Consultants individuels	Posteriori	15/11/2015	30/11/2015	15/12/2015	Date démarrage : 31/01/16

	Réf No.	Description de la mission	Coût estimatif (EU 000\$)	Méthode de sélection	Examen par la Banque (priori/post)	Date lancement procédure de sélection	Date de soumission des propositions	Date signature contrat	Commentair es
4	45	Sélection d'un Consultant pour la Supervision des travaux de Construction de la digue antisel de Djembéring	5	Consultant individuel	Posteriori	15/12/2015	04/01/2016	24/01/2016	Date démarrage : 20/02/2016

MOD AGEROUTE
Nouvelles activités
Déjà réalisées ou lancées
Activités supprimées
Dates mise à jour

5.3. NIVEAU D'EXÉCUTION DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL BUDGÉTISÉ (PTBA) 2014-2015 :

		Activités	Résultats/Niveaux d'exécution	Objectifs	Observations/Commentaires
	<u> </u>		a post-récolte et à la mise en march	é au profit de chaînes de va	aleur ciblées
So	the state of the s	e11: Réhabilitation, aménage	ment et mise en valeur de rizières		
	ACTIVITÉS				
		Réhabilitation et aménagem	ent de vallées		
	A 11.1.1	Réhabiliter/Aménager les vallées de Djiémbéring et Diégoune	 Diégoune : 95% des travaux exécutés ayant permis de récupéré 70 ha réhabilités 	Diégoune (47,13ha)	Pour Diégoune la surface à réhabiliter s'est élargie suite au prolongement de la digue 900 à 1600 m
			Djiémbéring : selection de l'entreprise en cours	Djiémbéring (143ha),	Contrat signé.
	A11.1.2:	Aménager 600ha dans la vallée de Sofaniama (MYF) à Kolda	le recrutement du cabinet d'études est en cours	600ha dans la vallée de Sofaniama	 Une visite d'identification de la vallée a été effectuée et le processus de sélection d'un Consultant pour la réalisation des études d'APD et l'élaboration d'un DAO est en cours depuis mars 2015. Les contrats de travaux sont signés. Le recrutement de la mission de contrôle est en cours.
	A11.1.3:	Aménager 1000 ha dans les 7 vallées à Sédhiou	 Les études pour l'aménagement des trois vallées (655 ha) sont réalisées à 100%. Le recrutement d'une firme pour les APS, APD, DAO pour passer de 1000 ha intialement prévus à 2900 ha de vallées à Sédhiou est en cours. Les travaux de réhabilitation d'infrastructures initialement prévus au troisième trimestre de l'année 2015 ont démarré depuis juin dans 3 vallées (Bakoum, Ndiama, Talto) et permettront de valoriser 655 ha. 	1000 ha sont aménagés dans 7 vallées à Sédhiou	 Le PPDC a fait réaliser les études et sélection une entreprise pour effectuer travaux de réhabilitation des infrastructures de trois vallées (Bakoum, Ndiama et Talto) ce qui permettra la valorisation de 655 ha. Initialement la réhabilitation de 1000 ha était prévue. Cependant, en plus de ces trois vallées dont les travaux sont en cours, huit (8) autres vallées ont été identifiées et ciblées pour être étudiées dans cette région. Ces huit vallées totalisent 2 900 ha et polarisent 52 villages. Les propositions des consultants sont en cours d'évaluation. La signature du marché et le démarrage des études sont prévus au prochain trimestre.

	Activités	Résultats/Niveaux d'exécution	Objectifs	Observations/Commentaires
A11.1.4:	Signer un contrat de maitrise d'ouvrage délégué avec la SODAGRI pour aménager et mettre en valeur de 5000 ha de Vallées	 Le contrat est signé au début de semestre Le processus de recrutement d'un cabinet pour les études d'aménagement et de mise en valeur de 5000 ha vient d'être lancé 	Un contrat de Maitrise d'ouvrage délégué est signé avec la SODAGRI pour aménager et mettre en valeur des 5000 ha étudiés	Un premier draft du PTBA est en cours d'examination. Le taux de réalisation des activités prévues au 30 juin est de 10% si l'on considère les étapes à faire. L'IDA a donné son ANO, le 30 novembre 2015 sur le apport d'évaluation des manifestations.
A11.1.5:	Réhabiliter des ouvrages pour l'amélioration de la mise en valeur de 1000 ha dans la région de Ziguinchor	Les vallées à réhabiliter ont été identifiées et le processus de recrutement d'un consultant est toujours en cours.	1000 ha de vallées réhabilités dans Ziguinchor	 Initialement la réhabilitation de 1000 ha était prévue. Toutefois le PPDC a identifié 2 800 ha dans neuf (9) vallées qui polarisent 28 villages. Le rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt ainsi que la Demande de Propositions pour les études APS, APD et DAO sont soumis à l'Avis de Non Objection de la Banque. La transmission de la Demande de Proposition aux Consultants est prévue au prochain trimestre.
A11.1.6:	Réhabiliter/aménager 1000 ha dans 9 vallées à Affiniam	 Le DAO de travaux initialement réalisé par le PDMAS, remis au PPDC qui l'a réactualisé et le soumet à l'Avis de Non Objection de IDA. La signature des marchés de travaux est en cours. La signature du marché de supervision des travaux est également prévue au prochain trimestre. 	1000 ha de vallées réhabilités dans le bassin d'Affiniam	 Neuf (9) vallées polarisant 24 villages sont concernés par ces travaux. 3 marchés de travaux sont signés. Démarrage des travaux prévu au premier trimestre 2016
A11.1.7:	Signer un contrat de maitrise d'ouvrage délégué avec l'AGETIP pour aménager et mettre en valeur de 5000 ha de Vallées à Sédhiou	Une Convention de maitrise d'ouvrage délégué a été signée entre le PPDC et l'AGETIP et validée par la Banque Mondiale au courant mars 2015	Un contrat de Maitrise d'ouvrage délégué est signé avec l'AGETIP pour aménager 5000 ha de vallées dans le Sédhiou.	AGETIP a lancé le Processus de recrutement d'un Cabinet pour les études de 2500 ha en vue de leur réhabilitation en 2016. La négociation du Contrat est en cours. Le recrutement d'un Cabinet pour les études des autres 2500 ha est lancé.

		Activités	Résultats/Niveaux d'exécution	Objectifs	Observations/Commentaires
A11	1.1.8:	Sélection de consultants pour les études APS et APD et l'élaboration de DAO pour réhabiliter aménager et mettre en valeur des vallées à Ziguinchor en différents lots	 Le processus de sélection qui est initialement prévu en juillet 2015 a effectivement démarré Durant le deuxième trimestre de l'année Le rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt est soumis à la DCMP pour avis préalable. 	Des consultants sont sélectionnés pour effectuer les études.	L'étude portera sur environ 12 500 ha en plus de : 6300 ha dont le recrutement de Consultant lancé par l'UCP du PPDC est très avancé; 5000 ha confiés à AGETIP (Sédhiou); 5000 ha confié à SODAGRI (Kolda); 1000 ha de travaux prévus dans Affiniam en 2016; 143 ha à Djémébring 655 ha de travaux en cours dans trois vallées à Sédhiou; 70 ha travaux en cours pour la vallée de Diégoune (Bignona); Le fait que trois structures (UCP-PPDC, AGETIP et SODAGRI) travaillent en parallèle va permettre d'aller plus vite dans la réalisation des activités. L'objectif étant de finaliser toutes les études sur 30 000 ha avant fin 2016 et réaliser les travaux en 2017-2018.
A11	1.2.1:	Mettre en valeur les vallées de Djiémbéring (140ha), Kabrousse (03), Diégoune (71ha), Djimande (30ha), Kagnobon (40ha) à Ziguinchor	 Le PPDC en collaboration, avec la coopérative Blouf Emano et le CRCR/Zig, a fourni des intrants pour appuyer la mise en valeur de ces vallées. L'objectif est atteint à 109% à la date du 30 juin par la mise en place des intrants pour la mise en valeur de 315 ha (25 tonnes de semences et 9 tonnes d'engrais) 	288 ha sont mis en valeur dans les vallées la région de Ziguinchor	Les cultures se portent bien et avec la bonne pluviométrique enregistrée, de bonnes récoltes sont en perspective. Le dispositif de collecte des données d'emblavures et de rendement est en déjà en branle pour renseigner de manière fiable l'indicateur
A11	1.2.2:	Mettre en valeur des vallées à Ziguinchor	L'objectif est atteint à 108% à la date du 30 juin par la mise en place des intrants pour la mise en valeur de 3780 ha	3500 ha sont mis en valeur dans la région de Ziguinchor	 Les engagements pris par les leaders lors de l'atelier de Sédhiou, ont permis de faire passer les emblavures à 7150 ha contre 3500ha initialement prévus, soit une augmentation de 204%.

	Activités	Résultats/Niveaux d'exécution	Objectifs	Observations/Commentaires
A11.2.3:	Mettre en valeur des vallées à Kolda hors SODAGRI	L'objectif est atteint à 230% avec la mise en place de 545 tonnes de semences certifiées pour la mise en valeur de 7000 ha	3000 ha sont mis en valeur dans la région de Kolda	Les engagements pris par les leaders lors de l'atelier de Sédhiou, ont permis de faire passer les emblavures à 10 304 ha contre 3000 ha initialement prévus, soit une réalisation de 87% par rapport aux engagements
A11.2.4:	Mettre en valeur des vallées à Sédhiou (y compris les 7 vallées)	L'objectif est atteint à 92% avec la mise en place des 273 Tonnes de semences certifiées pour la mise en valeur effective de 3210 ha	3500 ha sont mis en valeur dans la région de Sédhiou	Les engagements pris par les leaders lors de l'atelier de Sédhiou, avaient prévu de faire plus mais les retards notés dans la mise en place des intrants n'ont permis de réaliser cet objectif de départ à 45%
A11.2.5:	Mettre en valeur 3000 ha en rapport avec la (SODAGRI)	 154,5 tonnes de semences certifiées ont été mises en place avec 40T d'engrais NPK et 22T d'urée; L'objectif est atteint à 65% avec un niveau d'emblavure estimé à 1930 ha. 	3000 ha sont mis en valeur en rapport avec la (SODAGRI)	 Les 3000ha ont été équitablement répartis dans les trois départements de la région de Kolda. Le retard dans la mise en place des intrants s'explique par le non-respect de l'engagement du fournisseur en termes de délai.
A11.2.6:	Faire une étude sur package de technologies à appliquer dans les vallées rizicoles, sur les plateaux, le fonctionnement et les modalités (mécanisation)	Les termes de référence pour l'étude sur la mécanisation en Casamance ont été retouchés avec une option pour le recrutement de consultant individuel. L'évaluation des offres pour l'acquisition de matériels et équipements agricoles est faite et les contrats vont être signés durant le prochain trimestre.	Une étude sur package de technologies sur les vallées rizicoles, les plateaux, le fonctionnement et les modalités de mise en œuvre est réalisée / Etude disponible et modalités de fonctionnement et de mise en œuvre partagées	 Le lancement de la DMI a été infructueux du fait de la difficulté d'avoir une masse critique de cabinets spécialisés dans le machinisme agricole. La réception des matériels et équipements agricoles pourra se faire avec de la chance durant le prochain trimestre et en tout état de cause, à temps pour une utilisation à partir de la campagne 2016/2017.
A11.2.7:	Concevoir et installer un modèle pilote de transformation de riz (rizerie) et mise le marché (3 points de vente)		1 pilote installé et trois points de vente mis en service.	Cette activité sera effectuée au courant du dernier semestre 2015

Activités		Résultats/Niveaux d'exécution	Objectifs	Observations/Commentaires
A11.2.8:	Elaborer un cadre de partenariat avec la fédération des coopératives des producteurs des semences de Nérica de la Casamance	Un atelier a été tenu à Sédhiou avec les différents acteurs pour élaborer et valider le Cadre de partenariat et la stratégie de mise en œuvre.	Un protocole de partenariat est élaboré entre le PPDC et la fédération des coopératives des producteurs des semences de nérica de la Casamance / Renforcement institutionnel des coopératives Nérica	 Ces protocoles permettent de mieux responsabiliser les OP et renforcer leurs capacités. L'appui de FNDASP sera d'un atout certain pour une meilleure structuration et une organisation des acteurs de filière riz en Casamance
A11.2.9	Elaborer un programme d'appui et de partenariat avec des opérateurs et/ou structures d'appui dans les régions d'intervention	12 Protocoles ont été signés (soit un taux de réalisation de 240%) avec ANIDA, FNDASP, l'Entente de Diouloulou, Blouf- Emano, FEPROBA, REPROSENER, FRGPF/Zig, CRCR/Zig, CRCR/Kolda, les 3 DRDR.	Au moins 5 protocoles signés et mis en œuvre	Le niveau d'exécution des protocoles est faible du fait du retard noté dans la signature des conventions et par ricochet dans le processus de recrutement des points focaux au niveau des organisations
A11.2.10:	Acquisition de matériel de travail du sol	Les marchés sont attribués.	Un matériel de labour est acquis	 L'étude sur la mécanisation citée plus haut permettra de mieux appréhender la capacité de gestion des Coopératives et futurs bénéficiaires, préciser les puissances à acquérir dans les différents écosystèmes. Les retards notés dans la réception de l'ANO n'a pas permis de boucler à temps ce dossier.

		Activités	Résultats/Niveaux d'exécution	Objectifs	Observations/Commentaires
SC	OUS COMPOS	ANTE 1.2			
		Aménagement de périmètre	s horticoles		
	A12.1.2:	Réhabiliter/aménager des périmètres horticoles dans la région de Ziguinchor	 Les modèles d'investissement des fermes sont validés avec ANIDA et un plan de mise en 	9 ha sont mis en valeur	Une convention de maitrise d'ouvrage déléguée signée avec l'Agence Nationale d'Insertion et de Développement Agricole
	A12.1.3:	Réhabiliter/aménager des périmètres horticoles dans la région de Sédhiou	ceuvre sur 3 ans déjà élaboré. • La tenue des ateliers régionaux de partage et de validation des	9 ha sont mis en valeur	(ANIDA) pour la mise en place de 3000 ha fermes horticoles dans le pôle. Le PTBA est finalisé et sera mis en œuvre durant le
	A12.1.4:	Réhabiliter/aménager des périmètres horticoles dans la région de Kolda	critères de sélection des bénéficiaires de fermes pour les groupes de jeunes se tiendront durant le trimestre prochain ;	9 ha sont mis en valeur	dernier trimestre. Les modèles de fermes sont également définis. • Une DRP est lancée pour sélectionner des entreprises en vue de la rehabilitation de fermes
	A12.1.5:	Acquérir du petit matériel agricole de jardinage (brouette, pelle, pulvérisateur, décamètre, corde, etc)	L'évaluation des besoins en petits matériels et intrants est en cours pour les périmètres ciblés (synergie ProPaix, etc)	200 brouettes, 300 (pelles et piques), 30 pulvérisateurs, 150 machettes, etc	Les marchés seront préparés en vue de l'acquisition des petits matériels au cours du second semestre. Ceci permettra d'appuyer la mise en valeurs de périmètres existants dès la sortie de l'hivernage.
	A12.1.6:	Acquérir des intrants agricoles (semences, engrais, pesticides)			Acquisition prévue durant le second semestre pour mettre en valeur les périmètres existants
	A12.1.7 :	Signer un contrat de maitrise d'ouvrage délégué avec l'ANIDA pour aménager et mettre en valeur de 3000 ha de périmètres Horticoles	La Convention est signée.	Un contrat de Maitrise d'ouvrage délégué est signé avec l'ANIDA pour aménager et mettre en valeur 3000 ha de périmètres horticoles à l'échéance 2019	 Cette convention permettra de s'appuyer sur l'expérience de l'ANIDA dans la réalisation de périmètres horticoles et une meilleure répartition des investissements tenant des réalisations/programmes de l'ANIDA en Casamance.
		Production Ostréicole			
	A12.2.1:	Faire le diagnostic de l'appui institutionnel de la coopérative d'ostréiculture de la Région de Ziguinchor	Une convention est signée avec le FNDASP qui va effectuer le Diagnostic.	La coopérative est fonctionnelle et dynamique	 Le FNDAPS prendra en charge ce volet dans le cadre du protocole avec le PPDC. Les TDRs attendent l'ANO de la banque pour continuer l'activité
	A12.2.2:	Acquérir les équipements	Le marché d'acquisition est lancé et les offres sont évaluées.	Au moins 2 fermes appuyées	Les fermes à appuyer sont identifiées et les besoins en matériels ont été évalués.
	A12.2.3:	Renforcer les capacités des acteurs de la filière ostréicole	Un technicien en ostréiculture a été recruté	Nombre de formations de renforcement de capacités des acteurs de la filière ostréicole / Au moins 2 fermes appuyées	Il a en charge d'appuyer au plan technique, la FGPFZ et de server d'interface. Un plan de renforcement de capacité sera élaboré et mis en œuvre au sortir du diagnostic par le FNDASP qui démarre en décembre

		Activités	Résultats/Niveaux d'exécution	Objectifs	Observations/Commentaires		
	A12.2.4:	Elaborer les TDR et les DAO pour réaliser le dégorgeoir de Tobor	 Les analyses préalables d'eau ont été faites sur différents sites; Le choix du site est confirmé L'emplacement a été validé Les études sont en cours 	Le DAO pour la construction d'un dégorgeoir est fini, le dégorgeoir est réalisé.	 Les études sont réalisées DAO élaboré Le démarrage des travaux de construction du dégorgeoir est prévu en début 2016 		
	A12.2.5	Organiser une visite ou voyage d'étude à Sokone	La visite a été effectuée au niveau des îles du Saloum et à Dakar	Une Analyse benchmark réalisée	L'objectif global visé à travers cette visite de partage est de s'inspirer des expériences des producteurs des îles du Saloum et de la Petite côte en matière de maitrise des technologies améliorées de production d'huîtres, de gestion d'un dégorgeoir et de d'organisation des acteurs pout la commercialisation		
	A12.2.6:	d'appui et un cadre de partenariat avec des opérateurs et/ou structures d'appui dans la région de Ziguinchor	Un Protocole a été signé entre le PPDC et la FPGFZ.	Un cadre de partenariat a été établi.	Les services techniques de la pêche et de l'aquaculture sont impliqués dans l'accompagnement de la coopérative ostréicole pour la pérennité et durabilité des actions		
S	ous Composar		petites infrastructures post-récoltes		ge		
		De petites infrastructures post récoltes dont les centres de groupage sont mis en place					
	A13.1:	Faire une étude pour Identifier, caractériser et localiser les infrastructures post récoltes d'accompagnement pour les deux coopératives (riz et ostréiculture)	Les TDR sont en cours d'élaboration et l'étude va se dérouler dans le second semestre	Une étude d'identification, de caractérisation et de localisation des infrastructures post récoltes d'accompagnement pour les deux coopératives (riz et ostréiculture) est réalisée	Cette étude va permettre d'avoir une meilleure visibilité dans la distribution spatiale des infrastructures post récolte existant pour nous permettre au besoin de rééquilibrer dans le pôle selon les besoins (cohérence avec les bassins de production et la PEIB)		
	A13.2:	Organiser un atelier de validation de l'étude sur les infrastructures post récolte	L'atelier sera prévu durant le dernier trimestre de l'année 2015	Un atelier de validation sur l'implantation des infrastructures post récolte est tenu	Validation participative des types d'infrastructures proposées et leur emplacement par les responsables d'OP, les autorités locales et les services déconcentrés.		

		Activités	Résultats/Niveaux d'exécution	Objectifs	Observations/Commentaires
	A13.3:	Appuyer les OP dans la mise en place d'infrastructures post-récolte et d'équipement en matériels de qualité	 L'acquisition d'emballage de mangue est en cours L'acquisition de bascules est prévue au second semestre. L'acquisition des sacs d'emballage pour le riz marchand sera effectuée durant le second semestre. 	10 bascules, 50 000 sacs d'emballage pour riz et cartons de mangue	Un atelier pour le choix des sites d'emplacement sera tenu avec les OP et les différents acteurs.
	A13.4:	Acquérir des décortiqueuses et batteuses à riz	L'évaluation est déjà faite, la publication de l'avis d'attribution est en cours et les contrats seront signés durant le trimestre suivant	10 décortiqueuses et 10 batteuses	10 batteuses et 10 décortiqueuses seront mises à la disposition des OP
So	ous Composan	te14: l'amélioration de l'accès	aux marchés à travers le développe	ement de la Plateforme Econ	omique Intégrée de Bignona
	A14.1:	Signer un contrat de maitrise d'ouvrage délégué avec l'AGETIP pour le développement de la PEIB et d'autres infrastructures de marché	Un contrat de maitrise d'ouvrage délégué a été signé en mars 2015	Un contrat de maitrise d'ouvrage délégué avec l'AGETIP pour le développement de la PEIB et d'autres infrastructures de marché est signé	En plus de la PEIB, AGETIP assurera la MOD pour les réalisations d'autres infrastructures de marchés (mini- plateformes) et des centres de groupage.
	A14.1.1:	Finaliser les TDR de l'APD de la Deuxième Phase de la PEIB et Préparation de l'APD et lancer DAO	La Demande de Proposition (DP) a été lancé	Les TDR de l'APD de la Deuxième Phase de la PEIB et Préparation de l'APD et DAO sont finalisés	•
	A14.1.2:	Faire une étude de faisabilité technico-économique et environnementale et sociale détaillée et élaboration de DAO pour la PEIB	 Les offres des cabinets sont reçues et évaluées et la négociation se poursuit avant la signature du contrat avec le cabinet choisi. Les études vont démarrer durant 	Une étude de faisabilité technico-économique et environnementale et sociale détaillée et élaboration de DAO est élaborée pour la PEIB	La signature du marché est prévue au prochain trimestre ainsi que le démarrage des prestations.
	A14.1.3:	Faire une étude environnementale et sociale de la Phase2 de la plateforme de Bignona	le trimestre suivant	Une étude environnementale et sociale de la Phase2 de la plate-forme de Bignona est réalisée	

		Activités	Résultats/Niveaux d'exécution	Objectifs	Observations/Commentaires
	A14.4:	Recruter un cabinet pour la conception du schéma de gestion/exploitation de la PEIB	Le processus de recrutement de cabinet pour la conception du schéma de gestion/exploitation de la PEIB est en cours, l'évaluation des Propositions des cabinets est en cours.	Un cabinet est recruté pour la conception du schéma de gestion/exploitation de la PEIB	 Le processus de sélection a commencé depuis février 2015. L'évaluation des propositions des Consultants est en cours et le démarrage de l'étude est prévu au prochain trimestre. Les lenteurs du processus de passation de marché sont liées à la double validation (DCPM, IDA).
	A14.5	Etude pour le développement d'au moins huit plateformes économiques intégrées et de petites plateformes logistiques.	Des plans sont en étude		L'atelier de validation au niveau des 3 régions va servir de prétexte pour leur positionnement en cohérence avec les fermes horticoles en Casamance.
Com	posante2 : Acc	essibilité rurale			
So	ous Composant	te21: l'amélioration de l'acces	sibilité au niveau des communautés	rurales (CR) les plus pauvre	es
		l'accessibilité au niveau des	communautés rurales (CR) les plus	s pauvres est améliorée	
	A21.1.1	Préparer et signer la convention MOD Agéroute-PPDC	 la signature de la convention MOD Agéroute-PPDC, le 28/08/2014 	La convention MOD Agéroute-PPDC est signée	Un projet de 7,5 milliards a été confié à l'Ageroute.
So	ous Composant	te 22: la réhabilitation/entretie	n périodique de routes rurales		
		la réhabilitation/entretien de	routes rurales		
	A22.1.1	Actualiser les études pour la Réhabilitation de 25 km de pistes	• Les résultats sont atteints à 100%	Les études pour la Réhabilitation de 25 km de pistes sont actualisées	Études finalisées et travaux en cours.
	A22.1.2:	Réhabiliter 25 km de pistes (Balingore-Diégoune, Affignam-Diatoc)	Les taux de réalisation sont de 95% pour le tronçon Diégoune- Balinghor et de 40% pour le tronçon Affiniam-Elana	25 km de pistes (Balingore- Diégoune, Affignam-Diatoc) sont réhabilités	L'intitulé initial des axes concernés par l'actualisation des études est Diégoune – Balinghor et Affiniam – Diatock. Cependant, la section Elana – Diatock fait partie de la deuxième phase de la Boucle du Blouf dont les travaux de bitumage sont en cours, Ainsi, le tronçon Affiniam – Diatock devient Affiniam – Elana avec un linéaire de 11.412 km. Finalisation et réception des travaux prévues au cours du semestre prochain

	Activités	Résultats/Niveaux d'exécution	Objectifs	Observations/Commentaires
A22.1.3:	Réaliser les études pour la réhabilitation de 175 km	Le cabinet est recruté et l'objectif à la date du 30juin est atteint	Les études pour la réhabilitation de 175 km sont réalisées	 Les prestations des études techniques d'exécution, socio-économiques, environnementales et élaboration d'un DAO pour la construction et/ou réhabilitation de 180 km de pistes rurales dans les régions de Ziguinchor (dont la « Boucle du Fogny ») et Kolda. Ont été attribué à INGENIEURS CONSULTANTS ASSOCIES (ICA) pour une durée d'exécution de 06 mois. Le DAO pour la sélection d'une entreprise de travaux pour la réhabilitation de l'axe Kolda-Pata est relancé en novembre 2015. Les études et DAO des autres tronçons sont réalisés
A22.1.5:	Faire l'étude pour la réalisation de points critiques sur 350 km de pistes	 la procédure de sélection d'un consultant est encours L'objectif est attaint à la date du 30/06/2015 	réalisation de points critiques sur 350 km de pistes rurales est réalisée	 Le Contrat est signé en novembre 2015. Les études pour la tranche ferme vont durer 4 mois pour la tranche ferme.
A22.1.4:	Identifier/valider les tronçons à traiter	• Cf. PAD	Les tronçons à traiter sont identifiés/validés	Des ateliers d'harmonisation des interventions des différents acteurs sont organisés au niveau des 3 régions
A22.1.5:	Supervision des travaux de construction et ou de réhabilitation de 25 Km de pistes de désenclavement dans le département de Bignona (région de Ziguinchor)	Les prestations de supervision ont démarré. Le marché est attribué à un consultant.		Un Consultant individuel a été recruté pour effectuer la supervision des travaux. Il travaille avec l'appui d'autres experts sous sa responsabilité afin d'assurer une supervision convenable des travaux.
A22.1.6:	Supervision des travaux de traitement d'urgence des points critiques de 227 Km de pistes rurales dans la région de Sédhiou	Le processus de recrutement de consultant est en cours		Prévues en 2016
A22.1.7:	Supervision des travaux de traitement d'urgence des points critiques de 100 Km de pistes rurales dans la région de Kolda	Le processus de recrutement de consultant est en cours		Prévues en 2016

		Activités	Résultats/Niveaux d'exécution	Objectifs	Observations/Commentaires
	A22.1.8:	Traitement d'urgence de points critiques de 23 Km de pistes rurales dans la région de Sédhiou	Les travaux ont démarré, le marché est attribué à GEOTOP INGENIERIE. Le taux d'exécution global des travaux est de 40%.		 Trois axes ont été identifiés pour un traitement en urgence des points critiques. C'est le cas du tronçon Affia-Carrefour Ndiaye qui traverse une vallée. Les travaux seront finalisés au prochain trimestre.
	A22.1.8:	Supervision des travaux de traitement d'urgence des points critiques de 23 Km de pistes rurales dans la région de Sédhiou	 Les prestations de supervision ont démarré. Le marché est déjà attribué. 		 Les prestations supervision sont en cours et le Consultant a déposé son premier rapport mensuel de suivi ainsi que le rapport de suivi environnemental et social.
		la mise en œuvre d'un proje	t pilote d'entretien de pistes rurales	par la méthode à haute inte	nsité de main-d'œuvre
	A22.2.1:	pilote d'entretien de pistes rurales par la méthode à haute intensité de main- d'œuvre (HIMO)	Les tronçons de projets pilote sont identifiés.		Les premiers tronçons tests seront réhabilités en 2016
	A22.2.2:	Renforcer les capacités des CL dans l'entretien des pistes rurales	En prélude, des ateliers de sensibilisation sont réalisés dans chaque région	renforcement de capacités réalisées dans le domaine	 Les ateliers ont permis de réunir les Maires des CL visées, les ARD, les Directions Régionales des Routes, etc. Les tronçons pilotes et le programme de formation sont validés.
	•	e en œuvre du projet et renfoi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Sc	ous Composant	e31: le renforcement des cap	acités des acteurs clés du processu	s de paix	
					•
Sc	ous Composant	e32: La conduite de trois étud	des stratégiques		
					•
Sc	ous Composant		suivi et à l'évaluation du projet		
		L'équipe de projet est mis e	n place		
	A33.1.1 :	Recruter le personnel du projet	• Effectué à 100%	Le personnel du Projet est recruté	I'Unité de Coordination du Projet est composée d'un Coordonnateur de Projet, de quatre Spécialistes (Suivi-Évaluation, Chaine de Valeurs, Génie Rural, Passation de Marchés), d'un Responsable Administratif et Financier, d'un Comptable, d'un Assistant Suivi Évaluation, d'un Assistant Secteur Privé et d'un personnel d'appui (secrétaires, chauffeurs)

	Activités	Résultats/Niveaux d'exécution	Objectifs	Observations/Commentaires
A33.1.1.1	Prise en charge médicale du personnel	 le marché est attribué et est en cours d'exécution 	Prise en charge médicale effective	•
A33.1.2:	Recruter un consultant/AT pour l'accompagnement de la mise en œuvre des activités ostréicoles		Un consultant/AT est recruté pour accompagner la mise en œuvre des activités ostréicoles	Ces consultants auront un temps de présence de 7 à 10 jours/mois pour une période de 12 mois.
A33.1.3:	Recruter un consultant/AT pour l'accompagnement de la mise en œuvre de la PEIB		Un consultant/AT est recruté pour l'accompagnement de la mise en œuvre de la PEIB	recruté à temps partiel pour accompagner l'UCP
A33.1.4:	Recruter un consultant/AT, Spécialiste des filières agricoles	• Effectués à 100%	Un consultant/AT spécialiste des filières agricoles est recruté	recruté à temps partiel pour accompagner l'UCP
A33.1.5:	Recruter un consultant/AT, spécialiste en suivi- évaluation et systèmes d'informations		Un consultant/AT, spécialiste en suivi- évaluation et systèmes d'informations	recruté à temps partiel pour accompagner l'UCP
A33.1.6:	Recruter un consultant pour l'audit externe du projet		Un consultant pour l'audit du projet est recruté	recruté à temps partiel pour accompagner l'UCP
A33.1.7	Contractualiser avec une société de sécuritégardiennage	• Effectuées à 100%	Le personnel d'appui du Projet est sélectionné	•
A33.1.8	Contractualiser avec une société d'entretien-nettoyage		Le personnel d'appui du Projet est sélectionné	
		l'exécution administratif comptable		
A33.2.1:	Réviser le manuel d'exécutions technique	Programmée	Le manuel d'exécution technique est révisé	Cette activité sera programmée dans le dernier trimestre de cette année
	Le suivi-évaluation du progr	amme est effectué		
A33.3.1 :	Etablir la situation de référence du projet	 Le processus est en cours en partenariat avec l'université Assane Seck de Ziguinchor 	La situation de référence du projet est réalisée	Ce travail est un prétexte pour intéresser l'UASZ à s'impliquer dans la recherche sur des problématiques des études d'impacts

	Activités	Résultats/Niveaux d'exécution	Objectifs	Observations/Commentaires
A33.3.2:	Elaborer le manuel de Suivi- Evaluation du projet	Le manuel de suivi évaluation du PPDC a été élaboré par l'UCP	un manuel de Suivi- Evaluation est élaboré	• .
A33.3.3:	Atelier de partage et de validation du manuel de suivi-évaluation	Cet atelier a eu lieu les 26, 27 et 28 février 2015	un atelier de partage et de validation du manuel de Suivi-Évaluation est organise	le document a été validé par l'ensemble des parties prenantes
A33.3.4:	Mettre en place une étude de base cartographique (SIG) et le Système Informatisé du Suivi Evaluation	 Pour le SIG, le PPDC a signé un protocole de partenariat avec le Centre de Suivi Ecologique (CSE). L'étude a démarré. Une demande d'ANO est envoyée à la Banque pour la mise en place d'un Système Informatisé du Suivi Evaluation 		• Le CSE a élaboré une proposition technique et financière qui a permis d'élaboré le protocole PPDC-CSE. Les activités ont démarré. Le rapport provisoire sera validé en mi-décembre 2015
A33.3.5:	Mettre en place une bibliothèque numérique	◆Les TDR sont en cours d'élaboration	Une bibliothèque numérique est mise en place	 Cela permettra d'archiver des études réalisées dans le Pôle depuis fort longtemps et mal archives dans des services publics.
A33.3.6:	Mettre en œuvre un plan de communication du projet	Avec le soutien de l'AT en communication, l'UCP déroule un certain nombre d'action en communication	Le plan de communication du projet est réalisé et mis en œuvre	Ateliers, CRD, CDD, CLD, campagne de sensibilisation, couvertures et émissions radio/TV: • 06 CRD (UCP et Agéroute), 04 CDD et 02 CLD • 69 Sensibilisations • 23 couvertures par les radios • 04 reportages et une émission télévisés
A33.3.61:	Réaliser le site web du Projet	Le site web du PPDC est en ligne depuis début juin 2015	le site web du Projet est fonctionnel couplé à un compte twitter et un compte Facebook	• www.ppdc.sn
A33.3.62:	Elaborer, confectionner et éditer les supports de communication	• un premier lot est encours d'édition	communication élaborés, confectionnés et édités	• cartes de visites, chemises cartonnées, etc.
A33.3.7:	partage du PTBA	• effectué à 100%	Un atelier de partage du PTBA est tenu	
A33.3.8:	Elaborer les rapports du projet	 Effectué à 100% selon la période 	Les différents rapports du projet sont élaborés	•

Activités		Résultats/Niveaux d'exécution	Objectifs	Observations/Commentaires			
A33.3.9:	pilotage	 Un troisième comité de pilotage est en train d'être préparé 	pilotage tenus	•			
A33.3.10.	de Suivi Environnemental et Social du projet	 Le plan de suivi est élaboré en collaboration avec les DREEC Des plans d'actions sont conçus pour chaque région. 	Le plan de Suivi Environnemental et Social du projet est exécuté	 Le suivi environnemental et social est effectué à travers les comités régionaux existants; Les documents sont soumis à l'ANO de l'IDA. 			
	Acquisition de matériel roulant						
A33.4.1:	Acquérir des véhicules pour la Coordination	véhicules a été acquis un deuxième le sera bientôt	5 véhicules pour la Coordination sont acquis	02 sur le compte de la BM et 02 sur le BCI			
	Acquisition de Matériel informatique						
A33.5.1:	informatique pour l'UCP	 Le matériel informatique a été réceptionné en février 2015 	Nombre de matériel informatique acquis par catégorie				
A33.5.2:	Acquérir et Mettre en place d'un système comptable informatisé d'un logiciel de gestion administrative comptable du projet	 Le logiciel TOMPRO a été acquis et paramétré pour les besoins de de gestion administrative comptable du projet 	Un logiciel de gestion administrative/ comptable est opérationnel	•			
A33.5.3:	Acquérir un logiciel pour le système de suivi évaluation du projet	Non effectuée	Un logiciel pour le système informatisé de suivi évaluation du projet est opérationnel	 La demande d'ANO est envoyée à la banque depuis le premier trimestre de l'année 			
	Acquisition de Matériel de b	ureau et Location et installations					
A33.6.1:	Acquérir du mobilier & équipement de bureau pour l'UCP	Des lots complets d'équipements et mobiliers de bureau ont été réceptionnés en février 2015	Le bureau de l'UCP est équipé en matériel bureautique				
A33.6.2:	Acquérir et installer un groupe électrogène		un groupe électrogène est acquis et installe	•			
A33.6.3:	Louer les bureaux de l'UCP	Le PPDC est installé dans ses nouveaux locaux depuis le mois de février 2015	Un contrat de location a été signé	Cette installation est provisoire en attendant que l'état nous cède un terrain pour construire le siège. Les crédits sont disponibles au BCI			
A33.6.4:	Acheter des fournitures de bureau pour l'UCP	Un premier lot de fournitures a été acquis	Les fournitures de bureaux sont achetées	Suite à un défaut des livraisons le marché a été cassé et est encours de reprise			
A33.6.5:	Installer le réseau informatique interne et les accessoires	Le réseau informatique et téléphonique est installé et fonctionnel depuis mai 2015	Le réseau informatique est installe	•			

Activités		Résultats/Niveaux d'exécution	Objectifs	Observations/Commentaires		
A33.6.6:	Réhabiliter/Aménager, et équiper les locaux	réhabilitation/Aménagement n'a été effectué au cours de ce semestre	Les locaux du PPDC sont aménagés	Les locaux n'ont pas eu besoin de travaux en dehors de l'installation électriques & informatiques		
	Assurer le fonctionnement d	e l'UCP				
A33.7.1:	Assurer la location des bureaux UCP	Ces activités sont régulièrement tenues par la cellule Administrative et Financière		•		
A33.7.2:	Payer les factures d'Eau			•		
A33.7.3	Payer les factures d'Electricité			•		
A33.7.4 :	Payer les factures de Téléphone			•		
A33.7.5:	Organiser des Missions Internes et Externes (UCP et STD)			•		
A33.7.6:	Acheter du Carburant			•		
A33.7.7:	Acheter du Produit entretien			•		
A33.7.8:	Prendre en charge les Frais bancaires			•		
A33.7.9	Acheter des Revues et documentations			Le projet de la bibliothèque numérique est en cours d'élaboration		
A33.7.10	Assurer la prise en charge des Missions d'appui à la mise en œuvre du projet	Ces activités sont régulièrement tenues par la cellule Administrative et Financière		•		
A33.7. 11:	Entretien réparation biens mobiliers			•		
A33.7.12:	Prévoir les Autres charges opérationnelles (CRD, CDD)			•		
Sous Composante34: La construction et l'équipement de (s) siège (s) dans le cadre l'Acte3						

5.4. PERSPECTIVES PLAN DE TRAVAIL ANNUEL BUDGÉTISÉ (PTBA) 2016

Explications	Activités	Budget 2016	Responsable	Principaux Acteurs				
OBJECTIF GENERAL DU PROJET Contribuer à la réduction de la vulnérabilité des jeunes leurs opportunités d'activités génératrices de revenus de du conflit.		6 784 519 900						
Composante1. Appui à la production agricole, à la pochaînes de valeur ciblées	2 902 874 400							
Sous Composante11: Réhabilitation/aménagement d	1 144 174 400							
R11.1 : Réhabilitation et aménagement de vallées en	972 500 000							
ORIENTATIONS D'INTERVENTION L'objectif du projet est de réhabiliter/aménager 30 000								
importante de ressources tant humaines que financières l'AGETIP et la SODAGRI pour l'aider à aménager les l'AGETIP, tandis que l'UCP conduit la réalisation du restravaux afin de mettre en travaux autant que possible les	vallées au rythme moyen annuel de 10000 ha. A ste. Les études ont été planifiées au fur et à mesure s plus facilement réalisables.	insi 5000 ha ont é	té confiés à la SOD	AGRI, 5000 ha à				
11.1 Réhabilitation et aménagement de vallées /UCP	-PPDC							
	ojets à réaliser par l'UCP							
Les travaux d'aménagement de vallées à Diembéring sont	Réhabilitation de la vallée de Djembéring Finaliser les travaux	30 600 000 28 800 000		PPDC OP				
prévus en entreprise pour les ouvrages et en HIMO pour le	Supervision des travaux	1 800 000	Illiastiuctules	DRDR				
chargement de la digue. GEOTOP a été sélectionné pour ce	Supervision des travaux	7 000 000		Collectivités				
travail. Le Préfet d'Oussouye ainsi que le Maire ont été				Bénéficiaires				
notifiés du démarrage des travaux après l'hivernage. Il a été				Entreprises				
retenu de choisir avec eux les populations à impliquer.				Bureau Contrôle				
A Sédhiou les travaux d'aménagement dans les vallées de Diama, Talto et Bakoum ont démarré en 2015. La réception	Réhabilitation vallées de Bakoum – Ndiama – Talto	32 800 000	Responsable des Infrastructures	PPDC OP				
des ouvrages et des aménagements est attendue à fin du	Finaliser les travaux	32 000 000		DRDR				
premier trimestre 2016.	Supervision des travaux	800 000		Collectivités Bénéficiaires				
L'aménagement des vallées d'Affiniam a été pris en compte	Réhabiliter/aménager 1000 ha dans 9 vallées à	400 000 000	Responsable des	PPDC ; OP				
lors du réaménagement du PTBA en avril 2015. Trois (3)	Affiniam		Infrastructures	DRDR ; Cellule				
entreprises ont été contractées en novembre 2015. Le bureau	Réalisation des travaux du LOT 1	100 000 000		barrage Affiniam				
de contrôle est en cours de sélection. Les travaux vont	Réalisation des travaux du LOT 2	150 000 000		Collectivités				
de controle est en couls de selection. Les travaux vont	Réalisation des travaux du LOT 3	100 000 000		Bénéficiaires				

Explications	Activités	Budget 2016	Responsable	Principaux Acteurs
démarrer après la récolte des parcelles situées au niveau du tracé.	Supervision des travaux	50 000 000		Entreprises Bureau Contrôle
ETUDES DE REHABILITATION DE VALLEES				
A Kolda, la vallée de Sofaniama (600 ha) a été identifiée en 2015 par les acteurs régionaux de Kolda	Etude de réhabilitation de la vallée de Sofaniama	51 500 000	Responsable des Infrastructures	PPDC OP
dans le cadre des travaux des conférences régionales d'harmonisation de la région. Le recrutement du Bureau est en cours pour la réalisation des études APS, APD et élaboration de DAO pour réhabiliter / aménager. Cependant le retard observé dans l'obtention des avis de non objection de l'IDA, a rendu difficile le processus de recrutement et a retardé les études.	Réaliser les études de réhabilitation de la vallée de Sofaniama (MYF) à Kolda	50 000 000		DRDR Collectivités Bureau d'études
La sélection d'une entreprise de travaux sera entamée dès la fin des études.				
Ces études feront l'objet d'une validation en atelier avec les exploitants, les élus, les services d'accompagnement ainsi que les administrations.	Organiser atelier de restitution des études	1 500 000		
Dans la région de Sédhiou des visites d'identification de vallées à réhabiliter / aménager ont été effectuées	Etudes de réhabilitation de vallées dans la région de Sédhiou	52 000 000	Responsable des Infrastructures	PPDC OP
en rapport avec la DRDR de Sédhiou. Ainsi 7 vallées d'une superficie globale de 2800 ha sont identifiées. Leurs études APS, APD et élaboration de DAO sont programmées en 2016.	Réaliser les études de réhabilitation de vallées dans la région de Sédhiou	50 000 000	imiastructures	DRDR Collectivités Bureau d'études
Ces études feront l'objet d'une validation en atelier avec les exploitants, les élus, les services d'accompagnement ainsi que les administrations locales.	Organiser un atelier de restitution des études	2 000 000		
Dans la région de Ziguinchor, il est prévu d'étudier au moins 2900 h a de vallées. Les APS, APD ainsi que le	Etudes de réhabilitation de vallées dans la région de Ziguinchor	52 000 000	Responsable des Infrastructures	PPDC OP
DAO permettront de recruter les entreprises pour réhabiliter / aménager. Ces études comme les	Réaliser les études de réhabilitation de vallées dans la région de Ziguinchor	50 000 000		DRDR Collectivités
précédentes seront restituées pour une meilleure implication des acteurs concernés.	Organiser atelier de restitution des études	2 000 000		Bénéficiaires Bureau d'études

Explications	Activités	Budget 2016	Responsable	Principaux Acteurs
Une étude APS, APD et élaboration de DAO pour réhabiliter / aménager au moins 12500 ha dans la région de Ziguinchor. Celles-ci viennent compléter les	Etudes APS et APD et l'élaboration de DAO pour réhabiliter aménager et mettre en valeur des vallées à Ziguinchor en différents lots	53 000 000	Responsable des Infrastructures	PPDC OP DRDR
études précitées et de disposer ainsi des 30 000 ha de vallées visées.	Réaliser les études de réhabilitation de 12500 ha de vallées dans la région de Ziguinchor	50 000 000		Collectivités Bénéficiaires
Un atelier de restitution technique sera organisé à l'échelle régionale au cours de l'étude.	Organiser atelier de restitution des études	3 000 000		Bureau d'études
A la demande des Maires de Boutoupa Caramacounda et de Niaguisse, une mission du PPDC en présence du	Aménagement de la vallée de Mpack	51 500 000	Responsable des Infrastructures	PPDC OP
sous-préfet de Nyassia a étudié avec les acteurs qui l'exploitent la faisabilité d'un accompagnement. La dynamique observée autour de la vallée ainsi que	Réaliser les études vallée Mpack	10 000 000		DRDR Collectivités Bénéficiaires
l'absence d'infrastructures ont motivé le recrutement d'un consultant individuel qui sera chargé de réaliser	Supervision travaux vallée Mpack	1 500 000		Chargé des études
rapidement les études au premier trimestre 2016. Les digues paysannes seront ainsi consolidées et les ouvrages de gestion d'eau seront construits. Le démarrage des travaux est prévu au second trimestre. Maîtrise d'Ouvrage Déléguée à l'AGETIP	Réalisation de travaux vallée Mpack	39 000 000		otadoo
Un projet de réhabilitation/aménagement de 5000 ha de vallées dans la région de Sédhiou a été confié à l'AGETIP. Cette dernière s'est accordée avec le PPDC pour le conduire en 2 phases de 2500 ha chacune.	Réhabilitation et aménagement de vallées dans la région de Sédhiou/MOD-AGETIP	127 100 000	AGETIP	PPDC OP DRDR Collectivités
Ainsi concernant la phase 1, les négociations avec le cabinet sont en cours. Les études d'une durée de 5 mois devraient démarrer dès janvier 2016.	Réhabilitation/Aménagement de 2 500 ha de vallée au moins pour la riziculture pluviale dans la région de Sédhiou (phase 1)	93 550 000		Bénéficiaires Bureau d'études et contrôle
demarter des janvier 2010.	Réalisation des études	30 500 000		Entreprises
	Réalisation de travaux	60 000 000		
	Supervision des travaux	3 050 000		
Tandis que pour la phase 2, le recrutement du Cabinet a été initié. Le démarrage des études de cette phase est prévu durant le second trimestre 2016. Ce qui permettrait	Aménagement de 2 500 ha de vallée au moins pour la riziculture pluviale dans la région de Sédhiou (phase 2)	33 550 000		
d'entamer les travaux au dernier trimestre 2016.	Réalisation des études	30 500 000		
a chambi les havada da definei tilliestic 2010.	Sélection des Entreprises de travaux			
	Réalisation de travaux			
	Supervision des travaux	3 050 000		
Maîtrise d'Ouvrage Déléguée à la SODAGRI				
Pour la Région de Kolda, le MOD avec la SODAGRI va permettre de réaliser une étude de 5 000 ha de vallées	Réhabilitation et aménagement de vallées dans la région de Kolda/MOD-SODAGRI	123 000 000	SODAGRI	PPDC OP

Explications	Activités	Budget 2016	Responsable	Principaux
rizicoles à travers la Région.	Mise en œuvre protocole SODAGRI	48 000 000		Acteurs DRDR
La SODAGRI procédera à l'identification des vallées à	Wisc off wavie protocole GOBAGIN	40 000 000		Collectivités
réhabiliter. Elle a entamé le recrutement d'un bureau pour	Réaliser les études de 5000 ha de vallées à Kolda	75 000 000	-	Bénéficiaires
l'étude d'emblée des 5000 ha. Il est attendu de la SODAGRI	Treamed les clades de 6000 ha de vallees à riolda	70 000 000		Bureau d'études
la validation des études APS, APD et le lancement du DAO.				
R11.2 : Réhabilitation/Aménagement de périmètres l	norticoles (MOD ANIDA)	171 674 400		
ORIENTATIONS D'INTERVENTION	,			•
Une convention est signée avec ANIDA pour la réalisation	on et l'appui à l'exploitation de 300 périmètres hortico	les de 10 ha au pro	ofit des jeunes et des	femmes à travers
la Casamance. Des visites d'identifications ont été effe	ctuées en 2015 et un programme de réhabilitation/a	ménagement de p	érimètres horticoles	est élaboré sur la
base du budget disponible à cet effet.				
ANIDA mobilisera des ressources humaines qui	Budget ANIDA pour aménager et mettre en valeur	8 000 000	ANIDA	UCP
appuieront le PPDC dans la mise en œuvre du volet	des périmètres Horticoles			
horticole du projet.	·			
Des ateliers au niveau des trois régions sont programmés en	Mission d'identification et validation des sites	1 000 000	ANIDA	UCP
2015 dans le cadre de l'identification des périmètres. Des	Réhabilitation de fermes existants et	94 000 000	Responsable des	Collectivités
comités départementaux et régionaux de pré sélection des	construction de nouvelles fermes en		Infrastructures	Bénéficiaires
bénéficiaires des fermes horticoles de 10 ha pour les groupes	Casamance.		Responsable	
de jeunes et de femmes seront installés dans ce sens en			Chaines de	
rapport avec les services techniques, les CL et Autorités.			valeur	
Cependant, la position des périmètres se fera en				
cohérence avec l'implantation des petites plateformes				
de groupage des produits et des petits périmètres				
horticoles existants et/ou à réaliser par le PAPEJF, le				
PRODAC, etc.				
Avec l'appui des experts de l'ANIDA des études seront	Révision études ANIDA-UCP/PPDC Modèle	12 000 000		
menées sur la base des modèles de fermes proposés	ANIDA et élaboration du DAO	12 000 000		
par ANIDA. Ainsi un DAO de travaux sera élaboré et	Mobilisation et démarrage des travaux	40 000 000		
lancé pour sélectionner les entreprises de travaux.				
Un Consultant, Bureau d'études, sera sélection pour	Réalisation des études techniques,			
assurer la supervision des travaux de réhabilitation et	environnementales et sociales suivant	42 000 000		
aménagement de périmètres horticoles.	modèles ANIDA et élaboration du DAO			
Pour 2016, des périmètres sont identifiés pour des	Consolidation des périmètres horticoles	68 674 400	ANIDA	PPDC
travaux de réhabilitation et d'amélioration des équipements	existants en Casamance		Responsable des	Collectivités
d'irrigation de 10 périmètres de GIE de femmes et de jeunes			Infrastructures	Bénéficiaires
En 2016 le PPDC compte démarrer l'aménagement de	Travaux aménagement/réhabilitation de	65 674 400	Responsable	Bureau d'études
deux nouvelles fermes et la réhabilitation d'une ferme	fermes		Chaines de	Bureau Contrôle
villageoise de superficie d'au moins 10 ha chacun.	Mobilisation et démarrage	9 851 160	valeur	
Le PPDC va également consolider au moins 10	Réalisation des travaux	55 823 240		
périmètres maraîchers exploités par des groupements	Supervision travaux de Consolidation	3 000 000		
de femmes et de jeunes.	Mobilisation et démarrage	0		

Explications	Activités	Budget 2016	Responsable	Principaux
				Acteurs
	Surveillance et contrôle des travaux	3 000 000		
Sous Composante12: Mise à disposition de moyens de production en appui à la production et la productivité du riz, de l'horticulture et de l'ostréiculture dont l'achat d'intrants, de matériel agricole et le renforcement des capacités		1 263 900 000		
R12.1 : MISE A DISPOSITION D'INTRANTS EN APPUI A LA PRODUCTION ET A LA PRODUCTIVITE DU RIZ		1 190 900 000		
ODIENTATIONS D'INTERVENTION				

En 2016 le projet cible 45 000 ha de vallées rizicoles à mettre en valeur dans le Pôle Casamance. A cet effet, il est prévu l'acquisition et la mise en place de 500 t de semences pour compléter les besoins qui ne sont pas pris en compte par les programmes de multiplication des coopératives partenaires et 1 500 t d'engrais (NPK et urée). Le montant global budgétisé pour la mise en valeur de rizière en 2016 est de 1 276 096 000 F CFA.

Le projet cible 12 000 ha de vallées rizicoles à mettre	Mettre en valeur des vallées à Ziguinchor	148 900 000	Responsable	UCP
en valeur dans la région de Ziguinchor.	Acquisition de semences	40 000 000	i	OP
A cet effet, il est prévu l'acquisition et la mise en place	Acquisition d'engrais	10 000 000	valeur	DRDR
de semences et d'engrais dans la région de	7 toquiotilon a originalo	108 900 000		FNDASP
Ziguinchor.		100 000 000		Collectivités
Dans la région de Kolda, le projet cible 18 000 ha de	Mettre en valeur des vallées à Kolda	231 500 000		Bénéficiaires
vallées rizicoles à mettre en valeur pour 2016.	Acquisition de semences	50 000 000		
A cet effet, il est prévu l'acquisition et la mise en place	Acquisition d'engrais	404 500 000		
de semences et d'engrais dans la région de Kolda.	January Grand	181 500 000		
Pour la région de Sédhiou, 15 000 ha de vallées	Mettre en valeur des vallées à Sédhiou	195 200 000		
rizicoles sont ciblés pour la mise en valeur en 2016.	Acquisition de semences	50 000 000		
A cet effet, il est prévu l'acquisition et la mise en place	Acquisition d'engrais	145 200 000		
de semences et d'engrais dans la région de Sédhiou.				
Le PPDC prévoit de mettre en valeur les vallées	Mettre en valeur les vallées réhabilitées par le			
réhabilitées en 2015 et 2016. Autour de ces vallées	PPDC, Djembéring (140ha), Diégoune (71ha),	44 300 000		
seront délivrés des services d'appui en organisation et	Talto (150ha), Ndiama (303ha), Bakoum (202 ha)	44 300 000		
en mobilisation sociale pour une exploitation pérenne	et Affiniam (1000 ha)			
et une gestion rationnelle des ouvrages réhabilités.	Acquisition de semences	8 000 000		
	Acquisition d'engrais	36 300 000		

Explications	Activités	Budget 2016	Responsable	Principaux Acteurs
R12.2 : MISE A DISPOSITION DE MOYENS EN APPUI A LA PRODUCTION ET A LA PRODUCTIVITE				71000.0
DU RIZ		556 000 000		

Les coopératives des producteurs de semences de Casamance seront encore des partenaires privilégiés du PPDC en 2016.

Un plan d'action détaillé fixant les objectifs, les activités, les coûts, les partenaires sera défini pour chaque protocole spécifique.

FNDASP va renforcer les coopératives aux plans organisationnel, technique et managérial.

Le système de suivi – évaluation va apprécier l'exécution de chaque plan d'action et évaluer l'efficacité de la mise en œuvre du protocole liant le PPDC à l'organisation.

L'ISRA, les DRDR ainsi que des structures publiques ou privées compétentes seront impliquer à bâtir un système local de production et de distribution de semences certifiées impliquant les exploitations familiales du Pôle Casamance. Ainsi, les producteurs Casamançais de semences certifiées pourront exporter en Gambie, en Guinée Bissau et au Mali.

Cullice bissau et au Maii.				
Afin de cerner l'approche en matière d'amélioration de la productivité des acteurs, des systèmes d'exploitation et de productions de riz, le Projet compte réaliser des études spécifiques en 2016.	Faire une étude sur package de technologies à appliquer dans les vallées rizicoles, sur les plateaux, le fonctionnement et les modalités (mécanisation)	15 000 000	Responsable Chaines de valeur	UCP OP DRDR FNDASP
Un modèle pilote de distribution de riz de qualité sera mis en place pour promouvoir la riziculture en Casamance.	Concevoir et mettre en œuvre un modèle de pilote sur la distribution de riz de qualité de la Casamance	0		ISRA Bénéficiaires Autres
Un partenariat est établi avec les OP pour mettre au point un package technique et technologique à adopter pour le riz aussi bien dans les vallées que les zones de plateaux en conformité avec les réalités socioéconomiques du terroir.	Mettre en œuvre le cadre de partenariat avec les OP pour un développement inclusif de la chaine de valeur riz	70 000 000		
A la demande des coopératives, le PPDC prévoit de mettre à leur disposition des motos et vélos pour renforcer leurs capacités	Acquisition de motos et vélos	16 000 000		
Il s'agit de matériel destiné à renforcer les capacités du dispositif interne des OP dans le suivi-évaluation des activités sur le terrain.	Matériel et équipement (GPS, Smartphones, ordinateurs matériel audiovisuel) pour le système de suivi évaluation du projet	11 500 000		
Il s'agit de doter les organisations de producteurs de moyens de capitalisation et d'archivage pour créer et consolider le mémoire collectif des OP.	Système de documentation et d'archivage pour les OP (Armoire de rangement, Classeur, Table ministre, fauteuil, Chaises visiteurs)	3 000 000		
Le diagnostic et l'appui institutionnel des coopératives des femmes ostréicultrices et celles des producteurs de semences de riz	Programme d'appui et de partenariat avec des opérateurs et/ou structures d'appui dans les régions d'intervention	95 000 000		
Le matériel sera disponible au premier semestre 2016. Ce matériel sera mis à la disposition des OP.	Acquisition de matériel de travail du sol (tracteurs et motoculteurs)	360 500 000		

Explications	Activités	Budget 2016	Responsable	Principaux Acteurs
R12.3 : APPUI A LA MISE EN VALEUR DE PERIMETI	RES HORTICOLES	17 000 000		
ORIENTATIONS D'INTERVENTION.				
L'ANIDA et l'UCP/PPDC ont organisé des missions de terra		rticoles (petits blocs	maraichers et les ferme	es de 10 ha pour les
groupes de jeunes). Une planification d'exécution de ce volet	horticole est faite pour les trois années à venir.			
Des intrants et de petits matériels de maraîchage	Acquisition du petit matériel agricole de jardinage	5 000 000		UCP
seront fournis cette année, 2016, à des groupements	(brouette, pelle, pulvérisateur, décamètre, corde,		Chaines de	Bénéficiaires
de jeunes et de femmes pour appuyer la mise en	etc)		valeur	
valeur des périmètres horticoles.	Acquisition des intrants agricoles (semences, engrais, pesticides)	10 000 000		
ANIDA apportera son expertise pour encadrer les	Programme d'appui avec l'ANIDA pour	2 000 000		
bénéficiaires dans la production et la mise en marché des produits maraichers.	l'accompagnement des périmètres Horticoles			
R12.4: PRODUCTION OSTREICOLE		56 000 000		
ORIENTATIONS D'INTERVENTION.				
L'objectif stratégique est de promouvoir la commercialisation	on des huitres fraiches afin d'améliorer de manière signif	icative le revenu des	femmes ostréicultrices	s. Pour y arriver, la
construction d'un dégorgeoir ainsi que des équipements d'exp	loitation et logistiques sont indispensable.			
Des équipements et de la logistique seront fournis aux	Acquisition d'équipements et de logistiques	7 000 000		UCP
OP ostréicoles de la FRGPF de Ziguinchor. Les			Chaines de	FRGPF
groupements (Etama, Tobor, Niaguis, Essaout et			valeur	Coopératives
Baghagha) ont reçu un premier lot en 2015.	Construction du dénomnain de Telesa	40 000 000	Responsable des infrastructures	Bénéficiaires ANA
Le choix de Tobor est motivé par :	Construction du dégorgeoir de Tobor	40 000 000	Initastructures	SRPM
 la proximité aux réceptifs hôteliers de Ziguinchor, le passage de la RN6; 				OIXI W
 la qualité des eaux (compositions microbiologique 				
et chimique) relevée par les études techniques.	Supervision des travaux Tobor	2 000 000		
Pour des soucis de durabilités et d'efficacité, les	Mise en œuvre d'un cadre de partenariat avec la	7 000 000		
services techniques déconcentrés (ANA et SRPM)	Coopérative ostréicole et les services techniques			
seront impliqués dans la mise en œuvre des activités	déconcentrés (ANA et SRPM)			
ostréicoles.				
Sous Composante13: Mise à disposition de petites i	nfrastructures post - récolte dont les centres de	169 500 000		
groupage R13: DE PETITES INFRASTRUCTURES POST RECO	LTES DONT LES CENTRES DE CROURACE			
SONT MIS EN PLACE	LIES DONI LES CENTRES DE GROUPAGE	169 500 000		
ORIENTATIONS D'INTERVENTION		l	l	
Une Convention de Maîtrise d'Ouvrage Délégué est signée a	vec l'AGETIP pour la construction des centres de groupas	ges et de petites plate	formes secondaires. Pa	ar ailleurs. les OF
seront appuyées dans la mise en place d'infrastructures				
Cinq (05) magasins de stockage seront réalisés en		65 000 000	AGETIP	UCP
2015. Les sites d'implantations seront choisis en	(magasins de stockage) pour accompagner les		Responsable des	OP
	coopératives		Infrastructures	Collectivités

Explications	Activités	Budget 2016	Responsable	Principaux Acteurs
concertation avec les OP. Des équipements nécessaires seront mis en place pour le fonctionnement et l'opérationnalisation des magasins.	Superviser les travaux des infrastructures post récoltes (magasins de stockage) pour accompagner les coopératives	5 000 000		locales
Un appui institutionnel sera apporté à l'Association des Producteurs de l'Arrondissement de Diouloulou (APAD) dans le cadre de la mise en marché de produits labellisée « la belle Casamance ».	Elaborer un programme d'appui et de partenariat avec des opérateurs dans la mise en marché de produit de qualité	5 000 000	Responsable chaine de valeur	UCP OP Privés
Des matériels et équipements de qualités seront fournis aux OP. Un marché est signé en fin 2015 pour l'acquisition de	Appui des OP dans la mise en place d'infrastructures post-récolte et d'équipement en matériels de qualité	5 000 000	Responsable chaine de valeur	UCP OP Privés
décortiqueuses et de batteuses à riz. Tenant compte de la forte demande et de leçons tirées	Acquisition de décortiqueuses et de batteuses à riz	44 500 000		Autorités locales Collectivités
de la campagne précédente, de nouvelles batteuses à riz et motofaucheuses seront acquis en 2016 et fournis aux OP.	Acquérir de nouvelles batteuses et motofaucheuses	45 000 000		locales
Sous Composante14: Amélioration de l'accès aux marchés à travers le développement de la Plateforme Economique Intégrée de Bignona		325 300 000		
R14:1 MOD AGETIP POUR LE DEVELOPPEMENT DE DE MARCHE	LA PEIB ET D'AUTRES INFRASTRUCTURES	290 000 000		

La Convention de Maîtrise d'Ouvrage Délégué signée avec l'AGETIP concerne aussi bien la mise en œuvre des activités de développement de la PEIB que d'autres infrastructures de marché. Néanmoins, le projet va appuyer la mise en opération (gestion et exploitation) des installations en 2016. Une démarche participative et inclusive sera adaptée pour le choix et l'implantation des plateformes secondaires en cohérence avec les objectifs de développement du PPDC. Aussi des ateliers régionaux seront tenus pour le choix des sites d'emplacement des infrastructures, notamment les plateformes secondaires.

des infrastructures, notamment les plateformes secondaires.				
La négociation du contrat est en cours avec le bureau	Développement de la PEIB	130 000 000	AGETIP	PPDC
d'études en vue de démarrer dès janvier les APS, APD	Etudes de faisabilité technico-économique et	30 000 000	Responsable des	Collectivités
et DAO. Ces études sont prévues pour quatre (4)	environnementale et sociale détaillées	30 000 000	infrastructures	locales
mois.	Réalisation des travaux	90 000 000		Services
Le démarrage des travaux de construction est prévu	Supervision des travaux	10 000 000		techniques
en octobre 2016.		10 000 000		
En vue de construire un cadre logistique cohérent avec la	Construction de plateformes secondaires	160 000 000		
PEIB, sept (7) petites plateformes logistiques seront				
réalisées. Les sites d'implantations seront choisis de				
manière concertée en cohérence avec les sites de productions	Travaux de construction de plateformes	145 000 000		
et de mise en marché.	secondaires	143 000 000		
	Supervision travaux plateformes secondaires	15 000 000		
	Rémunération MOD AGETIP	18 300 000		
R14:2 CONCEPTION DU SCHEMA DE GESTION/EXP	LOITATION DE LA PEIB	17 000 000		

Explications	Activités	Budget 2016	Responsable	Principaux Acteurs
ORIENTATIONS D'INTERVENTION Le PPDC effectuera en 2016 une étude en vue de concinstallations de la plateforme économique intégrée de Big		appuyer la mise en	opération (gestion e	t exploitation) des
Cette étude de conception du schéma de gestion/exploitation de la PEIB sera partagée avec les acteurs concernés.	Réaliser l'étude du schéma de gestion	15 000 000	Responsable	PPDC
	Atelier de validation de l'étude du schéma de gestion	2 000 000	Chaine de valeur	Commune de Bigona
Composante 2 : Accessibilité rurale L'AGEROUTE est Maître d'Ouvrage Délégué conformément à l'accord de crédit.		2 958 885 500		
Sous Composante21: Amélioration de l'accessibilité au niveau des communautés rurales (CR) les plus pauvres		504 498 000		
R21.1 : AMELIORER L'ACCESSIBILITE AU NIVEAU DES COMMUNAUTES RURALES (CR) LES PLUS PAUVRES		504 498 000		
ORIENTATIONS D'INTERVENTION		fin ala la a un alua		aniana Ingababa

Les travaux prévus dans cette sous composante consiste au traitement de points critiques de pistes rurales afin de les rendre praticables en toute saison. Le choix des pistes et tronçons des points critiques a été fait depuis la formulation du projet avec l'intervention de toutes les acteurs et parties prenantes. Le PPDC financera les études et travaux de traitement des points critiques. AGEROUTE prévoit également de réaliser une étude exhaustive de toutes les pistes concernées.

Les études sont en cours et seront finalisées au	Etudes techniques d'exécution, socio-	129 328 000	AGEROUTE	PPDC
courant du premier trimestre	économiques, environnementales et l'élaboration			Direction des
·	d'un DAO pour les travaux de traitement de points			routes
	critiques de 350 km de pistes rurales dans les			Collectivités
	régions de Sedhiou et Kolda			locales
	Prestations			Entreprises
Les DAO de travaux seront lancés en mars 2016 et le	Travaux de traitement de points critiques de	203 670 000		Bureau contrôle
démarrage des travaux est prévu en mai 2016.	pistes rurales dans la région de Sedhiou			Services
	Préparation et signature du Contrat			techniques
	Travaux			déconcentrés
Les DAO de travaux seront lancés en avril 2016 et le	Travaux de traitement de points critiques de	128 500 000		(DREEC, IREF
démarrage des travaux est prévu en juin 2016.	pistes rurales dans la région de Kolda			etc)
	Préparation et signature du Contrat			
	Travaux			
Le recrutement d'un bureau d'études chargé de la	Supervision des travaux de traitement de points			
réalisation des travaux est en cours.	critiques de pistes rurales dans les régions de			
	Sedhiou et de Kolda			
	Préparation et signature du Contrat	43 000 000		
	Prestations			
Sous Composante 22: la réhabilitation/entretien périodique de routes rurales		2 082 500 000		
R21.2 : DES PISTES RURALE SONT REHABILITEES	/ENTRETENUES	2 082 500 000		

ORIENTATIONS D'INTERVENTION

Les travaux prévus dans cette sous composante consiste à réhabiliter des pistes rurales en vue d'améliorer l'accessibilité rurale en Casamance.

Explications	Activités	Budget 2016	Responsable	Principaux
Les études de réhabilitation de piste sont achevées et les DAO sont disponibles. La sélection des entreprises de travaux se fera au premier trimestre 2016 et le	Travaux de réhabilitation et/ou d'entretien périodique de 43 km de pistes rurales dans la région de Ziguinchor: Tronçons	424 500 000	AGEROUTE	UCP-PPDC Direction des routes, ARD,
démarrage des travaux est prévu en février 2016.	Balandine_Djibidione (8 km) et Mampalago_Sindian_Balandine (35 km) Préparation et signature du Contrat			Collectivités locales Entreprises
	Travaux	000 000 000		Bureau contrôle
Concernant la piste Kolda-Pata, la sélection de l'entreprise pour les travaux est en cours. En effet, un DAO publié le 30 septembre 2015 a été infructueux	Travaux de réhabilitation et/ou d'entretien périodique de la piste Kolda - Pata (66 km) dans la région de Kolda	890 000 000		Services techniques déconcentrés
(pas de soumissionnaire). Une relance a été faite en novembre devant aboutir à la signature du contrat en	Préparation et signature du Contrat			(DREEC, IREF etc)
janvier 2016. Le démarrage des travaux est prévu en février 2016.	Travaux			610)
S'agissant de la piste Thianfara - Pakour (40 km), les études sont en cours de finalisation. Les travaux vont démarrer en le 15 avril 2016. De même concernant le	Travaux de réhabilitation et/ou d'entretien périodique de la piste Thianfara - Pakour (40 km) dans la région de Kolda	395 000 000	1	
traitement de point critique les travaux vont	Préparation et signature du Contrat			
commencer en avril 2016. La sélection des entreprises de travaux se fera au premier trimestre 2016 et le démarrage des travaux est prévu en avril 2016.	Travaux Travaux de réhabilitation et/ou d'entretien périodique de 26 km de pistes rurales dans la région de Ziguinchor: Tronçons Baila_Suelle (10 km) et Sindian_Djibidione (16 km)	250 000 000		
	Préparation et signature du Contrat			
Un Consultant (Bureau d'études) sera chargé de surveiller et contrôler les travaux de réhabilitation/entretien périodique de la piste Kolda-	Travaux Supervision des travaux de réhabilitation et/ou d'entretien périodique de la piste Kolda - Pata dans la région de Kolda	56 000 000		
Pata. Le recrutement est en cours.	Prestations			
Un Consultant (Bureau d'études) sera également chargé de surveiller et contrôler les travaux de réhabilitation des autres tronçons de pistes à	Supervision des travaux de réhabilitation et/ou d'entretien périodique de pistes rurales dans les régions de Ziguinchor et de Kolda	67 000 000		
réhabiliter dans les régions de Kolda et Ziguinchor.	Préparation et signature du Contrat			
Sous Composante 23: Mise en œuvre d'un projet pile	Prestations	120 000 000		
à haute intensité de main-d'œuvre	oto a charactori de pistos raraies par la metriode	120 000 000		
R23 : UN PROJET PILOTE D'ENTRETIEN DE PISTES EN ŒUVRE	RURALES PAR LA METHODE HIMO EST MIS	120 000 000		

Explications	Activités	Budget 2016	Responsable	Principaux Acteurs
ORIENTATIONS D'INTERVENTION				
La mise en œuvre du projet pilote d'entretien par la métr				
Cette méthode permettra de créer des emplois mais aus routier par la méthode HIMO.		locales dans la maí	trise d'ouvrage de p	orojet d'entretien
Des ateliers de partage et de validation sont tenus	Mise en œuvre d'un projet pilote d'entretien de	120 000 000	AGEROUTE	UCP-PPDC
dans les trois régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.	pistes rurales par la méthode à haute intensité de			Direction des
A l'issue de ces travaux, des pistes sont retenues pour	main-d'œuvre			routes, ARD,
le projet pilote ainsi qu'un programme de formation a	Préparation et signature du Contrat			Collectivités
été validé.	Travaux			locales, GIE
Sous Composante 24: Renforcement des capacités of	des ARD et des Collectivités locales dans le	150 000 000		
domaine de la maitrise d'ouvrage de l'entretien des p				
R23: LES CAPACITES DES ARD ET DES COLLECTIV		150 000 000		
DOMAINE DE LA MAITRISE D'OUVRAGE DE L	'ENTRETIEN DES PISTES RURALES			
ORIENTATIONS D'INTERVENTION				
	ien pérenne des pistes, il est envisagé d'organiser le	es communautés, d	e former les jeunes	et les femmes er
Le Projet visant à expérimenter un programme d'entreti		es communautés, d	e former les jeunes	et les femmes er
Le Projet visant à expérimenter un programme d'entreti techniques de cantonnage. A cet effet, les formations so	nt prévues.		•	
Le Projet visant à expérimenter un programme d'entreti techniques de cantonnage. A cet effet, les formations so Un protocole d'accord est en cours d'élaboration avec le Consultant individuel sera recruté pour assister l'AGERC	nt prévues. cCFP/TP en vue de la mise en œuvre de ces deux so	ous composantes no	•	
Le Projet visant à expérimenter un programme d'entreti techniques de cantonnage. A cet effet, les formations so Un protocole d'accord est en cours d'élaboration avec le	nt prévues. cCFP/TP en vue de la mise en œuvre de ces deux so	ous composantes no	•	
Le Projet visant à expérimenter un programme d'entreti techniques de cantonnage. A cet effet, les formations so Un protocole d'accord est en cours d'élaboration avec le Consultant individuel sera recruté pour assister l'AGERC Le projet prévoit une formation des formateurs à	nt prévues. CFP/TP en vue de la mise en œuvre de ces deux so DUTE et le PPDC dans la mise en œuvre des activité	ous composantes no s du projet pilote.	otamment les forma	tions. De même ur
Le Projet visant à expérimenter un programme d'entreti techniques de cantonnage. A cet effet, les formations so Un protocole d'accord est en cours d'élaboration avec le Consultant individuel sera recruté pour assister l'AGERC Le projet prévoit une formation des formateurs à travers le renforcement des capacités des ARD et des	ont prévues. • CFP/TP en vue de la mise en œuvre de ces deux so • CFP/TP et le PPDC dans la mise en œuvre des activité Renforcement de capacités des CL dans	ous composantes no s du projet pilote.	otamment les forma	tions. De même un
Le Projet visant à expérimenter un programme d'entreti techniques de cantonnage. A cet effet, les formations so Un protocole d'accord est en cours d'élaboration avec le Consultant individuel sera recruté pour assister l'AGERC Le projet prévoit une formation des formateurs à travers le renforcement des capacités des ARD et des Collectivités locales dans le domaine de la maitrise	ent prévues. CFP/TP en vue de la mise en œuvre de ces deux so DUTE et le PPDC dans la mise en œuvre des activité Renforcement de capacités des CL dans l'entretien des routes rurales	ous composantes no s du projet pilote. 150 000 000	otamment les forma	tions. De même ur UCP-PPDC Direction des
Le Projet visant à expérimenter un programme d'entreti techniques de cantonnage. A cet effet, les formations so Un protocole d'accord est en cours d'élaboration avec le Consultant individuel sera recruté pour assister l'AGERC Le projet prévoit une formation des formateurs à travers le renforcement des capacités des ARD et des Collectivités locales dans le domaine de la maitrise d'ouvrage de l'entretien des pistes rurales utilisant la	ont prévues. CFP/TP en vue de la mise en œuvre de ces deux so DUTE et le PPDC dans la mise en œuvre des activité Renforcement de capacités des CL dans l'entretien des routes rurales Déroulement des activités de formation dans	ous composantes no s du projet pilote.	otamment les forma	UCP-PPDC Direction des routes, ARD,
Le Projet visant à expérimenter un programme d'entreti techniques de cantonnage. A cet effet, les formations so Un protocole d'accord est en cours d'élaboration avec le Consultant individuel sera recruté pour assister l'AGERC Le projet prévoit une formation des formateurs à travers le renforcement des capacités des ARD et des Collectivités locales dans le domaine de la maitrise d'ouvrage de l'entretien des pistes rurales utilisant la méthode à haute intensité de main-d'œuvre. Un projet	ent prévues. CFP/TP en vue de la mise en œuvre de ces deux so DUTE et le PPDC dans la mise en œuvre des activité Renforcement de capacités des CL dans l'entretien des routes rurales	ous composantes no s du projet pilote. 150 000 000	otamment les forma	UCP-PPDC Direction des routes, ARD, Collectivités
Le Projet visant à expérimenter un programme d'entreti techniques de cantonnage. A cet effet, les formations so Un protocole d'accord est en cours d'élaboration avec le Consultant individuel sera recruté pour assister l'AGERC Le projet prévoit une formation des formateurs à travers le renforcement des capacités des ARD et des Collectivités locales dans le domaine de la maitrise d'ouvrage de l'entretien des pistes rurales utilisant la méthode à haute intensité de main-d'œuvre. Un projet pilote d'entretien de pistes rurales selon la méthode indiquée ci-dessus. Elle servira de prétexte à la	ont prévues. CFP/TP en vue de la mise en œuvre de ces deux so DUTE et le PPDC dans la mise en œuvre des activité Renforcement de capacités des CL dans l'entretien des routes rurales Déroulement des activités de formation dans	ous composantes no s du projet pilote. 150 000 000	otamment les forma	UCP-PPDC Direction des routes, ARD, Collectivités locales Services techniques
Le Projet visant à expérimenter un programme d'entretitechniques de cantonnage. A cet effet, les formations so Un protocole d'accord est en cours d'élaboration avec le Consultant individuel sera recruté pour assister l'AGERC Le projet prévoit une formation des formateurs à travers le renforcement des capacités des ARD et des Collectivités locales dans le domaine de la maitrise d'ouvrage de l'entretien des pistes rurales utilisant la méthode à haute intensité de main-d'œuvre. Un projet pilote d'entretien de pistes rurales selon la méthode indiquée ci-dessus. Elle servira de prétexte à la formation de l'ensemble des composantes du	ont prévues. CFP/TP en vue de la mise en œuvre de ces deux so DUTE et le PPDC dans la mise en œuvre des activité Renforcement de capacités des CL dans l'entretien des routes rurales Déroulement des activités de formation dans	ous composantes no s du projet pilote. 150 000 000	otamment les forma	UCP-PPDC Direction des routes, ARD, Collectivités locales Services techniques déconcentrés
Le Projet visant à expérimenter un programme d'entretitechniques de cantonnage. A cet effet, les formations so Un protocole d'accord est en cours d'élaboration avec le Consultant individuel sera recruté pour assister l'AGERC Le projet prévoit une formation des formateurs à travers le renforcement des capacités des ARD et des Collectivités locales dans le domaine de la maitrise d'ouvrage de l'entretien des pistes rurales utilisant la méthode à haute intensité de main-d'œuvre. Un projet pilote d'entretien de pistes rurales selon la méthode indiquée ci-dessus. Elle servira de prétexte à la formation de l'ensemble des composantes du dispositif.	ont prévues. CFP/TP en vue de la mise en œuvre de ces deux so DUTE et le PPDC dans la mise en œuvre des activité Renforcement de capacités des CL dans l'entretien des routes rurales Déroulement des activités de formation dans l'entretien des routes rurales	ous composantes no s du projet pilote. 150 000 000	otamment les forma	UCP-PPDC Direction des routes, ARD, Collectivités locales Services techniques
Le Projet visant à expérimenter un programme d'entreti techniques de cantonnage. A cet effet, les formations so Un protocole d'accord est en cours d'élaboration avec le Consultant individuel sera recruté pour assister l'AGERC Le projet prévoit une formation des formateurs à travers le renforcement des capacités des ARD et des Collectivités locales dans le domaine de la maitrise d'ouvrage de l'entretien des pistes rurales utilisant la méthode à haute intensité de main-d'œuvre. Un projet pilote d'entretien de pistes rurales selon la méthode indiquée ci-dessus. Elle servira de prétexte à la formation de l'ensemble des composantes du dispositif. Il s'agit de la rémunération d'AGEROUTE dans le	nt prévues. CFP/TP en vue de la mise en œuvre de ces deux so DUTE et le PPDC dans la mise en œuvre des activité Renforcement de capacités des CL dans l'entretien des routes rurales Déroulement des activités de formation dans l'entretien des routes rurales Rémunérer AGEROUTE pour la Maitrise	ous composantes no s du projet pilote. 150 000 000	otamment les forma	UCP-PPDC Direction des routes, ARD, Collectivités locales Services techniques déconcentrés (DREEC, IREF etc)
Le Projet visant à expérimenter un programme d'entretitechniques de cantonnage. A cet effet, les formations so Un protocole d'accord est en cours d'élaboration avec le Consultant individuel sera recruté pour assister l'AGERC Le projet prévoit une formation des formateurs à travers le renforcement des capacités des ARD et des Collectivités locales dans le domaine de la maitrise d'ouvrage de l'entretien des pistes rurales utilisant la méthode à haute intensité de main-d'œuvre. Un projet pilote d'entretien de pistes rurales selon la méthode indiquée ci-dessus. Elle servira de prétexte à la formation de l'ensemble des composantes du dispositif.	ont prévues. CFP/TP en vue de la mise en œuvre de ces deux so DUTE et le PPDC dans la mise en œuvre des activité Renforcement de capacités des CL dans l'entretien des routes rurales Déroulement des activités de formation dans l'entretien des routes rurales	ous composantes no s du projet pilote. 150 000 000	otamment les forma	UCP-PPDC Direction des routes, ARD, Collectivités locales Services techniques déconcentrés (DREEC, IREF

Explications	Activités	Budget 2016	Responsable	Principaux Acteurs
Composante 3: Mise en œuvre du projet et renforcement des capacités		922 760 000		
Sous Composante31: le renforcement des capacités des acteurs clés du processus de paix		92 000 000		

Dans le cadre du volet 1 de sa Composante 3, le PPDC compte signer une convention de partenariat avec l'Agence Nationale pour la Relance des Activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC). Pour la bonne mise en œuvre de ce partenariat, les parties prenantes ont élaboré un projet structuré autour des trois (03) axes stratégiques suivants:

- axe 1 : Appui à la réinsertion et la réintégration des personnes retournées et des groupes vulnérabilisés par le conflit ;
- axe 2 : Renouvellement, redynamisation et renforcement des capacités des Cellules d'Alerte, de Prévention des Conflits et de Mobilisation Sociale (CAPCMS),
- axe 3: Information, Communication et mobilisation sociale en faveur de la construction d'une paix durable en Casamance.

Dans le souci d'impliquer tous les acteurs, des Comités locaux et départementaux de Développement sont déjà tenus dans les départements de Bignona, de Ziguinchor, de Oussouye, de Bounkiling, de Kolda et de Goudomp pour prendre en compte les avis des élus, des administrations de l'état, des populations déplacées et celles qui les reçoivent..

ot conce qui les regententin				
R31.1: APPUI A LA REINSERTION ET LA REINTEGR	ATION DES PERSONNES RETOURNEES ET	92 000 000		
DES GROUPES VULNERABILISES PAR LE C	ONFLIT			
ORIENTATIONS D'INTERVENTION				
Appui à la réinsertion et la réintégration des personnes r	etournées et des groupes vulnérabilisés par le conflit.			
Il s'agira d'acquérir et de distribuer du matériel	Contribution à la relance de l'activité agricole	58 000 000	ANRAC	UCP
agricole, des semences, et du bétail à des nécessiteux	dans des zones sensibles			
vivant dans des zones sensibles afin d'y appuyer la	Appui en matériel agricole, en semence et en	15 000 000		
relance des activités agricoles.	bétail			
Des blocs maraîchers seront également	Réalisation de cinq (05) blocs maraichers	43 000 000		
réhabiliter/aménager aux profits des jeunes et femmes	Identifier et sensibiliser les bénéficiaires des	1 000 000		

1			1
activités sous la supervision du PPDC.	Suivre et évaluer les activités agricoles	2 000 000	
R31.2 : Renouvellement des bureaux, redynamisation	n et renforcement de capacités des cellules	12 500 000	
APCMS2			

Réalisation de 05 blocs maraichers

blocs maraîchers

ORIENTATIONS D'INTERVENTION

ANRAC se chargera du suivi de la réalisation des

vivant dans ces zones.

Renouvellement, redynamisation et renforcement des capacités des Cellules d'Alerte, de Prévention des Conflits et de Mobilisation Sociale (CAPCMS),

Faire l'état des lieux du fonctionnement des CAPCMS	12 500 000	ANRAC	UCP	
Etude de base sur le fonctionnement des CAPCMS	5 000 000			
Capitaliser et partager les points forts	2 500 000			
Renforcement de capacités des acteurs ciblés et renouvellement des bureaux				
Redynamisation des CAPCMS				

Explications	Activités	Budget 2016	Responsable	Principaux Acteurs
	Ateliers de renforcement de capacités et de renouvellement des bureaux dans le département de Bignona	5 000 000		
R31.3 : Information, Communication et mobilisation durable en Casamance	sociale en faveur de la construction d'une paix	19 500 000		
ORIENTATIONS D'INTERVENTION				
ANRAC sera chargé d'informer les populations sur les a	ctivités du PPDC et sa contribution dans le cadre de l	la relance des activ	ités économiques et	sociales en
faveur de la consolidation du processus de paix				
Il s'agit de réaliser des émissions radios, de produire des supports didactiques et de communication de masse et d'appuyer les activités de mobilisation sociale.	Communication et mobilisation sociale ANRAC	7 500 000	ANRAC	UCP
Réconciliation et paix Identifier les facteurs de tensions au niveau des communautés. Gérer les conflits intra et inter communautaires	Promouvoir une culture de paix, de pardon et de réconciliation dans les communautés	5 000 000		
ANRAC sera chargé de sensibiliser le MFDC et les autres acteurs sur l'importance de la réalisation des	Sensibilisation autour de la réalisation des infrastructures	5 000 000		
infrastructures sociales de bases dans certaines localités en Casamance. Cette activité vise à anticiper	Rencontres périodiques avec les différentes factions politiques et combattantes du MFDC			
sur le blocage des travaux dans les zones sensibles. Cela rentre dans la stratégie de communication du projet en direction de cette cible délicate.	Rencontres d'échanges et d'informations au niveau des localités devant abriter des infrastructures			
Il s'agira de suivre la mise en œuvre des activités sur	Suivre et évaluer les activités du Protocole	2 000 000	ANRAC	UCP
le terrain.	Suivi- évaluation des activités			
	Missions de suivi-évaluation			
	Capitaliser les réalisations	2 000 000		
R31.4 : Promouvoir une stratégie de mobilisation de	ressources auprès du secteur privé	2 000 000		
ORIENTATIONS D'INTERVENTION Promouvoir une stratégie de mobilisation de ressources	aunrès du secteur privé			
1 Tomouvoir une strategie de mobilisation de ressources	Promouvoir une stratégie de mobilisation de ressources auprès du secteur privé	2 000 000	ANRAC	UCP

Explications	Activités	Budget 2016	Responsable	Principaux Acteurs
Sous Composante32: La conduite de trois études stratégiques		50 000 000		
R32 : Des études stratégiques sont réalisées		50 000 000		
ORIENTATIONS D'INTERVENTION				
En 2016, le PPDC compte réaliser des documents d'aménagement, d'occupation des sols pour neuf collectivités locales de la Casamance.	Elaborer des Schémas Directeurs d'Aménagement Communales (SDAC) / Plans d'Aménagement et d'Occupation du Sol (PAOS)	50 000 000	Responsable Suivi Evaluation	UCP Collectivités locales
Sous Composante 33: L'appui à la gestion, au suiv	i et à l'évaluation du projet	760 760 000		
R33.1 : L'équipe du projet et les Consultants Assis	tants techniques sont pris en charge	314 330 000		
ORIENTATIONS D'INTERVENTION L'Unité de Coordination du Projet est composée : d Marchés), un Responsable Administratif et Financier, chauffeurs, un agent relais à Dakar. Il y a un Président du Comité de Pilotage, basé à Daka	un Assistant Suivi Evaluation, un Assistant Secteur			

Un Auditeur interne (recruté à temps partiel) et le personnel d'appui (1 secrétaires, 2 chauffeurs) seront recrutés en 2016.

Les contrats des consultants séniors seront renouvelés. Ils interviendront à temps partiel pour accompagner l'UCP. Il s'agit spécifiquement de:

- Un consultant pour accompagner la mise en œuvre des activités ostréicoles
- Un consultant pour l'accompagnement de la mise en œuvre de la PEIB
- Un consultant spécialiste des filières agricoles
- Un consultant, spécialiste en suivi-évaluation et systèmes d'informations.

Pour 2016, il est prévu le recrutement d'un Consultant, Génie rural et le recrutement d'un Spécialiste en genre et jeunes.

illel d'appui (il secretailes, 2 chadheurs) seront recidi	63 611 20 10.		
Prise en charge du personnel	230 000 000	Coordonnateur RAF	UCP
Prise en charge du volet médicale du personnel (BCI)	15 000 000	Coordonnateur RAF	UCP
Consultant pour l'accompagnement de la mise en œuvre des activités ostréicoles	7 500 000	Coordonnateur RAF	UCP
Consultant pour l'accompagnement de la mise en œuvre de la PEIB	10 000 000	Coordonnateur RAF	UCP
Consultant Spécialiste des filières agricoles	10 000 000	Coordonnateur RAF	UCP
Consultant spécialiste en suivi-évaluation et systèmes d'informations	10 000 000	Coordonnateur RAF	UCP
Consultant Génie rural pour l'appui à l'évaluation des offres et la réalisation de prestations spécifiques	15 000 000	Coordonnateur RAF	UCP
Consultant spécialiste Genre (jeunes, femmes) et mobilisation sociale	10 000 000	Coordonnateur RAF	UCP
Consultant pour l'audit externe du projet	7 000 000	Coordonnateur RAF	UCP
Sécurité-gardiennage	3 140 000	Coordonnateur RAF	UCP
Entretien-nettoyage	1 690 000	Coordonnateur RAF	UCP

Explications	Activités	Budget 2016	Responsable	Principaux Acteurs
R33.2 : Les Manuels de procédure d'exécution administratif comptable/financier et d'exécution technique/ financier sont élaborés				
ORIENTATIONS D'INTERVENTION				•
	Réviser le manuel d'exécution technique		RAF	UCP
R33.3 : Le suivi-évaluation du programme est effect				

Dans le cadre du Suivi Evaluation les activités suivantes seront effectuées.

- > La Gestion et l'entretien du site web, du matériel et réseau informatique du Projet ;
- La mise en œuvre du dispositif de Suivi-Évaluation du PPDC en rapport avec les OPs / CRCR (relais, animateurs, Facilitateurs), les DRDR / STD, les Agences et Structures spécialisées;
- > Le suivi des fiches de collecte de données, des fiches de suivi, des fiches d'évaluation, de la remontée des données (rapports d'activités) ; etc
- La mise à jour des bases de données avec le Tableur Excel ;

La finalisation de l'étude de la situation de référence du projet en début 2016

Le PPDC s'est orientée vers l'Université Assane Seck de Ziguinchor pour réaliser l'étude de la situation de référence. Cette nouvelle approche, sera une continuité avec le travail effectué avec le ProPaix. Il va permettre aussi à l'UASZ de se lancer dans les travaux des études impacts.	Finalisation de la situation de référence du projet	10 000 000	Responsable Suivi-Evaluation	UCP
Le Centre de Suivi Ecologique (CSE) a entamé l'élaboration d'une base de données cartographique. Ce système va servir à : la spatialisation des activités du projet, l'appui à la planification stratégique de collectivités locales dans les zones directement touchées par le PPDC. Initier un outil de gestion de données qui servira à long terme au développement de la Casamance.	Finalisation du SIG	8 000 000	Responsable Suivi-Evaluation	UCP
Il s'agira de mise à jour périodique des données	Réactualisation des données du SIG	8 000 000	Responsable Suivi-Evaluation	UCP
Les différents acteurs seront former à l'utilisation du SIG afin qu'ils puissent s'en servir de manière efficace.	Ateliers de formation des acteurs du dispositif du suivi évaluation et des services régionaux partenaires sur le SIG	9 000 000	Responsable Suivi-Evaluation	UCP
Beaucoup d'études ont été conduites dans le bassin de la Casamance. Le projet envisage un archivage numérique pour conserver les données, faciliter l'exploitation des données la mise en œuvre futures de projets en Casamance, éviter de continuellement reprendre des études.	Mettre en place une bibliothèque numérique	10 000 000	Responsable Suivi-Evaluation	UCP

Explications	Activités	Budget 2016	Responsable	Principaux Acteurs
le projet a déjà accru dans le PTBA révisé en 2015, le	Elaborer et Mettre en œuvre un plan de	20 500 000	Responsable	UCP
budget de la communication. Pour mettre en œuvre	communication du projet		Suivi-Evaluation	
une stratégie appropriée, des termes de référence pour le recrutement d'un consultant ont été soumis à l'IDA pour avis de non objection. Son recrutement va permettre de dérouler un plan de communication utilisant divers supports dont les radios communautaires.	Elaborer, confectionner et éditer les supports de communication	6 000 000	Responsable Suivi-Evaluation	UCP
La gestion et l'entretien du site web et du matériel informatique du Projet se fera en faisant appel, à chaque fois que nécessaire, à des spécialistes en la matière.	Gérer et entretenir le site web, le matériel et réseau informatique du Projet.	4 000 000	Responsable Suivi-Evaluation	UCP
Le PTBA de 2017 sera élaboré, partagé et validé au	Atelier de partage du PTBA 2017	7 000 000	Coordinateur	UCP
courant du dernier trimestre 2016.	Comités de pilotage	15 000 000	Coordinateur	UCP
Un suivi environnemental et social des activités sera effectué en partenariat avec les services techniques concernés (DREEC, IREF, ISRA, INP etc) par la mise en œuvre du PGES du projet.	Mise en œuvre du Plan de Suivi Environnemental et Social du projet	30 000 000	Responsable Suivi-Evaluation	UCP Services techniques
R33.3 : Acquisition de matériel roulant		95 000 000		
ORIENTATIONS D'INTERVENTION Durant la première année l'UCP-PPDC a fonctionné av Ainsi le PPDC compte renforcer l'UCP en matériel roulai	nt pour permettre un bon déroulement des activités.			
Il s'agira d'acquérir des véhicules pour un meilleur fonctionnement de l'UCP du PPDC.	Véhicules pour la Coordination	95 000 000	SPM	UCP
R33.4 : Acquisition de Matériel informatique		25 030 000		
ORIENTATIONS D'INTERVENTION		•		
Le projet a perdu des équipements informatiques durant l'hivernage dernier. L'acquisition de	Matériel informatique pour l'UCP (Traceur, Ordinateurs, tablettes, Logiciels de Conception)	10 000 000	SPM	UCP
paratonnerre est prévue à l'effet de protéger les systèmes d'informations comptables, financières et	Assistance, maintenance et suivi du logiciel de gestion administrative comptable du projet	3 030 000	RAF	UCP
techniques. Des équipements de mesures sont aussi prévus pour améliorer la collecte des données	Entretien, réparation, maintenance du mobilier et matériel de bureau	5 000 000	RSE	UCP
nécessaires au suivi du projet	Installer un paratonnerre/parafoudre	7 000 000	SPM	UCP
R33.5 : Acquisition de Matériel de bureau et Location		2 000 000		
ORIENTATIONS D'INTERVENTION		•		
	Fourniture de bureau pour l'UCP	2 000 000	SPM	UCP
	1		_	

Explications	Activités	Budget 2016	Responsable	Principaux Acteurs
R33.6 : Fonctionnement de l'UCP		210 900 000		
ORIENTATIONS D'INTERVENTION				
Au titre de la Gestion Administrative, Financière et Comptable les activités à réaliser en 2016 sont : L'Assistance, maintenance et suivi du logiciel de gestion administrative comptable du projet : le logiciel est déjà opérationnel depuis 2015.	Location des bureaux UCP	12 000 000	RAF	UCP
	Factures d'Eau	500 000	RAF	UCP
	Factures d'Electricité	6 000 000	RAF	UCP
	Factures de Téléphone	9 000 000	RAF	UCP
	Missions Internes (UCP et STD)	40 000 000	RAF	UCP
	Mettre en œuvre d'un plan de formation pour le	50 000 000	RAF	UCP
	renforcement de capacités			
	Carburant	10 000 000	RAF	UCP
	Fournitures et produits d'entretien	200 000	RAF	UCP
	Prise en charge des Frais bancaires	2 000 000	RAF	UCP
	Revues spécialisées et documentation	200 000	Coordonnateur	UCP
	Missions d'appui à la mise en œuvre du projet (Supervision)	6 000 000	Coordonnateur	UCP
	Soldes et Accessoires (BCI)	65 000 000	RAF	UCP
	Autres charges opérationnelles	10 000 000	RAF	UCP
Sous Composante34: La construction et l'équipement de (s) siège (s) de l'ARD				
R34 : Les sièges des ARD de Ziguinchor, Sedhiou, Kolda				
Reliquat DAO construction sièges des ARD		6 000 000		
